

SOMMAIRE

- FEUILLES DE RECEPTION :

GENIE CIVIL

TERRASSEMENT

FEUILLES DE RÉCEPTION

GÉNIE CIVIL

FEUILLES DE RÉCEPTION - GÉNIE CIVIL

GROUPEMENT FOUGEROLLE/C.S.E.

BARRAGE AL BASSAM DE NIANDOUBA

DEMANDE D'APPROBATION N°... R11

Date et heure d'activité : 03/07/97 14^h30

Item à vérifier : Pose du batardeau et de la vanne à galets

Localisation :

Ouvrage de restitution

Date de soumission : 02/07/97

Demande effectuée par : M. GAYE

Demande reçue par : B. BOYER Date : 02-07-97

Commentaires :

Contrôlée par : B. BOYER

Signature et Date : Bertrand Boyer 02-07-97

Remarques : HORIZONTALITÉ DU SEUIL OK ±1MM.
VERTICALITÉ DES GUIDES OK ±1MM

Approuvée: X

B.B. 02-07-97
17:00

Non Approuvée :

GROUPEMENT FOUGEROLLE/C.S.E.

BARRAGE AL BASSAM DE NIANDOUBA

DEMANDE D'APPROBATION N°... DIV 29

Date et heure d'activité : 27/06/1997

Item à vérifier : Bétonnage rampe en béton de la piste d'accès
côté rive gauche du canal de fuite du bassin de
dissipation

Localisation : Bassin de dissipation - piste d'accès

Date de soumission : 26/06/1997

Demande effectuée par : M. GAYE

Demande reçue par : B. BOYER

Date : 26/06/97

Commentaires :

Bétonnage effectué le 28/06/97 de 08h10 à
12h00

H. K. Gaye

Contrôlée par : B. BOYER

Signature et Date : B. Boyer 27-06-97 16:00

Remarques : REPÈRES CORRECTS EN ALTITUDE ET
DISTANCE -

Approuvée :

B.B.

Non Approuvée :

GROUPEMENT FOUGEROLLE/C.S.E.

BARRAGE AL BASSAM DE NIANDOUBA

DEMANDE D'APPROBATION N°... DIY 28

Date et heure d'activité : 26/06/1997

Item à vérifier : Excavation pour rampes en béton piste d'accès
côté rive gauche canal de fuite du bassin de dissipation

Localisation : Bassin de dissipation - piste d'accès

Date de soumission : 26/06/1997

Demande effectuée par : M. GAYE ff

Demande reçue par : B. BOYER Date : 26/06/1997

Commentaires : Bétonnage effectué le 27/06/97 de
08h20 à 16h00
M. K. Gaye

Contrôlée par : B. BOYER

Signature et Date : Bertand Boyer 27-06-97 16:00

Remarques : EXCAVATION CORRECTE - LEVÉ FAIT APRÈS LA
MISE EN PLACE DE LA PIERRE DE DRAINAGE.

Approuvée: X
B.B.

Non Approuvée :

GROUPEMENT FOUGEROLLE C.S.E

BARRAGE AL-BASSAM DE NIANDOUBA

FICHE D'EXECUTION No:

CHANTIER: **Barrage de Niandouba** No: **PM 546 au PM 536**

DEFINITION DE L'OUVRAGE: **Piste d'accès (Bassin de Dissipation)**
 PLAN D'EXECUTION: **CONTRAT No: 208** INDICE: **C**
ACHEV. No: 209 INDICE: **A**

POINT CRITIQUE EVENTUEL: **OUI:** **NON:**
 OBJET:

RECEPTION FERRAILLAGE: OK.	DATE: 25/06/1997	VISA CHEF DE PROJET [Signature]
--------------------------------------	-------------------------	---

OFFRAGES: effectués le 18/06/97 OK.	ASPECT PAREMENT: DEMOULANT: INCORPORATION: DATE: 25/06/1997	VISA CHEF DE CHANTIER BON A BETONNER [Signature]
--	---	---

BETONNAGE de 20m de la piste d'accès effectués le 21/06/97 de 08h30 à 15h30 slump test: 7,00 cm Beton 017m - L. N.K. Gage	TYPE DE BETON classe I MOYENS BENNE: Nbre VIBREURS: 2 SURFACAGE: REGLE: CURE: eau DATE: 25/06/1997	MALAXEUR: VALOCITE: + balou VISA CHEF DE CHANTIER [Signature]
--	---	--

PRELEVEMENTS:	ENTREPRISE:	MAÎTRE D'OEUVRE Nbre: 12						
RESULTATS:		<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="width: 33%;">INFOS</th> <th style="width: 33%;">7 JOURS</th> <th style="width: 33%;">28 JOURS</th> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </table>	INFOS	7 JOURS	28 JOURS			
INFOS	7 JOURS	28 JOURS						

POINT CRITIQUE: OBJET: LEVEE EL:	OBSERVATIONS:	
CONTRÔLE EXTERNE	CONTRÔLE INTERNE	

CONFORMITE D'EXECUTION		
VISA CONTRÔLE EXTERNE	FOUGEROLLE C.S.E	MAÎTRE D'OEUVRE
[Signature]	[Signature]	

25/06/97

GROUPEMENT FOUGEROLLE C.S.E

BARRAGE AL-BASSAM DE NIANDOUBA

FICHE D'EXECUTION No :

CHANTIER: Barrage de Niandouba No : PM 526 au PM 536

DEFINITION DE L'OUVRAGE:								
PLAN D'EXECUTION:	COTTRAGE No: 208	INDICE: C						
	ACIER No: 209	INDICE: A						
POINT CRITIQUE EVENTUEL:	OUI:	NON:						
OBJET:								
RECEPTION FERRAILLAGE:	DATE: 23/06/1997	VISA CHEF DE PROJET						
<i>OK Ferraillage</i>		<i>[Signature]</i>						
OFFRAGES: <i>Reception le 19/06/97</i> ASPECT PAREMENT: DEMOULANT: INCORPORATION:								
	DATE: 23/06/1997	VISA CHEF DE CHANTIER BON A BETONNER						
BETONNAGE 10m TYPE DE BETON classe I MOYENS <u>BENNE</u> : MALAXEUR: Nbre VIBREURS: 2 SURFACAGE: <u>REGLE</u> : VALOCHTE: + balai CURE: eau								
Effectue le 23/06/97 de 10h30 à 13h00 Stampé par 7,3cm.	DATE: 23/06/1997	VISA CHEF DE CHANTIER						
RELEVEMENTS:	ENTREPRISE:	MAÎTRE D'OEUVRE Nbre: 12						
	RESULTATS:	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th>INFOS</th> <th>7 JOURS</th> <th>28 JOURS</th> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </table>	INFOS	7 JOURS	28 JOURS			
INFOS	7 JOURS	28 JOURS						
POINT CRITIQUE:	OBSERVATIONS:							
OBJET:								
LEVE LE:								
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>CONTRÔLE EXTERNE</td> <td>CONTRÔLE INTERNE</td> </tr> <tr> <td> </td> <td><i>[Signature]</i></td> </tr> </table>			CONTRÔLE EXTERNE	CONTRÔLE INTERNE		<i>[Signature]</i>		
CONTRÔLE EXTERNE	CONTRÔLE INTERNE							
	<i>[Signature]</i>							
CONFORMITE D'EXECUTION								
VISA CONTRÔLE EXTERNE	FOUGEROLLE C.S.E	MAÎTRE D'OEUVRE						
<i>OK [Signature]</i>	<i>[Signature]</i>							

23/06/97

GROUPEMENT FOUGEROLLE C.S.E






BARRAGE AL-BASSAM DE NIANDOUBA

FICHE D'EXECUTION No :

CHANTIER: Barrage de Niandouba

No :

PM 496 au PM 506




DEFINITION DE L'OUVRAGE: Piste d'accès en béton au niveau du bassin de dissipation								
PLAN D'EXECUTION:	COFFRAGE No: 208	INDICE: C						
	ACIER No: 209	INDICE: A						
POINT CRITIQUE EVENTUEL:	OUI:	NON:						
OBJET:								
RECEPTION FERRAILLAGE:	DATE: 22/06/1997	VISA CHEF DE PROJET						
OK								
COFFRAGES :	ASPECT PAREMENT:							
effectués et réceptionnés le 18/06/97	DEMOULANT:							
	INCORPORATION:							
	DATE: 21/06/1997	VISA CHEF DE CHANTIER BON A BETONNER						
								
BETONNAGE 10m	TYPE DE BETON <i>dosé à</i>							
Effectués de 8h30 à 11h30 Slump test 7,50cm	MOYENS BENNE: + PPM	MALAXEUR:						
	Nbre VIBREURS: 2							
	SURFACAGE: REGLE:	VALOISE: + balai						
	CURE: eau							
	DATE: 22/06/1997	VISA CHEF DE CHANTIER						
RELEVEMENTS:	ENTREPRISE:	MAÎTRE D'OEUVRE Nbre: 12						
	RESULTATS:	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th>INFOS</th> <th>7 JOURS</th> <th>28 JOURS</th> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </table>	INFOS	7 JOURS	28 JOURS			
INFOS	7 JOURS	28 JOURS						
POINT CRITIQUE:	OBSERVATIONS:							
OBJET:								
LEVE LE:								
CONTRÔLE EXTERNE	CONTRÔLE INTERNE							
								
* CONFORMITE D'EXECUTION								
VISA CONTRÔLE EXTERNE	FOUGEROLLE C.S.E	MAÎTRE D'OEUVRE						
								
22/06/97								

GROUPEMENT FOUGEROLLE C.S.E

BARRAGE AL-BASSAM DE NIANDOUBA

FICHE D'EXECUTION No:

CHANTIER: Barrage de Niandouba No:

DEFINITION DE L'OUVRAGE: Piste d'accès (Bassin de dissipation) PM536 au PM556								
PLAN D'EXECUTION:	COFFRAGE No: 208	INDICE: C						
	ACIER No: 209	INDICE: A						
POINT CRITIQUE EVENTUEL:	OUI:	NON:						
OBJET:								
RECEPTION FERRAILLAGE:	DATE: 21/06/1997	VISA CHEF DE PROJET						
OK								
COFFRAGES :								
effectués le 18/06/97	ASPECT PAREMENT: 20/06/1997							
	DEMOULANT:							
	INCORPORATION:							
	DATE: 20/06/1997	VISA CHEF DE CHANTIER						
	OK pour la prise de béton.	BON A BETONNER						
BETONNAGE 20 m	TYPE DE BETON classe I							
effectués de 16h00 à 16h00 slump - ts: 7,3 cm	MOYENS BENNE: + PPM	MALAXEUR:						
	Nbre VIBREURS: 2							
	SURFACAGE: REGLE:	VALOCHÉ: + balai						
	CURE: eau							
	DATE: 21/06/1997	VISA CHEF DE CHANTIER						
RELEVEMENTS:	ENTREPRISE:	MAÎTRE D'OEUVRE Nbre: 12						
	RESULTATS:							
		<table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr> <th>INFOS</th> <th>7 JOURS</th> <th>28 JOURS</th> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </table>	INFOS	7 JOURS	28 JOURS			
INFOS	7 JOURS	28 JOURS						
POINT CRITIQUE:	OBSERVATIONS:							
OBJET:								
LEVE LE:								
CONTRÔLE EXTERNE	CONTRÔLE INTERNE							
								
* CONFORMITE D'EXECUTION								
VISA CONTRÔLE EXTERNE	FOUGEROLLE C.S.E	MAÎTRE D'OEUVRE						
OK 16/06/97								
21/06/97								

GROUPEMENT FOUGEROLLE C.S.E

BARRAGE AL-BASSAM DE NIANDOUBA

FICHE D'EXECUTION No:

CHANTIER: Barrage de Niandouba

No :

DEFINITION DE L'OUVRAGE: Piste d'accès (Bassin de dissipation) PM 556 au PM 576		
PLAN D'EXECUTION:	COFFRAGE No: 208	INDICE: C
	ACIER No: 209	INDICE: A
POINT CRITIQUE EVENTUEL:	OUI:	NON:
OBJET:		
RECEPTION FERRAILLAGE:	DATE: 19/06/1997	VISA CHEF DE PROJET
<i>M. N. K. Gage</i>		<i>[Signature]</i>
COFFRAGES:	ASPECT PAREMENT:	
<i>Reception des b 15/06/97</i>	DEMOULANT:	
	INCORPORATION:	
	DATE: 19/06/1997	VISA CHEF DE CHANTIER BON A BETONNER
BETONNAGE 20 m	TYPE DE BETON Classe I	
PM effectuée de 05h00 à 16h00	MOYENS BENNE: + PPM	MALAXEUR:
	Nbre VIBREURS: 2	
	SURFACAGE: REGLE:	VALOCHÉ: + balai
	CURE: eau	
	DATE: 19/06/1997	VISA CHEF DE CHANTIER
RELEVEMENTS:	ENTREPRISE:	MAÎTRE D'OEUVRE
		Nbre: 12
	RESULTATS:	
		INTOS
		7 JOURS
		28 JOURS
POINT CRITIQUE:	OBSERVATIONS: Recm mandations du topographe:	
OBJET:	Les repers de nivellement (cote 24.30 m) sont à l'embr.	
LEVE LE:	Vérifier bien la recouvrir lors de la mise en place du béton.	
	Recm mandations respectées. <i>M. N. K. Gage</i>	
CONTRÔLE EXTERNE	CONTRÔLE INTERNE	
	<i>[Signature]</i>	
CONFORMITE D'EXECUTION		
VISA CONTRÔLE EXTERNE	FOUGEROLLE C.S.E	MAÎTRE D'OEUVRE
<i>[Signature]</i> 15/06/97	<i>[Signature]</i>	

GROUPEMENT FOUGEROLLE C.S.E

BARRAGE AL-BASSAM DE NIANDOUBA

FICHE D'EXECUTION No:

CHANTIER: Barrage de Niandouba No:

DEFINITION DE L'OUVRAGE: Piste d'accès (Bassin de dissipation) PM476 au PM496		PLAN D'EXECUTION: COFFRAGE No: 208 INDICE: C	
		ACIER No: 209 INDICE: A	
POINT CRITIQUE EVENTUEL: OUI: NON:		OBJET:	
RECEPTION FERRAILLAGE: OK ferraillage le 17/06/87 après les correctifs et recommandations demandés le 14/06/87.	DATE: 17/06/1997	VISA CHEF DE PROJET <i>[Signature]</i>	
COFFRAGES: Réceptionnés le 14/06/87 OK.	ASPECT PAREMENT: DEMOULANT: INCORPORATION: DATE: 16/06/1997	VISA CHEF DE CHANTIER BON A BETONNER	
BETONNAGE 20m PM 476 au PM 496 début 08h45 fin 15h00 slump test 7,40cm.	TYPE DE BETON Classe I MOYENS <u>MECANIQUE</u> : Nbre VIBREURS: 2 SURFACAGE: <u>REGLE</u> : CURE: eau DATE: 17/06/1997	MALAXEUR: + Sambreun VALOCHÉ: + balai VISA CHEF DE CHANTIER	
RELEVEMENTS:	ENTREPRISE:	MAÎTRE D'OEUVRE	Nbre: 12
RESULTATS:		INFOS	7 JOURS 28 JOURS
POINT CRITIQUE:	OBJET:	OBSERVATIONS: recommandations du 14/06/87: Treillis devant être mis en place dans le béton frais. Demandes, fait il peut réceptionner sur place près de la courbe avant le bétonnage. Les 11 HA 12 au 208 manquant sur la face des poutres et plan 209 ont été mis en place avant le bétonnage - N.K. Gnyo	
LEVE LE:			
CONTRÔLE EXTERNE	CONTRÔLE INTERNE <i>[Signature]</i>		
* CONFORMITE D'EXECUTION			
VISA CONTRÔLE EXTERNE	FOUGEROLLE C.S.E	MAÎTRE D'OEUVRE <i>[Signature]</i>	
OK. Ferrailages coffrages et bétonnage	<i>[Signature]</i>		

17/06/87 *[Signature]*

GROUPEMENT FOUGEROLLE C.S.E

BARRAGE AL-BASSAM DE NIANDOURA

FICHE D'EXECUTION No:

CHANTIER: *Barrage Niandoura*

No :

DEFINITION DE L'OUVRAGE: <i>Couloir de restitution C.D. 11</i>			
PLAN D'EXECUTION:	COFFRAGE No: <i>211</i>	INDICE: <i>F</i>	
	ACIER No: <i>225</i>	INDICE: <i>0</i>	
POINT CRITIQUE EVENTUEL:	OUI:	NON:	
OBJET:			
RECEPTION FERRAILLAGE: <i>OK</i> <i>le 10/06/97 à 08h30</i> <i>N.K. Gaye</i>	DATE: <i>9.06.97</i> <i>10/06/97</i>	VISA CHEF DE PROJET <i>[Signature]</i>	
COFFRAGES: <i>Receptionnés</i> <i>le 31/05/97 à 12h00</i> <i>lors de la dernière</i> <i>lecture du béton du</i> <i>plot 5.</i>	ASPECT PAREMENT: DEMOULANT: INCORPORATION:	VISA CHEF DE CHANTIER BON A BETONNER	
BETONNAGE <i>effectué</i> <i>le 10/06/97 de</i> <i>10h30 à 13h20</i> <i>avec du béton</i> <i>normal de</i> <i>slump 50 710cm.</i>	TYPE DE BETON MOYENS BENNE: Nbre VIBREURS: SURFACAGE: REGLE: CURE:	MALAXEUR: VALOCHÉ: VISA CHEF DE CHANTIER	
HAUTEURS: <i>N.K. Gaye</i>	ENTREPRISE:	MAÎTRE D'OEUVRE Nbre:	
RESULTATS:	INFOS	7 JOURS	28 JOURS
POINT CRITIQUE:	OBSERVATIONS: <i>Demander la</i> <i>reception de ferraillage</i> <i>transmise à</i> <i>19h40 le 08/06/97</i> <i>N.K. Gaye</i>		
OBJET:			
LEVE LE:			
CONTRÔLE EXTERNE	CONTRÔLE INTERNE		
<i>OK Ferraillage et bétonnage</i> <i>le 10/06/97</i> <i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>		
CONFORMITE D'EXECUTION			
VISA CONTRÔLE EXTERNE	FOUGEROLLE C.S.E	MAÎTRE D'OEUVRE	
	<i>[Signature]</i>		

GROUPEMENT FOUGEROLLE C.S.E

BARRAGE AL-BASSAM DE NIANDOUBA

FICHE D'EXECUTION No:

CHANTIER: Barrage Niandouba No: _____

DEFINITION DE L'OUVRAGE: <u>Coulage de la structure</u>		No: <u>221</u>	
PLAN D'EXECUTION:		COFFRAGE No: <u>221</u>	INDICE: <u>E</u>
		ACIER No: _____	INDICE: _____
POINT CRITIQUE EVENTUEL:		OUI: _____	NON: _____
OBJET: _____			
RECEPTION FERRAILLAGE:		DATE: _____	VISA CHEF DE PROJET
OFFRAGES: _____ ASPECT PAREMENT: _____ DEMOULANT: _____ INCORPORATION: _____			
		DATE: <u>10.06.97</u>	VISA CHEF DE CHANTIER
		<u>10 heures</u>	BON A BETONNER
			<u>Aime Soigna</u>
BETONNAGE		TYPE DE BETON: <u>S20C1</u>	
		MOYENS BENNE: _____	MALAXEUR: _____
		Nbre VIBREURS: <u>3</u>	
		SURFACAGE: _____	VALOCHÉ: _____
		REGLE: _____	
		CURE: <u>eau</u>	
		DATE: <u>10.06.97</u>	VISA CHEF DE CHANTIER
			<u>Aime Soigna</u>
ELEVEMENTS:		ENTREPRISE: _____	MAÎTRE D'OEUVRE
			Nbre: _____
RESULTATS:		INFOS	7 JOURS
			28 JOURS
POINT CRITIQUE:		OBSERVATIONS:	
OBJET:		<u>OK: vu lors de la réception précédente - P.B.</u>	
LEVE LE:			
CONTRÔLE EXTERNE		CONTRÔLE INTERNE	
		<u>[Signature]</u>	
* CONFORMITE D'EXECUTION			
VISA CONTRÔLE EXTERNE		FOUGEROLLE C.S.E	
		MAÎTRE D'OEUVRE	
<u>[Signature]</u>		<u>[Signature]</u>	

ok 10.06.97 130

GROUPEMENT FOUGEROLLE C.S.E

BARRAGE AL-BASSAM DE NIANDOUBA

FICHE D'EXECUTION No:

CHANTIER: Barrage de Niandouba No:

DEFINITION DE L'OUVRAGE: <u>Couage de Résolution Plot 5 (Seu 30,434</u>		
PLAN D'EXECUTION:	COFFRAGE No: <u>216.215</u>	INDICE: <u>B° 33,40</u>
	ACIER No: <u>224</u>	INDICE: <u>0</u>
POINT CRITIQUE EVENTUEL:	OUI:	NON:
OBJET:		
RECEPTION FERRAILLAGE:	DATE:	VISA CHEF DE PROJET
<u>OK ferraillage 30/05/97</u> <u>08h30</u>	<u>30 Mai 97</u>	<u>[Signature]</u>

COFFRAGES:	ASPECT PAREMENT:	
	DEMOULANT:	
	INCORPORATION:	
	DATE: <u>21 Mai 97</u>	VISA CHEF DE CHANTIER BON A BETONNER
		<u>[Signature]</u>

BETONNAGE <u>effectué</u>	TYPE DE BETON <u>classe I</u>	
<u>le 02/06/1997 de</u>	MOYENS <u>BENNE:</u>	MALAXEUR:
<u>08h25 à 15h13.</u>	Nbre VIBREURS: <u>3</u>	
<u>Béton normal</u>	SURFACAGE: <u>REGLE:</u>	VALOCHÉ:
<u>slump 65-7,5cm</u>	CURE: <u>eau</u>	
<u>N. K. Baye</u>	DATE: <u>2 Juin 1997</u>	VISA CHEF DE CHANTIER

PRELEVEMENTS: <u>[Signature]</u>	ENTREPRISE:	MAÎTRE D'OEUVRE	Nbre: <u>12</u>
	RESULTATS:	INFOS	7 JOURS
			28 JOURS

POINT CRITIQUE:	OBSERVATIONS:
OBJET:	
LEVE LE:	
CONTRÔLE EXTERNE	CONTRÔLE INTERNE
<u>OK Ferraillage 30/05/97</u> <u>[Signature]</u>	<u>[Signature]</u>

CONFORMITE D'EXECUTION		
VISA CONTRÔLE EXTERNE	FOUGEROLLE C.S.E	MAÎTRE D'OEUVRE
<u>[Signature]</u>	<u>[Signature]</u>	

ok 31/05/97 12h00

GROUPEMENT FOUGEROLLE C.S.E

BARRAGE AL-BASSAM DE NIANDOUBA

FICHE D'EXECUTION No :

CHANTIER: Niandouba

No :

DEFINITION DE L'OUVRAGE: Barrage de Restriction - Plots C3 - 2nd		PLAN D'EXECUTION: COFFRAGE No: 215.214 INDICE: B	
POINT CRITIQUE EVENTUEL: OUI: NON:		ACIER No: 224 INDICE: 0	
OBJET:		Cote 27.236 m a La cote 30.686 m	
RECEPTION FERRAILLAGE:	DATE: 23-05-97	VISA CHEF DE PROJET	
OK	23/05/97	[Signature]	
OFFRAGES:	ASPECT PAREMENT:	VISA CHEF DE CHANTIER	
	DEMOULANT:	BON A BETONNER	
	INCORPORATION:		
	DATE: 24-05-97		
	15H30		
BETONNAGE effectue le 25/05/97 de 07h30 à 15h00 Bon déroulement N.K. Goye [Signature]	TYPE DE BETON classe 1	MALAXEUR:	
	MOYENS BENNE:		
	Nbre VIBREURS: 4	VALOCHES:	
	SURFACAGE: REGLE:		
	CURE: eau		
	DATE: 25-05-97	VISA CHEF DE CHANTIER	
PRELEVEMENTS: OK	ENTREPRISE:	MAÎTRE D'OEUVRE	Nbre: 12
	RESULTATS:	INFOS	7 JOURS
			28 JOURS
POINT CRITIQUE:	OBSERVATIONS:		
OBJET:			
LEVE LE:			
CONTRÔLE EXTERNE	CONTRÔLE INTERNE		
OK ferraillage 23/05/97 [Signature]	[Signature]		
CONFORMITE D'EXECUTION			
VISA CONTRÔLE EXTERNE	FOUGEROLLE C.S.E	MAÎTRE D'OEUVRE	
[Signature] 24/05/97 17:30 OK	[Signature]		

GROUPEMENT FOUGEROLLE C.S.E

BARRAGE AL-BASSAM DE NIANDOUBA

FICHE D'EXECUTION No :

CHANTIER: *Niandouba*

No :

DEFINITION DE L'OUVRAGE:	<i>Genrage de Restauration Plois (Suez)</i>	
PLAN D'EXECUTION:	COFFRAGE No: <i>214-215</i>	INDICE: <i>B cote 26.56 m</i>
	ACIER No: <i>222-223</i>	INDICE: <i>0 a la cote 27.54 m</i>
POINT CRITIQUE EVENTUEL:	OUI:	NON:
OBJET:		

RECEPTION FERRAILLAGE:	DATE:	VISA CHEF DE PROJET
<i>OK ferraillage des voiles 14/05/97</i>	<i>jeudi 15.05.97</i>	<i>[Signature]</i>
<i>OK ferraillage pente de tête 16/05/97</i>		

COFFRAGES:	ASPECT PAREMENT:	VISA CHEF DE CHANTIER
	DEMOULANT:	BON A BETONNER
	INCORPORATION:	<i>[Signature]</i>
	DATE:	
	<i>Vendredi 16.05.97</i>	

BETONNAGE	TYPE DE BETON	MALAXEUR:
<i>effectuee le 17/05/97 de 08h00 a 12h00. Bm de coulement. Beton normal</i>	<i>Classe 1</i>	
	MOYENS BENNE:	
	Nbre VIBREURS: <i>4</i>	
	SURFACAGE: <i>REGLE</i>	VALOCHÉ:
	CURE: <i>eau</i>	
	DATE:	VISA CHEF DE CHANTIER
	<i>Samedi 17.05.97</i>	<i>[Signature]</i>

PRELEVEMENTS:	ENTREPRISE:	MAÎTRE D'OEUVRE
<i>17/05</i>		Nbre: <i>12</i>
RESULTATS:	INFOS	7 JOURS
		28 JOURS

POINT CRITIQUE:	OBSERVATIONS:
OBJET:	
LEVE LE:	
CONTRÔLE EXTERNE	CONTRÔLE INTERNE
<i>OK ferraillage 16/05/97</i>	<i>[Signature]</i>

CONFORMITE D'EXECUTION		
VISA CONTRÔLE EXTERNE	FOUGEROLLE C.S.E	MAÎTRE D'OEUVRE
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	

OK 16/05/97 17.00

GROUPEMENT FOUGEROLLE C.S.E

BARRAGE AL-BASSAM DE NIANDOUBA

FICHE D'EXECUTION No:

CHANTIER: *Passage de Niandouba (Lieu 1) De la cote 21.90m à la cote 21.96m*

DEFINITION DE L'OUVRAGE: *Gouffre de ventilation (plots) C 22.560 à 21.96m*
 PLAN D'EXECUTION: COFFRAGE No: *2.14* INDICE: *3*
 ACIER No: *2.2.1* INDICE: *0*

POINT CRITIQUE EVENTUEL: OUI: NON:
 OBJET:

RECEPTION FERRAILLAGE: DATE: *9. Mai 97* VISA CHEF DE PROJET
[Signature]

DIFFRAGES: ASPECT PAREMENT:
 DEMOULANT:
 INCORPORATION:

DATE: *02 Mai 97* VISA CHEF DE CHANTIER
15 Heures BON A BETONNER
A.umi Saqma

BETONNAGE *effectuee* le *10/05/97* de *10h20* à *16h00*
 avec du beton normal de slump. *est 8cm.* N.K. Gaye. *[Signature]*
 TYPE DE BETON *classé T*
 MOYENS BENNE: MALAXEUR:
 Nbre VIBREURS: *3*
 SURFACAGE: REGLE: VALOCHTE:
 CURE: *eau*

DATE: *10 Mai 97* VISA CHEF DE CHANTIER
A.umi Saqma

RELEVEMENTS: ENTREPRISE: MAÎTRE D'OEUVRE Nbre: *12*

RESULTATS:	INFOS	7 JOURS	28 JOURS

POINT CRITIQUE: OBSERVATIONS:
 OBJET: *voir LEVÉ TOPO ci-joint.*
 LEVE LE: *Bm de coulement du coulage effectuee avec une grue ppil et 3 gabottes.*

le *mi* veau de *10* eau de pluie (*est* le *60* mm enregistré le *10/05/97*) est à la cote *21.90* m à *0,50* m de fin de bécote
 N.K. Gaye *[Signature]*

CONFORMITE D'EXECUTION

VISA CONTRÔLE EXTERNE FOUGEROLLE C.S.E MAÎTRE D'OEUVRE
[Signature] *[Signature]*

ok 09/05/97 18.00

LEVES TOPO. FAITS LE 09 MAI 1997.

LEVE #PNT	COFFRAGE NORD (Y)	PLOT # 5 EST (X)	OUVRAGE DE RESTITUTION ELEVATION	DESCRIPTION O/S LEVE/PLAN
14190	1424973.44	612814.40	24.953	CO 2.511/ 2.493 14.725/14.747
14191	1424970.62	612810.28	24.944	CO 2.474/ 2.494 14.739/14.740
14192	1424978.00	612805.18	24.946	CO 2.483/ 2.494
14193	1424984.81	612800.50	24.951	CO 2.473/ 2.494 31.980/31.995
14194	1424981.69	612804.14	25.989	CO 1.249/ 1.250 27.344/27.386
14195	1424983.12	612806.18	25.992	CO 1.240/ 1.250 27.361/27.386
14196	1424979.78	612805.46	24.947	CO 1.246/ 1.250 25.017/25.050
14197	1424980.49	612806.48	24.953	CO 0.003/ 0.000 25.020/25.050
14198	1424981.19	612807.51	24.948	CO 1.243/ 1.250 25.013/25.050
14199	1424980.81	612809.30	24.955	CO 2.496/ 2.493
14200	1424980.13	612808.25	24.950	CO 1.254/ 1.250 23.720/23.750
14201	1424979.78	612807.74	24.953	CO 0.629/ 0.620 23.728/23.750
14202	1424979.06	612806.72	24.944	CO 0.617/ 0.620 23.709/23.750
14203	1424978.71	612806.20	24.948	CO 1.248/ 1.250 23.718/23.750
14204	1424980.13	612805.97	23.540	CO 0.622/ 0.620 (23.540) 25.017/25.050
14205	1424980.84	612807.00	23.542	CO 0.625/ 0.620 (23.540) 25.015/25.050
14206	1424973.58	612809.76	23.901	CO 1.231/ 1.250 17.472/17.500
14207	1424974.99	612811.82	23.899	CO 1.270/ 1.250 17.470/17.500
14208	1424984.81	612800.50	24.945	CO 2.473/ 2.294 31.969/31.997
14209	1424985.51	612801.52	24.958	CO 1.233/ 1.250 31.968/31.991
14210	1424986.94	612803.58	24.951	CO 1.272/ 1.250 31.981/31.991
14211	1424987.64	612804.58	24.940	CO 2.494/ 2.495 31.988/31.991

NOTE: LE COFFRAGE EST ACCEPTE. NOUS CONSTATONS QUE L'ENTREPRENEUR A POSITIONNE L'ENSEMBLE DES COFFRAGES AVEC UN DECALAGE MOYEN DE 30MM VERS L'AXE. NOUS ACCEPTEONS LES COFFRAGES AINSI PUISQUE NOUS AVIONS PREALABLEMENT ACCEPTE UN DECALAGE IDENTIQUE DE 50MM A LA SPIRALE DU RADIER. NOUS CROYONS QUE CETTE DIFFERENCE NE METTRA PAS EN PERIL L'EFFICACITE DE L'OUVRAGE.

GROUPEMENT FOUGEROLLE C.S.E

BARRAGE AL-BASSAM DE NIANDOUBA

FICHE D'EXECUTION No:

CHANTIER: Barrage de Niandouba No: _____

DEFINITION DE L'OUVRAGE: <u>Evacuateur A.</u>								
PLAN D'EXECUTION:	COFFRAGE No: <u>205</u>	INDICE: <u>0</u>						
	ACIER No: <u>206</u>	INDICE: <u>A</u>						
POINT CRITIQUE EVENTUEL:	OUI:	NON:						
OBJET:								
RECEPTION FERRAILLAGE: <u>OK</u> <u>ferraillage 05/05/97</u> <u>St. G. Gaye.</u>	DATE: <u>5 Mai 1997</u>	VISA CHEF DE PROJET <u>[Signature]</u>						
COFFRAGES:	ASPECT PAREMENT: DEMOULANT: INCORPORATION:							
	DATE: <u>6 Mai 1997</u> <u>17 Heures</u>	VISA CHEF DE CHANTIER BON A BETONNER <u>A. M. Sagna</u>						
BETONNAGE <u>effectue</u> <u>6 07/05/97 de</u> <u>8h00 à 13h00</u> <u>avec un beton</u> <u>normal de stamp-est 8cm</u>	TYPE DE BETON <u>classé</u> MOYENS <u>BENNE</u> : Nbre VIBREURS: <u>3</u> SURFACAGE: <u>REGLE</u> : CURE: <u>eau</u>	MALAXEUR: VALOCHTE:						
	DATE: <u>07 Mai 1997</u>	VISA CHEF DE CHANTIER <u>A. M. Sagna</u>						
PRELEVEMENTS:	ENTREPRISE:	MAÎTRE D'OEUVRE Nbre: <u>12</u>						
	RESULTATS:	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th>INFOS</th> <th>7 JOURS</th> <th>28 JOURS</th> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </table>	INFOS	7 JOURS	28 JOURS			
INFOS	7 JOURS	28 JOURS						
POINT CRITIQUE:	OBSERVATIONS:							
OBJET:								
LEVE LE:								
CONTRÔLE EXTERNE	CONTRÔLE INTERNE							
<u>OK ferraillage 05/05/97</u> <u>St. G. Gaye.</u>	<u>[Signature]</u>							
* CONFORMITE D'EXECUTION								
VISA CONTRÔLE EXTERNE	FOUGEROLLE C.S.E	MAÎTRE D'OEUVRE						
<u>[Signature]</u>	<u>[Signature]</u>							

OK 06/05/97 17h00 hrs

GROUPEMENT FOUGEROLLE C.S.E

BARRAGE AL-BASSAM DE NIANDOUBA

FICHE D'EXECUTION No:

CHANTIER: *Deversin (evacuateur) lame plot 11*

DEFINITION DE L'OUVRAGE: <i>Plot H lame Deversin</i>	COTFRAGE No: <i>205</i>	INDICE: <i>0</i>
PLAN D'EXECUTION:	ACIER No: <i>2.06</i>	INDICE: <i>A</i>

POINT CRITIQUE EVENTUEL:	OUI:	NON:
OBJET:		

RECEPTION FERRAILLAGE: <i>Faite le 25/04/97. M. K. Gnyo</i>	DATE: <i>25.04.97</i>	VISA CHEF DE PROJET <i>[Signature]</i>
---	-----------------------	---

COTFRAGES:	ASPECT PAREMENT:	
	DEMOULANT:	
	INCORPORATION:	

DATE: <i>26-04-97</i>	VISA CHEF DE CHANTIER BON A BETONNER <i>Amei Sagne</i>
-----------------------	--

BETONNAGE <i>Effectuee le dimanche 27/04/97 entre 08h00 et 16h00 avec un beton normal de slump-test 9,00cm</i>	TYPE DE BETON <i>classe C</i>	MALAXEUR:
	MOYENS BENNE:	
	Nbre VIBREURS: <i>2</i>	
	SURFACAGE:	REGLE:
	CURE: <i>eau</i>	

DATE: <i>26-04.97</i>	VISA CHEF DE CHANTIER <i>Amei Sagne</i>
-----------------------	--

PRELEVEMENTS:	ENTREPRISE:	MAÎTRE D'OEUVRE	Nbre: <i>12</i>
---------------	-------------	-----------------	-----------------

RESULTATS:	INFOS	7 JOURS	28 JOURS

POINT CRITIQUE: <i>Il a été constate après contrôle avec le repère 122 du plan 206 d'indice A manquait d'une barre HA 16 de longueur 12.42m. La conformité est vérifiée.</i>	OBSERVATIONS: <i>A la suite de la réponse de Monsieur Jean Claude Morlet relative au montage du coffrage courbe fermé par "mergode" le 24/04/97, la réception de ferrailage du débiteur du plot H de bétonneur est faite le 25/04/97. M. K. Gnyo.</i>
--	---

CONTRÔLE EXTERNE <i>ok ferrailage le 25/04/97. après la mise en conformité du repère 22. [Signature]</i>	CONTRÔLE INTERNE <i>[Signature]</i>
---	--

CONFORMITE D'EXECUTION

VISA CONTRÔLE EXTERNE <i>[Signature]</i>	FOUGEROLLE C.S.E <i>[Signature]</i>	MAÎTRE D'OEUVRE
---	--	-----------------

** LE COFFRAGE N'EST PAS PLACÉ LE 25/04/97 AU SOIR. RECEPTION REMISE AU 26/04/97. RECEPTION TOPO. OK 26/04/97 16:00HRE -*

GROUPEMENT FOUGEROLLE C.S.E

BARRAGE AL-BASSAM DE NIANDOUBA

FICHE D'EXECUTION No:

CHANTIER: *Coupage de Restauration no 1 des 5 de 0*

DEFINITION DE L'OUVRAGE:		COFFRAGE No: <i>2-14</i>		INDICE: <i>4</i>						
PLAN D'EXECUTION:		ACIER No: <i>221</i>		INDICE: <i>0</i>						
POINT CRITIQUE EVENTUEL:		OUI:		NON:						
OBJET:										
RECEPTION FERRAILLAGE: <i>OK ferrailage le 23/04/97. Report sur le retard des ferrailleurs.</i>		DATE: <i>22.04.97.</i>	VISA CHEF DE PROJET							
		<i>M.K. Gaye</i>		<i>[Signature]</i>						
COFFRAGES:		ASPECT PAREMENT:								
		DEMOULANT:								
		INCORPORATION:								
		DATE: <i>23.04.97</i>	VISA CHEF DE CHANTIER							
			BON A BETONNER							
		<i>Ame Sogme</i>								
BETONNAGE <i>23/04/97.</i>		TYPE DE BETON <i>classe I</i>								
<i>Stamp-Test: 1/2cm.</i>		MOYENS BENNE:		MALAXEUR:						
		Nbre VIBREURS: <i>2</i>								
		SURFACAGE: <i>eau</i>		VALOCHÉ:						
		CURE: <i>eau</i>								
		DATE: <i>25.04.97</i>	VISA CHEF DE CHANTIER							
		<i>Ame Sogme</i>								
PRELEVEMENTS:		ENTREPRISE:	MAÎTRE D'OEUVRE	Nbre:						
RESULTATS:		<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>INFOS</th> <th>7 JOURS</th> <th>28 JOURS</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table>			INFOS	7 JOURS	28 JOURS			
INFOS	7 JOURS	28 JOURS								
POINT CRITIQUE:		OBSERVATIONS: <i>Bétonnage défectueux à 11h20.</i>								
OBJET:		<i>Problème de vibration pour les aiguilles φ80. Une seule aiguille n'est pas en état.</i>								
LEVE LE:		<i>M.K. Gaye</i>								
		<i>[Signature]</i>								
CONTRÔLE EXTERNE		CONTRÔLE INTERNE								
<i>OK ferrailage et bétonnage 15h45 23/04/97. [Signature]</i>		<i>[Signature]</i>								
* CONFORMITE D'EXECUTION										
VISA CONTRÔLE EXTERNE		FOUGEROLLE C.S.E		MAÎTRE D'OEUVRE						
<i>[Signature]</i>		<i>[Signature]</i>								

OK 23/04/97 12:00AM

GROUPEMENT FOUGEROLLE C. S. E

BARRAGE AL-BASSAM DE NIANDOUBA

FICHE D'EXECUTION No :

CHANTIER: *Niandouba*

No : *R9*

DEFINITION DE L'OUVRAGE: <i>Ouvrage de restitution - Plot 5</i>		
PLAN D'EXECUTION:	COTTRAGE No: <i>214 - 215</i>	INDICE: <i>A</i>
	ACIER No: <i>221</i>	INDICE: <i>0</i>
POINT CRITIQUE EVENTUEL:	OUI:	NON:
OBJET:		
RECEPTION FERRAILLAGE:	DATE: <i>29/03/1997</i>	VISA CHEF DE PROJET <i>P.O. H</i>

OTFRAGES :	ASPECT PAREMENT:	
	DEMOULANT:	
	INCORPORATION:	
	DATE: <i>02/04/1997</i>	VISA CHEF DE CHANTIER BON A BETONNER <i>[Signature]</i>

BETONNAGE	TYPE DE BETON	
	MOYENS BENNE:	MALAXEUR:
	Nbre VIBREURS:	
	SURFACAGE: REGLE:	TALOCHTE:
	CURE:	
	DATE: <i>07/04/1997 - à partir de 5h00</i>	VISA CHEF DU CHANTIER <i>[Signature]</i>

PRELEVEMENTS :	ENTREPRISE :	MAÎTRE D'OEUVRE	Nbre :
	RESULTATS :		
		INFOS	7 JOURS 28 JOURS

POINT CRITIQUE :	OBSERVATIONS :
OBJET :	<i>ALTIMÉTRIE DU RADIER</i>
LEVE LE :	<i>SEMBLE CORRECTE.</i>

CONTRÔLE EXTERNE	CONTRÔLE INTERNE
------------------	------------------

CONFORMITE D'EXECUTION		
VISA CONTRÔLE EXTERNE	FOUGEROLLE C. S. E	MAÎTRE D'OEUVRE
<i>[Signature]</i>		

Approuvé 07/04/97 7:30 AM

GROUPEMENT FOUGEROLLE C.S.E

BARRAGE AL-BASSAM DE NIANDOUBA

FICHE D'EXECUTION No:

CHANTIER: Niandouba

No: R

DEFINITION DE L'OUVRAGE: <u>Deversoir Plot B (lampe)</u>								
PLAN D'EXECUTION:	COFFRAGE No: <u>205</u>	INDICE: <u>0</u>						
	ACIER No: <u>206</u>	INDICE: <u>A</u>						
POINT CRITIQUE EVENTUEL:	OUI:	NON:						
OBJET:								
RECEPTION FERRAILLAGE: <u>Reception faite le 08/04/97. OK N. Gaby.</u>	DATE: <u>06/04/1997</u>	VISA CHEF DE PROJET <u>P. Gaby</u>						
COFFRAGES:	ASPECT PAREMENT: DEMOULANT: INCORPORATION:							
	DATE: <u>07/04/1997 - 17H</u>	VISA CHEF DE CHANTIER BON A BETONNER <u>[Signature]</u>						
BETONNAGE	TYPE DE BETON <u>classe I</u>							
	MOYENS <u>BENNE</u>	MALAXEUR:						
	Nbre VIBREURS: <u>3</u>							
	SURFACAGE: <u>REGLE</u>	TALOCHÉ:						
	CURE: <u>eau</u>							
	DATE: <u>08/04/1997 - 8H</u>	VISA CHEF DE CHANTIER <u>[Signature]</u>						
RELEVEMENTS:	ENTREPRISE:	MAÎTRE D'OEUVRE Nbre:						
	RESULTATS:	<table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <tr> <td>INTOS</td> <td>7 JOURS</td> <td>28 JOURS</td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </table>	INTOS	7 JOURS	28 JOURS			
INTOS	7 JOURS	28 JOURS						
POINT CRITIQUE:		OBSERVATIONS:						
OBJET:		<u>Asymétrie contrôlée au niveau (NA-2) -</u>						
LEVE LE:								
CONTRÔLE EXTERNE	CONTRÔLE INTERNE							
<u>OK ferraillage. N. Gaby</u>	<u>Bon pour couler le béton le 08/04/97 -</u>							
CONFORMITE D'EXECUTION								
VISA CONTRÔLE EXTERNE	FOUGEROLLE C.S.E	MAÎTRE D'OEUVRE						
<u>[Signature]</u>								

07/04/97 18:15

GROUPEMENT FOUGEROLLE C.S.E

BARRAGE AL-BASSAM DE NIANDOUBA

FICHE D'EXECUTION No :

CHANTIER: *Niandouba*

No :

DEFINITION DE L'OUVRAGE: <i>Plots (Radier)</i>								
PLAN D'EXECUTION: <i>r</i>	COFFRAGE No: <i>214</i>	INDICE: <i>0</i>						
	ACIER No: <i>211</i>	INDICE: <i>0</i>						
POINT CRITIQUE EVENTUEL:	OUI:	NON:						
OBJET:								
RECEPTION FERRAILLAGE:	DATE:	VISA CHEF DE PROJET <i>[Signature]</i>						
COFFRAGES :								
ASPECT PAREMENT:								
DEMOULANT:								
INCORPORATION:								
	DATE: <i>02.03.97</i>	VISA CHEF DE CHANTIER BON A BETONNER <i>Aime Soqna</i>						
BETONNAGE	TYPE DE BETON <i>ROM 1</i>							
	MOYENS BENNE:	MALAXEUR:						
	Nbre VIBREURS: <i>2</i>							
	SURFACAGE: REGLE:	VALOCHÉ:						
	CURE: <i>eau</i>							
	DATE: <i>03.04.97</i>	VISA CHEF DE CHANTIER <i>Aime Soqna</i>						
PRELEVEMENTS:	ENTREPRISE:	MAÎTRE D'OEUVRE Nbre:						
	RESULTATS:	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th>INFOS</th> <th>7 JOURS</th> <th>28 JOURS</th> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </table>	INFOS	7 JOURS	28 JOURS			
INFOS	7 JOURS	28 JOURS						
POINT CRITIQUE:	OBSERVATIONS:							
OBJET:	<i>ALTIMÉTRIE DU RADIER NON CONFORME LE 02/04/97, LE 03/04/97, LE 04/04/97, LE 05/04/97. LE CHANTIER EST FERMÉ. ALTIMÉTRIE... NON CONFORME LE 06/04/97.</i>							
LEVE LE:								
CONTRÔLE EXTERNE	CONTRÔLE INTERNE							
CONFORMITE D'EXECUTION								
VISA CONTRÔLE EXTERNE	FOUGEROLLE C.S.E	MAÎTRE D'OEUVRE						
<i>[Signature]</i>								

Non Approuvé le 06/04/97 à midi.

GROUPEMENT FOUGEROLLE C.S.E

BARRAGE AL-BASSAM DE NIANDOUBA

FICHE D'EXECUTION No :

CHANTIER: *Niandouba*

No :

DEFINITION DE L'OUVRAGE: <i>Evacuateur (Same plan)</i>								
PLAN D'EXECUTION:	COFFRAGE No: <i>205</i>	INDICE: <i>0</i>						
	ACIER No: <i>206</i>	INDICE: <i>A</i>						
POINT CRITIQUE EVENTUEL:	OUI:	NON:						
OBJET:								
RECEPTION FERRAILLAGE:	DATE: <i>27.03.97</i>	VISA CHEF DE PROJET <i>[Signature]</i>						
COFFRAGES:	ASPECT PAREMENT: DEMOULANT: INCORPORATION:							
	DATE: <i>28.03.97</i>	VISA CHEF DE CHANTIER BON A BETONNER <i>Aimé Jean SAGNA</i>						
BETONNAGE	TYPE DE BETON <i>classe I</i>							
	MOYENS BENNE:	MALAXEUR:						
	Nbre VIBREURS: <i>2</i>							
	SURFACAGE: <i>REGLE</i>	TALOCHÉ:						
	CURE: <i>eau</i>							
	DATE: <i>29.03.97</i>	VISA CHEF DE CHANTIER <i>Aimé Jn SAGNA</i>						
PRELEVEMENTS:	ENTREPRISE:	MAÎTRE D'OEUVRE Nbre:						
	RESULTATS:	<table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <tr> <th>INFOS</th> <th>7 JOURS</th> <th>28 JOURS</th> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </table>	INFOS	7 JOURS	28 JOURS			
INFOS	7 JOURS	28 JOURS						
POINT CRITIQUE:	OBSERVATIONS:							
OBJET:	<i>LE COFFRAGE COMPORTAIT DES ÉCARTS (30MM) EN ÉLÉVATION. IL A ÉTÉ CORRIGÉ LORS DE LA RÉCEPTION.</i>							
LEVÉ LE:								
CONTRÔLE EXTERNE	CONTRÔLE INTERNE							
<i>OK ferraillage 27/03/97</i>	<i>[Signature]</i>							
* CONFORMITÉ D'EXECUTION								
VISA CONTRÔLE EXTERNE	FOUGEROLLE C.S.E	MAÎTRE D'OEUVRE						
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>							

29-03-97 10:00 AM

GROUPEMENT FOUGEROLLE C.S.E

BARRAGE AL-BASSAM DE NIANDOUBA

FICHE D'EXECUTION No:

CHANTIER: *Niandouba*

No :

REÇU

MAR 24 1997

Par: *P. 7400*

TECSULT International Limitée
experts-consultants
Montréal - Canada

DEFINITION DE L'OUVRAGE: <i>Courage de Restauration - Radier plat</i>							
PLAN D'EXECUTION:	COFFRAGE No: <i>216</i> INDICE: <i>0</i> ACIER No: <i>221</i> INDICE: <i>0</i>						
POINT CRITIQUE EVENTUEL:	OUI: NON:						
OBJET:							
RECEPTION FERRAILLAGE: <i>Receptionne le 28/03/97 en presence des responsables de l'entreprise, de la mission et du bureau de controle N. Goye - J. Goye -</i>	DATE: <i>27.03.97</i> VISA CHEF DE PROJET <i>[Signature]</i>						
COFFRAGES:	ASPECT PAREMENT: DEMOULANT: INCORPORATION:						
	DATE: <i>27.03.97</i> VISA CHEF DE CHANTIER, BON A BETONNER, <i>Aime Sagna</i>						
BETONNAGE	TYPE DE BETON: <i>classé I</i> MOYENS: <i>BENNE</i> MALAXEUR: Nbre VIBREURS: <i>2</i> SURFACAGE: <i>REGLE</i> VALOCHÉ: CURE: <i>eau</i>						
	DATE: <i>28.03.97</i> VISA CHEF DE CHANTIER, <i>Aime Sagna</i>						
PRELEVEMENTS:	ENTREPRISE: MAÎTRE D'OEUVRE Nbre: <i>12</i>						
	RESULTATS:						
	<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th>INTOS</th> <th>7 JOURS</th> <th>28 JOURS</th> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </table>	INTOS	7 JOURS	28 JOURS			
INTOS	7 JOURS	28 JOURS					
POINT CRITIQUE:	OBSERVATIONS: <i>LE COFFRAGE N'EST PAS PRÊT LE 28/03/97 - RÉCEPTION REMISE - - -</i>						
OBJET:							
LEVE LE:							
CONTRÔLE EXTERNE	CONTRÔLE INTERNE						
<i>OK ferraillage. 28/03/97</i> <i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>						
* CONFORMITE D'EXECUTION							
VISA CONTRÔLE EXTERNE	FOUGEROLLE C.S.E	MAÎTRE D'OEUVRE					
	<i>[Signature]</i>						

GROUPEMENT FOUGEROLLE C.S.E

BARRAGE AL-BASSAM DE NIANDOUBA

FICHE D'EXECUTION No:

REÇU

MAR 24 1997

Par: *P. 7400*

Tecsult International Limitée
experts-consultants
Montreal - Canada

CHANTIER: *Chandado*

No :

DEFINITION DE L'OUVRAGE: <i>Plan de gauche = avec eau (Plan 3)</i>		
PLAN D'EXECUTION:	COFFRAGE No: <i>202</i>	INDICE: <i>0 (2^e plan)</i>
	ACIER No: <i>204</i>	INDICE: <i>0</i>
POINT CRITIQUE EVENTUEL:	OUI:	NON:
OBJET:		
RECEPTION FERRAILLAGE:	DATE: <i>25-03-97</i> <i>Plan 3 (2^e plan)</i>	VISA CHEF DE PROJET <i>[Signature]</i>
COFFRAGES:	ASPECT PAREMENT: DEMOULANT: INCORPORATION:	
	DATE: <i>26-03-97</i> <i>Plan 3 (2^e plan)</i> <i>10 heures</i>	VISA CHEF DE CHANTIER BON A BETONNER <i>Arme Sagne</i>
BETONNAGE <i>effectuée</i> <i>le 27/03/97</i> <i>à 11h30 et 19h00 - Les</i> <i>cables de béton ont été</i> <i>mis en place de manière</i> <i>progressive au cours du</i> <i>colage pour éviter les</i>	TYPE DE BETON <i>classe 2</i> MOYENS <i>BENNE</i> Nbre VIBREURS: <i>2</i> SURFACAGE: <i>REGLE</i> CURE: <i>eau</i>	MALAXEUR: VALOCHÉ:
	DATE: <i>26-03-97</i>	VISA CHEF DE CHANTIER
PRELEVEMENTS: <i>Les échantillons</i> <i>peuvent être creusés par la chute de la</i> <i>coulée de béton et les</i> <i>ouvriers chargés de vibrer le béton.</i>	ENTREPRISE: RESULTATS: <i>mouvement</i>	MAÎTRE D'OEUVRE Nbre: <i>12</i>
POINT CRITIQUE:	<i>N. Gayoff / P. 7400</i>	OBSERVATIONS: <i>COFFRAGE "PRÊT" SEULEMENT LE</i> <i>27/03/97 AU MATIN.</i> <i>AU MOMENT DE LA RÉCEPTION, IL N'AVAIT</i> <i>PAS ÉTÉ PLOMBÉ ET LIGNÉ ET COMPAR-</i> <i>TAIT DE NOMBREUSES ERREURS DE</i> <i>MESURE -</i> <i>L'AUTORISATION DE BÉTONNER A ÉTÉ</i> <i>DONNÉE APRÈS LES CORRECTIONS LES PLUS</i> <i>IMPORTANTES.</i>
OBJET:		
LEVÉ LE:		
CONTRÔLE EXTERNE	CONTRÔLE INTERNE	
<i>OK ferrailage 25/03/97</i> <i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	
CONFORMITÉ D'EXECUTION		
VISA CONTRÔLE EXTERNE	FOUGEROLLE C.S.E	MAÎTRE D'OEUVRE
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	

27/03/97 15:00

GROUPEMENT FOUGEROLLE C.S.E

BARRAGE AL-BASSAM DE NIANDOUBA

FICHE D'EXECUTION No:

CHANTIER: Niandouba

No :

DEFINITION DE L'OUVRAGE: <u>Deuxième Plan C (6 Same) Plan C</u>							
PLAN D'EXECUTION:	COFFRAGE No: <u>205</u> INDICE: <u>0</u> ACIER No: <u>206</u> INDICE: <u>A</u>						
POINT CRITIQUE EVENTUEL:	OUI: NON:						
OBJET:							
RECEPTION FERRAILLAGE:	DATE: <u>22-03-97</u> VISA CHEF DE PROJET <u>[Signature]</u>						
COFFRAGES:	ASPECT PAREMENT: DEMOULANT: INCORPORATION: DATE: <u>24-03-97</u> <u>(8 Heures)</u> VISA CHEF DE CHANTIER BON A BETONNER <u>Aeme Saogo</u>						
BETONNAGE	TYPE DE BETON <u>Class I</u> MOYENS BENNE: Nbre VIBREURS: <u>3</u> MALAXEUR: SURFACAGE: REGLE: TALOCHE: CURE: <u>eau</u> DATE: <u>24-03-97</u> VISA CHEF DE CHANTIER <u>Aeme Saogo</u>						
PRELEVEMENTS:	ENTREPRISE: MAÎTRE D'OEUVRE Nbre: <u>12</u>						
	RESULTATS:						
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>INFOS</th> <th>7 JOURS</th> <th>28 JOURS</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table>	INFOS	7 JOURS	28 JOURS			
INFOS	7 JOURS	28 JOURS					
POINT CRITIQUE:	OBSERVATIONS: <u>INSTRUMENT DÉFECTUEUX.</u> <u>LEVÉ TOPO. IMPOSSIBLE.</u> <u>NOUS DEMANDONS À L'ENTREPRENEUR DE SE CONFORMER AUX PLANS.</u>						
OBJET:							
LEVÉ LE:							
CONTRÔLE EXTERNE	CONTRÔLE INTERNE						
<u>[Signature]</u> <u>24/03/97</u>	<u>[Signature]</u>						
* CONFORMITE D'EXECUTION							
VISA CONTRÔLE EXTERNE	FOUGEROLLE C.S.E	MAÎTRE D'OEUVRE					
<u>[Signature]</u>	<u>[Signature]</u>						

24-03-97 7:30 AM.

GROUPEMENT FOUGEROLLE C.S.E

BARRAGE AL-BASSAM DE NIANDOUBA

FICHE D'EXECUTION No :

CHANTIER: *Niandouba*

No :



REÇU

MAR 24 1997

Par: *P. 7400*

Tecsult International Limitée
experts-conseils
Montreal - Canada

DEFINITION DE L'OUVRAGE: <i>Coupage de Restauration duvetes P2014</i>								
PLAN D'EXECUTION:	COFFRAGE No: <i>213</i>	INDICE: <i>0</i>						
	ACIER No: <i>220</i>	INDICE: <i>0</i>						
POINT CRITIQUE EVENTUEL:	OUI:	NON:						
OBJET:								
RECEPTION FERRAILLAGE:	DATE: <i>25-03-97</i>	VISA CHEF DE PROJET <i>[Signature]</i>						
COFFRAGES:	ASPECT PAREMENT:							
	DEMOULANT:							
	INCORPORATION:							
	DATE: <i>25-03-97</i>	VISA CHEF DE CHANTIER BON A BETONNER <i>Aime Sagna</i>						
BETONNAGE	TYPE DE BETON <i>class 1</i>							
	MOYENS BENNE:	MALAXEUR:						
	Nbre VIBREURS: <i>2</i>							
	SURFACAGE: <u>REGLE</u> :	<u>VALOCHÉ</u> :						
	CURE: <i>eau</i>							
	DATE: <i>25-03-97</i>	VISA CHEF DE CHANTIER <i>Aime Sagna</i>						
PRELEVEMENTS:	ENTREPRISE:	MAÎTRE D'ŒUVRE						
		Nbre: <i>12</i>						
	RESULTATS:	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th>INFOS</th> <th>7 JOURS</th> <th>28 JOURS</th> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </table>	INFOS	7 JOURS	28 JOURS			
INFOS	7 JOURS	28 JOURS						
POINT CRITIQUE:	OBSERVATIONS:							
OBJET:	<i>Le dimensionnement est vérifié par l'ingénieur N. Gage.</i>							
LEVÉ LE:								
CONTRÔLE EXTERNE	CONTRÔLE INTERNE							
<i>OK ferrailage N. Gage 22/03/97</i>	<i>[Signature]</i>							
* CONFORMITE D'EXECUTION								
VISA CONTRÔLE EXTERNE	FOUGEROLLE C.S.E	MAÎTRE D'ŒUVRE						
	<i>[Signature]</i>							




GROUPEMENT FOUGEROLLE C.S.E

BARRAGE AL-BASSAM DE NIANDOUBA

FICHE D'EXECUTION No :

CHANTIER: Niandouba

No :

DEFINITION DE L'OUVRAGE: <u>Execution des gâchées - Plat 1 Luce 3</u>								
PLAN D'EXECUTION:	COFFRAGE No: <u>202</u>	INDICE: <u>0</u>						
	ACIER No:	INDICE:						
POINT CRITIQUE EVENTUEL:	OUI:	NON:						
OBJET:								
RECEPTION FERRAILLAGE:	DATE:	VISA CHEF DE PROJET						
COFFRAGES :								
ASPECT PAREMENT:								
DEMOULANT:								
INCORPORATION:								
	DATE: <u>20-03-97</u> <u>au matin</u>	VISA CHEF DE CHANTIER. BON A BETONNER. 						
BETONNAGE	TYPE DE BETON <u>classé</u>							
<u>OK 18/03/97</u> <u>N. Gage</u>	MOYENS BENNE:	MALAXEUR:						
	Nbre VIBREURS: <u>2</u>							
	SURFACAGE: REGLE:	TALOCHÉ:						
	CURE: <u>eau</u>							
	DATE: <u>20-03-97</u>	VISA CHEF DE CHANTIER. 						
PRELEVEMENTS:	ENTREPRISE:	MAÎTRE D'OEUVRE Nbre: <u>12</u>						
	RESULTATS:	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th>INFOS</th> <th>7 JOURS</th> <th>28 JOURS</th> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </table>	INFOS	7 JOURS	28 JOURS			
INFOS	7 JOURS	28 JOURS						
POINT CRITIQUE: <u>L'alignement a été</u>	OBSERVATIONS:							
OBJET: <u>Obtenu par une réduction</u>	<u>LE CONTRÔLE TOP. EST EFFECTUÉ LE 19-03-97 EN MATINÉE.</u> <u>LE COFFRAGE EST APPLIQUÉ AUX 4 coins sur du béton existant.</u> <u>PAR CONTRE, IL N'A PAS ÉTÉ LIGNÉ ET IL A UNE DÉFORMATION DE 60MM. AU CENTRE DU CÔTÉ GAUCHE.</u> <u>A APPROUVER PAR L'INGÉNIEUR...</u>							
LEVE LE: <u>par le topographe à un maxi- mum de 5mm - OK. N. Gage</u>								
CONTRÔLE EXTERNE	CONTRÔLE INTERNE							
CONFORMITÉ D'EXECUTION								
VISA CONTRÔLE EXTERNE	FOUGEROLLE C.S.E	MAÎTRE D'OEUVRE						
<u>Betha Bay</u> <u>19-03-97 Mid</u>								

GROUPEMENT FOUGEROLLE C.S.E

BARRAGE AL-BASSAM DE NIANDOUBA

FICHE D'EXECUTION No :

CHANTIER: Niandouba

No :

DEFINITION DE L'OUVRAGE: <u>Beurage de Restauration. Plot 3 (chaque, superieur)</u>								
PLAN D'EXECUTION:	COTTRAGE No: <u>213</u>	INDICE: <u>0</u>						
	ACIER No: <u>219</u>	INDICE: <u>0</u>						
POINT CRITIQUE EVENTUEL:	OUI:	NON:						
OBJET:								
RECEPTION FERRAILLAGE:	DATE: <u>19.03.97</u>	VISA CHEF DE PROJET <u>Stauder</u>						
COFFRAGES:	ASPECT PAREMENT: DEMOULANT: INCORPORATION:							
	DATE: <u>20.03.97</u>	VISA CHEF DE CHANTIER. BON A BETONNER <u>Stauder</u>						
BETONNAGE	TYPE DE BETON <u>class 1</u> MOYENS BENNE: Nbre VIBREURS: <u>2</u> SURFACAGE: <u>REGLE:</u> CURE: <u>eau</u>	MALAXEUR: VALOCHÉ:						
	DATE: <u>20.03.97</u>	VISA CHEF DE CHANTIER. <u>Stauder</u>						
PRELEVEMENTS:	ENTREPRISE:	MAÎTRE D'OEUVRE Nbre: <u>12</u>						
	RESULTATS:	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th>INFOS</th> <th>7 JOURS</th> <th>28 JOURS</th> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </table>	INFOS	7 JOURS	28 JOURS			
INFOS	7 JOURS	28 JOURS						
POINT CRITIQUE:	<u>Le dimensionnement</u>	OBSERVATIONS: <u>PAS DE CONTRÔLE TOPO - A FAIRE SUR LE TERRAIN.</u> <u>DIMENSIONNEMENT DES ANTI-RENARDS A ÊTRE APPROUVE PAR L'INGÉNIEUR AU CHANTIER.</u>						
OBJET:	<u>de deux anti renards du plot 3 de l'ouvrage de</u>							
LEVE LE:	<u>saturation est été vérifié et le bétonnage autorisé à 20/03/97</u>							
CONTRÔLE EXTERNE	CONTRÔLE INTERNE							
	<u>Stauder</u>							
* CONFORMITE D'EXECUTION								
VISA CONTRÔLE EXTERNE	FOUGEROLLE C.S.E	MAÎTRE D'OEUVRE						
<u>Stauder</u>	<u>Stauder</u>							

19.03.97 Midi

GROUPEMENT FOUGEROLLE C.S.E

BARRAGE AL-BASSAM DE NIANDOUBA

FICHE D'EXECUTION No :

CHANTIER: *Niandouba*

No :

DEFINITION DE L'OUVRAGE: <i>Evacuateur lame plot - F</i>								
PLAN D'EXECUTION:	COFFRAGE No: <i>205</i>	INDICE: <i>0</i>						
	ACIER No: <i>206</i>	INDICE: <i>1</i>						
POINT CRITIQUE EVENTUEL:	OUI:	NON:						
OBJET:								
RECEPTION FERRAILLAGE:	DATE: <i>14.03.97</i> <i>(4 mes. Audi)</i>	VISA CHEF DE PROJET <i>[Signature]</i>						
COFFRAGES:	ASPECT PAREMENT: DEMOULANT: INCORPORATION:							
	DATE: <i>14.03.97</i> <i>(4 mes. Audi Calculé)</i>	VISA CHEF DE CHANTIER BON A BETONNER						
BETONNAGE	TYPE DE BETON <i>classé I</i>							
	MOYENS BENNE:	MALAXEUR:						
	Nbre VIBREURS: <i>2</i>							
	SURFACAGE: REGLE:	TALOCHÉ:						
	CURE: <i>eau</i>							
	DATE: <i>18.03.97</i>	VISA CHEF DE CHANTIER <i>A une saignée</i>						
PRELEVEMENTS:	ENTREPRISE:	MAÎTRE D'OEUVRE Nbre: <i>12</i>						
	RESULTATS:	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>INFOS</td> <td>7 JOURS</td> <td>28 JOURS</td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </table>	INFOS	7 JOURS	28 JOURS			
INFOS	7 JOURS	28 JOURS						
POINT CRITIQUE:	OBSERVATIONS:							
OBJET:	<i>RÉCEPTION FAITE LE 15-03-97 AU MATIN. PAREMENT AMONT SEULEMENT EN PLACE - CONTRÔLE ALIGNEMENT ET ALTI-MÉTRIE OK.</i>							
LEVE LE:	<i>L'ENTREPRENEUR N'A QU'A POSITIONNER LE COFFRAGE PRÉFAB. EN FONCTION DE LA PARTIE RÉCEPTIONNÉE.</i>							
CONTRÔLE EXTERNE	CONTRÔLE INTERNE							
<i>OK ferrailage le 15/03/97 à 08h30. [Signature]</i>	<i>[Signature]</i>							
CONFORMITE D'EXECUTION								
VISA CONTRÔLE EXTERNE	FOUGEROLLE C.S.E	MAÎTRE D'OEUVRE						
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>							

15-03-97

GROUPEMENT FOUGEROLLE C.S.E

BARRAGE AL-BASSAM DE NIANDOUBA

FICHE D'EXECUTION No :

CHANTIER: Niandouba

No :

DEFINITION DE L'OUVRAGE: <i>Tru de gauche Evénement Plot 1 (1^{er} seuil)</i>							
PLAN D'EXECUTION:	COFFRAGE No: <i>202</i> INDICE: <i>0</i> ACIER No: INDICE:						
POINT CRITIQUE EVENTUEL:	OUI: NON:						
OBJET:							
RECEPTION FERRAILLAGE:	DATE: VISA CHEF DE PROJET						
COFFRAGES: ASPECT PAREMENT: DEMOULANT: INCORPORATION:							
DATE: <i>14.03.97</i> <i>(Après Pluie)</i>	VISA CHEF DE CHANTIER: <i>BON A BETONNER</i> <i>Aunte Saogo</i>						
BETONNAGE	TYPE DE BETON <i>classé 2</i> MOYENS BENNE: MALAXEUR: Nbre VIBREURS: <i>2</i> SURFACAGE: REGLE: TALOCHE: CURE:						
DATE: <i>15.03.97</i>	VISA CHEF DE CHANTIER:						
PRELEVEMENTS:	ENTREPRISE: MAÎTRE D'OEUVRE Nbre: <i>12</i>						
RESULTATS:	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th>INFOS</th> <th>7 JOURS</th> <th>28 JOURS</th> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </table>	INFOS	7 JOURS	28 JOURS			
INFOS	7 JOURS	28 JOURS					
POINT CRITIQUE:	OBSERVATIONS: <i>Bétonnage effectué le 15/03/97 entre 08h25 et 13h00. Problème de vibrateurs non performants - N-Gayo // B. Sy Gaye.</i>						
OBJET:							
LEVE LE:							
CONTRÔLE EXTERNE	CONTRÔLE INTERNE						
* CONFORMITE D'EXECUTION							
VISA CONTRÔLE EXTERNE	FOUGEROLLE C.S.E	MAÎTRE D'OEUVRE					
<i>Se al Bop</i> <i>14-03-97</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>					

GROUPEMENT FOUGEROLLE C.S.E

BARRAGE AL-BASSAM DE NIANDOUBA

FICHE D'EXECUTION No :

CHANTIER: *Niandouba*


No :

DEFINITION DE L'OUVRAGE: <i>Evacuation Route Plot A</i>								
PLAN D'EXECUTION:	COFFRAGE No: <i>205</i>	INDICE: <i>0</i>						
	ACIER No: <i>206</i>	INDICE: <i>1</i>						
POINT CRITIQUE EVENTUEL:	OUI:	NON:						
OBJET:								
RECEPTION FERRAILLAGE:	DATE: <i>07-03-97</i>	VISA CHEF DE PROJET <i>[Signature]</i>						
COFFRAGES:	ASPECT PAREMENT: DEMOULANT: INCORPORATION:							
	DATE: <i>07.03.97</i>	VISA CHEF DE CHANTIER BON A BETONNER <i>Ame J. SAGNA</i>						
BETONNAGE	TYPE DE BETON <i>class 5</i> MOYENS BENNE: <i>2</i> Nbre VIBREURS: SURFACAGE: <i>REGLE</i> CURE: <i>eau</i>	MALAXEUR: VALOISE:						
	DATE: <i>08.03.97</i>	VISA CHEF DE CHANTIER <i>A.J. SAGNA</i>						
PRELEVEMENTS:	ENTREPRISE:	MAÎTRE D'OEUVRE Nbre:						
	RESULTATS:	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 30%;">INFOS</th> <th style="width: 35%;">7 JOURS</th> <th style="width: 35%;">28 JOURS</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table>	INFOS	7 JOURS	28 JOURS			
INFOS	7 JOURS	28 JOURS						
POINT CRITIQUE:	OBSERVATIONS:							
OBJET:	<i>PAS PRÊT POUR LA RÉCEPTION, LE 08/03/97. RÉCEPTION PRÉVUE LE 10/03/97 AU MATIN.</i> <i>PAS PRÊT LE 10/03/97 AU MATIN.</i> <i>RÉCEPTION FAITE LE 10/03/97 EN FIN DE JOURNÉE - Béton mis en œuvre le 11/03/97. slump: 7,5cm</i> <i>Bon Béton.</i>							
LEVÉ LE:								
CONTRÔLE EXTERNE	CONTRÔLE INTERNE							
<i>OK ferraillage 08/03/97</i> <i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>							
* CONFORMITE D'EXECUTION								
VISA CONTRÔLE EXTERNE	FOUGEROLLE C.S.E	MAÎTRE D'OEUVRE						
<i>De laal Byer</i> <i>97/03/10</i>	<i>[Signature]</i>							

DESIGNATION	LUNDI	MARDI	MERCREDI	JEUDI	VENDREDI	SAMEDI	DIMANCHE
* MUR DE GAUCHE							
Coffrage pour levée Plot 2. levée 6							
Béton levée Plot 2. levée 6							
Coffrage plot 3 levée 3							
* EVACUATEUR							
Coffrage deversoire plot D							
Béton de propreté Plot A							
Ferraillage deversoire plot D							
Ferraillage Plot A							
Coffrage Plot A							
Béton Plot A							
Béton deversoire plot D							
Béton de propreté Bêches Plot A							
Pose ferraillage bêches Plot A							
Béton bêches Plot A							
* OUVRAGE DE RESTITUTION							
Béton de propreté Plot							
Ferraillage Radier Plot 5							
Coffrage Radier Plot 5							
Béton Radier Plot							
Ferraillage voiles Plot							
Coffrage Voiles Plot							
Béton Voiles Plot							
Ferraillage dalle plot 4							
Coffrage pour dalle de couverture Plot 4							
Béton dalle de couverture Plot 4							

Directeur des Travaux
J. C. MORLET

Chef de Chantier
Aimé J. SAGNA



GROUPEMENT FOUGEROLLE C.S.E

BARRAGE AL-BASSAM DE NIANDOUBA

FICHE D'EXECUTION No :

CHANTIER: *Niandouba*

No :

DEFINITION DE L'OUVRAGE: <i>Couvrage de Rectification (Dalle plan 4)</i>		PLAN D'EXECUTION: COFFRAGE No: <i>213</i> INDICE: <i>0</i>	
		ACIER No: <i>220</i> INDICE: <i>0</i>	
POINT CRITIQUE EVENTUEL: OUI: NON:		OBJET:	
RECEPTION TERRAILLAGE:	DATE: <i>05.03.97</i>	VISA CHEF DE PROJET <i>[Signature]</i>	
COFFRAGES:	ASPECT PAREMENT: DEMOULANT: INCORPORATION: DATE: <i>06.03.97</i> <i>15 Heures</i>	VISA CHEF DE CHANTIER. BON A BETONNER <i>Aime Jn SAGNA</i>	
BETONNAGE	TYPE DE BETON <i>classe I</i> MOYENS BENNE: Nbre VIBREURS: <i>2</i> SURFACAGE: REGLE: CURE: <i>eau</i> DATE: <i>06.03.97</i>	MALAXEUR: TALOCHE: VISA CHEF DE CHANTIER. <i>AD. SAGNA</i>	
PRELEVEMENTS:	ENTREPRISE:	MAÎTRE D'OEUVRE	Nbre:
RESULTATS:		INFOS	7 JOURS
			28 JOURS
POINT CRITIQUE:	OBSERVATIONS:		
OBJET:	<i>RÉCEPTION TOPO. PAS PRÊTE</i>		
LEVÉ LE:	<i>LE 06/03/97. REMISE LE 07/03/97 EN FIN DE JOURNÉE.</i>		
CONTRÔLE EXTERNE	CONTRÔLE INTERNE		
<i>OK ferrailage 06/03/97</i> <i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>		
* CONFORMITE D'EXECUTION			
VISA CONTRÔLE EXTERNE	FOUGEROLLE C.S.E	MAÎTRE D'OEUVRE	
<i>[Signature]</i> <i>07/03/97</i>	<i>[Signature]</i>		

GROUPEMENT FOUGEROLLE C.S.E

BARRAGE AL-BASSAM DE NIANDOUBA

FICHE D'EXECUTION No:

CHANTIER:

No :

DEFINITION DE L'OUVRAGE: Evacuateur (Pilot D)								
PLAN D'EXECUTION:	COTFRAGE No: 205	INDICE: 0						
	ACIER No: 206	INDICE: 0						
POINT CRITIQUE EVENTUEL:	OUI:	NON:						
OBJET:								
RECEPTION FERRAILLAGE:	DATE: 06.03.97	VISA CHEF DE PROJET <i>[Signature]</i>						
MOYENS:	ASPECT PAREMENT:							
	DEMOULANT:							
	INCORPORATION:							
	DATE: du 06.03.97. 17 Heures	VISA CHEF DE CHANTIER BON A BETONNER Ainsin SAGNA <i>[Signature]</i>						
BETONNAGE	TYPE DE BETON classe I							
	MOYENS BENNE: 2	MALAXEUR: —						
	Nbre VIBREURS: 2							
	SURFACAGE: —	VALOCHTE: —						
	REGLE: —							
	CURE: eau.							
	DATE: 07.03.97	VISA CHEF DE CHANTIER AJSAGNA <i>[Signature]</i>						
PRELEVEMENTS:	ENTREPRISE:	MAÎTRE D'OEUVRE Nbre: 12						
	RESULTATS:	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th>INFOS</th> <th>7 JOURS</th> <th>28 JOURS</th> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </table>	INFOS	7 JOURS	28 JOURS			
INFOS	7 JOURS	28 JOURS						
POINT CRITIQUE:	OBSERVATIONS:							
OBJET:	<p>PRÊT POUR LA RÉCEPTION LE 08/03/97 - RÉCEPTION FAITE LE 08/03/97 EN MATINÉE. Le bétonnage a eu lieu le lundi 06/03/97. Début 08h30mn. Problème de vibrateurs 4200. Béton normal avec un affaissement moyen de 9.0cm. Fin environ 16h00.</p>							
LEVE LE:								
CONTRÔLE EXTERNE	CONTRÔLE INTERNE							
OK ferrailage 06/03/97 [Signature]	[Signature]							
* CONFORMITE D'EXECUTION								
VISA CONTRÔLE EXTERNE	FOUGEROLLE C.S.E	MAÎTRE D'OEUVRE						
[Signature]	[Signature]							

GROUPEMENT FOUGEROLLE C.S.E

BARRAGE AL-BASSAM DE NIANDOUBA

FICHE D'EXECUTION No:

CHANTIER: Niandouba

No:

DEFINITION DE L'OUVRAGE: Evacuateur. Route Plot A		
PLAN D'EXECUTION:	COFFRAGE No: 205	INDICE: 0
	ACIER No:	INDICE:
POINT CRITIQUE EVENTUEL:	OUI:	NON:
OBJET:		
RECEPTION FERRAILLAGE:	DATE:	VISA CHEF DE PROJET
COFFRAGES:	ASPECT PAREMENT:	
	DEMOULANT:	
	INCORPORATION:	
	DATE:	VISA CHEF DE CHANTIER BON A BETONNER Aime Ju SABIA
BETONNAGE	TYPE DE BETON: Class 3 Beton propre	
	MOYENS BENNE:	MALAXEUR:
	Nbre VIBREURS:	
	SURFACAGE: REGLE:	TALOCHÉ:
	CURE:	
	DATE: 5.03.97	VISA CHEF DE CHANTIER A.J. SABIA
PRELEVEMENTS:	ENTREPRISE:	MAÎTRE D'OEUVRE Nbre:
	RESULTATS:	INFOS 7 JOURS 28 JOURS
POINT CRITIQUE:		OBSERVATIONS:
OBJET:		
LEVE LE:		
CONTRÔLE EXTERNE	CONTRÔLE INTERNE	
* CONFORMITE D'EXECUTION		
VISA CONTRÔLE EXTERNE	FOUGEROLLE C.S.E	MAÎTRE D'OEUVRE

GROUPEMENT FOUGEROLLE C.S.E

BARRAGE AL-BASSAM DE NIANDOUBA

FICHE D'EXECUTION No:

CHANTIER: Niandouba

No :

DEFINITION DE L'OUVRAGE: <u>Evacuateur (Biches plot A)</u>								
PLAN D'EXECUTION:	COFFRAGE No: <u>205</u>	INDICE: <u>0</u>						
	ACIER No: <u>206</u>	INDICE: <u>A</u>						
POINT CRITIQUE EVENTUEL:	OUI:	NON:						
OBJET:								
RECEPTION FERRAILLAGE:	DATE: <u>04.03.97</u>	VISA CHEF DE PROJET <i>[Signature]</i>						
COFFRAGES:	ASPECT PAREMENT: DEMOULANT: INCORPORATION:							
	DATE:	VISA CHEF DE CHANTIER BON A BETONNER <i>Aime Jn [Signature]</i>						
BETONNAGE	TYPE DE BETON <u>classe II - selon projet</u>							
	MOYENS BENNE:	MALAXEUR:						
	Nbre VIBREURS:							
	SURFACAGE: REGLE:	VALOCHÉ:						
	CURE:							
	DATE: <u>03.03.97</u>	VISA CHEF DE CHANTIER <u>A. J. SAGNA</u> <i>[Signature]</i>						
PRELEVEMENTS:	ENTREPRISE:	MAÎTRE D'OEUVRE Nbre:						
	RESULTATS:	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th>INFOS</th> <th>7 JOURS</th> <th>28 JOURS</th> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </table>	INFOS	7 JOURS	28 JOURS			
INFOS	7 JOURS	28 JOURS						
POINT CRITIQUE:	OBSERVATIONS:							
OBJET:								
LEVE LE:								
CONTRÔLE EXTERNE	CONTRÔLE INTERNE							
<i>OK Ferrailage 04/03/97</i> <i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>							
* CONFORMITE D'EXECUTION								
VISA CONTRÔLE EXTERNE	FOUGEROLLE C.S.E	MAÎTRE D'OEUVRE						
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>							

GROUPEMENT FOUGEROLLE C.S.E

BARRAGE AL-BASSAM DE NIANDOUBA

FICHE D'EXECUTION No :

CHANTIER: Niandouba

No :

DEFINITION DE L'OUVRAGE: <u>Plan de gauche - Plot 2. C Saisi 61</u>								
PLAN D'EXECUTION: <u>202</u>	COFFRAGE No: <u>202</u>	INDICE: <u>0</u>						
	ACIER No:	INDICE:						
POINT CRITIQUE EVENTUEL:	OUI:	NON:						
OBJET:								
RECEPTION FERRAILLAGE:	DATE:	VISA CHEF DE PROJET						
COFFRAGES :								
ASPECT PAREMENT:								
DEMOULANT:								
INCORPORATION:								
	DATE: <u>04.03.07</u> <u>11 heures</u>	VISA CHEF DE CHANTIER BON A BETONNER <u>A. S. SAGNA</u>						
BETONNAGE	TYPE DE BETON <u>classe 2</u>							
	MOYENS BENNE:	MALAXEUR:						
	Nbre VIBREURS: <u>2</u>							
	SURFACAGE: REGLE:	VALOCHTE:						
	CURE: <u>eau</u>							
	DATE: <u>04.03.07</u>	VISA CHEF DE CHANTIER <u>A. S. SAGNA</u>						
PRELEVEMENTS:	ENTREPRISE:	MAÎTRE D'OEUVRE Nbre: <u>12</u>						
	RESULTATS:	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th>INFOS</th> <th>7 JOURS</th> <th>28 JOURS</th> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </table>	INFOS	7 JOURS	28 JOURS			
INFOS	7 JOURS	28 JOURS						
POINT CRITIQUE:	OBSERVATIONS:							
OBJET:								
LEVE LE:								
CONTRÔLE EXTERNE	CONTRÔLE INTERNE							
	<u>J. Dules</u>							
* CONFORMITE D'EXECUTION								
VISA CONTRÔLE EXTERNE	FOUGEROLLE C.S.E	MAÎTRE D'OEUVRE						
<u>Stéphane Doye</u>	<u>J. Dules</u>							

GROUPEMENT FOUGEROLLE C.S.E

BARRAGE AL-BASSAM DE NIANDOUBA

FICHE D'EXECUTION No:

CHANTIER: *Niandouba*

No :

DEFINITION DE L'OUVRAGE: <i>Evacuation Beeha PloTA,</i>		
PLAN D'EXECUTION:	COTTRAGE No: <i>205</i>	INDICE: <i>0</i>
	ACIER No: <i>206</i>	INDICE: <i>A</i>
POINT CRITIQUE EVENTUEL:	OUI:	NON:
OBJET:		
RECEPTION FERRAILLAGE:	DATE:	VISA CHEF DE PROJET
DIFFRAGES:	ASPECT PAREMENT:	
	DEMOULANT:	
	INCORPORATION:	
	DATE: <i>04.03.97</i>	VISA CHEF DE CHANTIER BON A BETONNER <i>Aine Ja PASA</i>
BETONNAGE	TYPE DE BETON <i>class 1</i>	
	MOYENS BENNE:	MALAXEUR:
	Nbre VIBREURS: <i>2</i>	
	SURFACAGE: REGLE:	TALOCHÉ:
	CURE: <i>eau</i>	
	DATE: <i>04.03.97</i>	VISA CHEF DE CHANTIER <i>A.J. SAMA</i>
PRELEVEMENTS:	ENTREPRISE:	MAÎTRE D'OEUVRE Nbre:
	RESULTATS:	INFOS
		7 JOURS
		28 JOURS
POINT CRITIQUE:	OBSERVATIONS:	
OBJET:		
LEVE LE:		
CONTRÔLE EXTERNE	CONTRÔLE INTERNE	
	<i>[Signature]</i>	
* CONFORMITE D'EXECUTION		
VISA CONTRÔLE EXTERNE	FOUGEROLLE C.S.E	MAÎTRE D'OEUVRE
<i>Bertrand Boye</i>	<i>[Signature]</i>	

GROUPEMENT FOUGEROLLE C.S.E

BARRAGE AL-BASSAM DE NIANDOUBA

FICHE D'EXECUTION No:

CHANTIER: Niandouba

No :

DEFINITION DE L'OUVRAGE: <u>Curage de restauration (Plat 6) voir</u>								
PLAN D'EXECUTION: <u>213</u>	COTFRAGE No: <u>213</u>	INDICE: <u>0</u>						
	ACIER No: <u>220</u>	INDICE: <u>0</u>						
POINT CRITIQUE EVENTUEL:	OUI:	NON:						
OBJET:								
RECEPTION FERRAILLAGE:	DATE: <u>22.02.97</u>	VISA CHEF DE PROJET <u>[Signature]</u>						
COTFRAGES:	ASPECT PAREMENT:							
	DEMOULANT:							
	INCORPORATION:							
	DATE: <u>27.02.97</u> <u>15 Heures</u>	VISA CHEF DE CHANTIER BON A BETONNER <u>[Signature]</u>						
BETONNAGE	TYPE DE BETON <u>classe I</u>							
	MOYENS BENNE:	MALAXEUR:						
	Nbre VIBREURS: <u>2</u>							
	SURFACAGE: REGLE:	TALOCHÉ:						
	CURE: <u>eau</u>							
	DATE: <u>28.02.97</u>	VISA CHEF DE CHANTIER <u>[Signature]</u>						
PRELEVEMENTS:	ENTREPRISE:	MAÎTRE D'OEUVRE Nbre: <u>12</u>						
	RESULTATS: <u>2</u>							
		<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th>INFOS</th> <th>7 JOURS</th> <th>28 JOURS</th> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </table>	INFOS	7 JOURS	28 JOURS			
INFOS	7 JOURS	28 JOURS						
POINT CRITIQUE:	OBSERVATIONS: <u>Beton effectuée le 27/02/97 dans l'après-midi après la réception du coffrage.</u>							
OBJET:	<u>A. O'Hara</u>							
LEVE LE:	<u>la date de demande de bétonnage en conformité avec le planning hebdomadaire de son responsable travaux effectuée dans l'ingénieur</u>							
CONTRÔLE EXTERNE	CONTRÔLE INTERNE							
<u>OK ferraillage 22/02/97</u> <u>[Signature]</u>	<u>[Signature]</u>							
* CONFORMITE D'EXECUTION								
VISA CONTRÔLE EXTERNE	FOUGEROLLE C.S.E	MAÎTRE D'OEUVRE						
<u>[Signature]</u>	<u>[Signature]</u>							

DESIGNATION	LUNDI	MARDI	MERCREDI	JEUDI	VENDREDI	SAMEDI	DIMANCHE
<u>* MUR DE GAUCHE</u>							
Coffrage pour levée Plot 2 levée 6							
Béton Plot 2 levée 6							
Béton levée Plot 2 levée 4							
Béton Plot 2 + 1/2 levée 5							
* EVACUATEUR							
Béton de Blocage. Cote Mur Gauche							
Ferrailage Plot							
Coffrage Plot H							
Béton Plot H							
Béton de proprete Béche Plot							
Coffrage division Plot E							
Béton division Plot E							
<u>* OUVRAGE DE RESTITUTION</u>							
Béton de propreté Plot							
Ferrailage Radier Plot 5							
Coffrage Radier Plot 5							
Béton Radier Plot							
Ferrailage voiles Plot							
Coffrage Voiles Plot 4							
Béton Voiles Plot 4							
Coffrage pour dalle de couverture Plot 4							
Béton dalle de couverture Plot							

Directeur des Travaux
J. C. MORLET

Chef de Chantier
Alain S.M.

GROUPEMENT FOUGEROLLE C.S.E

BARRAGE AL-BASSAM DE NIANDOUBA

FICHE D'EXECUTION No :

CHANTIER: Niandouba

No :

Tête du

DEFINITION DE L'OUVRAGE: <u>Durçon Plot E. Ferraillage.</u>								
PLAN D'EXECUTION:	COFFRAGE No: <u>205</u>	INDICE: <u>0</u>						
	ACIER No: <u>206</u>	INDICE: <u>A</u>						
POINT CRITIQUE EVENTUEL:	OUI:	NON:						
OBJET:								
RECEPTION FERRAILLAGE:	DATE: <u>24.02.97</u>	VISA CHEF DE PROJET <u>[Signature]</u>						
COFFRAGES:	ASPECT PAREMENT: DEMOULANT: INCORPORATION:							
	DATE: <u>27.02.97</u> <u>15 Heures</u>	VISA CHEF DE CHANTIER BON A BETONNER <u>[Signature]</u>						
BETONNAGE	TYPE DE BETON <u>class 1</u> MOYENS BENNE: Nbre VIBREURS: <u>2</u> SURFACAGE: <u>REGLE:</u> CURE: <u>eau</u>	MALAXEUR: VALOCHÉ:						
	DATE: <u>27.02.97</u>	VISA CHEF DE CHANTIER <u>[Signature]</u>						
PRELEVEMENTS:	ENTREPRISE:	MAÎTRE D'OEUVRE Nbre: <u>12</u>						
	RESULTATS:	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>INFOS</th> <th>7 JOURS</th> <th>28 JOURS</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table>	INFOS	7 JOURS	28 JOURS			
INFOS	7 JOURS	28 JOURS						
POINT CRITIQUE:	OBSERVATIONS: <u>Bétonnage effectué le 01/03/97. Poches d'air non remplies de béton constatées après décoffrage sur la tête du durçon. Celles-ci ont été traitées au lance-à-vapeur (ont été fermées) pour éviter les effets de grande vitesse de l'eau. N. Gage</u>							
OBJET:								
LEVE LE:								
CONTRÔLE EXTERNE	CONTRÔLE INTERNE							
<u>N. Gage</u>	<u>[Signature]</u>							
* CONFORMITE D'EXECUTION								
VISA CONTRÔLE EXTERNE	FOUGEROLLE C.S.E	MAÎTRE D'OEUVRE						
<u>[Signature]</u>	<u>[Signature]</u>							

GROUPEMENT FOUGEROLLE C.S.E

BARRAGE AL-BASSAM DE NIANDOUBA

FICHE D'EXECUTION No:

CHANTIER: *Niandouba.*

No :

DEFINITION DE L'OUVRAGE: <i>Ferrailleur - Rodeu Plot 11</i>								
PLAN D'EXECUTION:	COTTRAGE No: <i>205</i>	INDICE: <i>0</i>						
	ACIER No: <i>206</i>	INDICE: <i>A</i>						
POINT CRITIQUE EVENTUEL:	OUI:	NON:						
OBJET:								
RECEPTION FERRAILLAGE:	DATE: <i>24.02.97</i>	VISA CHEF DE PROJET <i>J. Doulu</i>						
COTTRAGES:	ASPECT PAREMENT:							
	DEMOULANT:							
	INCORPORATION:							
	DATE: <i>24.02.97</i>	VISA CHEF DE CHANTIER BON A BETONNER <i>Aime Sagna</i>						
	<i>17 Heures</i>							
BETONNAGE	TYPE DE BETON							
	MOYENS BENNE:	MALAXEUR:						
	Nbre VIBREURS:							
	SURFACAGE: REGLE:	TALOCHÉ:						
	CURE:							
	DATE: <i>25.02.97</i>	VISA CHEF DE CHANTIER <i>Aime Sagna</i>						
PRELEVEMENTS:	ENTREPRISE:	MAÎTRE D'OEUVRE Nbre: <i>12</i>						
	RESULTATS:	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>INFOS</td> <td>7 JOURS</td> <td>28 JOURS</td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </table>	INFOS	7 JOURS	28 JOURS			
INFOS	7 JOURS	28 JOURS						
POINT CRITIQUE:	OBSERVATIONS:							
OBJET:								
LEVE LE:								
CONTRÔLE EXTERNE	CONTRÔLE INTERNE							
<i>OK Ferrailleur 24/02/97</i> <i>B. Tra / Sagna</i>	<i>J. Doulu</i>							
* CONFORMITE D'EXECUTION								
VISA CONTRÔLE EXTERNE	FOUGEROLLE C.S.E	MAÎTRE D'OEUVRE						
<i>B. Tra / Sagna</i>	<i>J. Doulu</i>							

GROUPEMENT FOUGEROLLE C.S.E

BARRAGE AL-BASSAM DE NIANDOUBA

FICHE D'EXECUTION No :

CHANTIER: *Niandouba*

No :

DEFINITION DE L'OUVRAGE: <i>Evacuateur sur gauche lui s. plot 2</i>								
PLAN D'EXECUTION:	COFFRAGE No: <i>202</i>	INDICE: <i>0</i>						
	ACIER No: <i></i>	INDICE: <i></i>						
POINT CRITIQUE EVENTUEL:	OUI: <i></i>	NON: <i></i>						
OBJET: <i></i>								
RECEPTION FERRAILLAGE:	DATE: <i></i>	VISA CHEF DE PROJET						
COFFRAGES :								
ASPECT PAREMENT: <i></i>								
DEMOULANT: <i></i>								
INCORPORATION: <i></i>								
	DATE: <i>24.02.96.</i>	VISA CHEF DE CHANTIER BON A BETONNER <i>Ame Sougné</i>						
BETONNAGE								
TYPE DE BETON <i>classé 2</i>								
MOYENS BENNE: <i></i>								
Nbre VIBREURS: <i>2</i>								
SURFACAGE: <i></i> REGLE: <i></i>								
CURE: <i>eau</i>								
	DATE: <i>24.02.96</i>	VISA CHEF DE CHANTIER <i>Ame Sougné</i>						
PRELEVEMENTS:	ENTREPRISE: <i></i>	MAÎTRE D'OEUVRE Nbre: <i></i>						
	RESULTATS:	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>INFOS</th> <th>7 JOURS</th> <th>28 JOURS</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table>	INFOS	7 JOURS	28 JOURS			
INFOS	7 JOURS	28 JOURS						
POINT CRITIQUE:		OBSERVATIONS:						
OBJET:								
LEVE LE:								
CONTRÔLE EXTERNE	CONTRÔLE INTERNE							
<i>Ame Sougné</i>								
* CONFORMITE D'EXECUTION								
VISA CONTRÔLE EXTERNE	FOUGEROLLE C.S.E	MAÎTRE D'OEUVRE						
<i>Beta/Bap</i>	<i>Ame Sougné</i>							

GROUPEMENT FOUGEROLLE C.S.E

BARRAGE AL-BASSAM DE NIANDOUBA

FICHE D'EXECUTION No :

CANTIER: *Niandouba*

No :

DEFINITION DE L'OUVRAGE: <i>Fougerolle - Au gauche</i>		
PLAN D'EXECUTION:	COTTRAGE No: <i>202</i>	INDICE: <i>0</i>
	ACIER No:	INDICE:
POINT CRITIQUE EVENTUEL:	OUI: <input checked="" type="checkbox"/>	NON: <input type="checkbox"/>
OBJET:		
RECEPTION FERRAILLAGE:	DATE:	VISA CHEF DE PROJET
COTTRAGES :		
ASPECT PAREMENT:		
DEMOULANT:		
INCORPORATION:		
	DATE: <i>19.02.97</i> <i>(11 heures)</i>	VISA CHEF DE CANTIER BON A BETONNER <i>A. M. S. G. [Signature]</i>
BETONNAGE	TYPE DE BETON <i>Classe 2</i>	
	MOYENS <i>BENNE:</i>	MALAXEUR:
	Nbre VIBREURS: <i>2</i>	
	SURFACAGE: <i>REGLE:</i>	VALOIRE:
	CURE: <i>eau</i>	
	DATE: <i>19.02.97</i>	VISA CHEF DE CANTIER <i>A. M. S. G. [Signature]</i>
PRELEVEMENTS:	ENTREPRISE:	MAÎTRE D'OEUVRE
		Nbre:
	RESULTATS:	
		INFOS
		7 JOURS
		28 JOURS
POINT CRITIQUE:	OBSERVATIONS:	
OBJET:		
LEVE LE:		
CONTRÔLE EXTERNE	CONTRÔLE INTERNE	
	<i>[Signature]</i>	
* CONFORMITE D'EXECUTION		
VISA CONTRÔLE EXTERNE	FOUGEROLLE C.S.E	MAÎTRE D'OEUVRE
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	

GROUPEMENT FOUGEROLLE C.S.E

BARRAGE AL-BASSAM DE NIANDOUBA

FICHE D'EXECUTION No :

CHANTIER: *Niandouba*

No :

DEFINITION DE L'OUVRAGE: <i>Ecran-taille (Béton martelet P20FH)</i>								
PLAN D'EXECUTION:	COFFRAGE No: <i>205</i>	INDICE: <i>0</i>						
	ACIER No:	INDICE:						
POINT CRITIQUE EVENTUEL:	OUI:	NON:						
OBJET:								
RECEPTION FERRAILLAGE:	DATE:	VISA CHEF DE PROJET						
COFFRAGES :								
ASPECT PAREMENT:								
DEMOULANT:								
INCORPORATION:								
	DATE: <i>19-02-97</i>	VISA CHEF DE CHANTIER BON A BETONNER <i>Aime Sogno</i>						
BETONNAGE	TYPE DE BETON <i>classé</i>							
	MOYENS <u>BENNE</u> :	MALAXEUR:						
	Nbre VIBREURS:							
	SURFACAGE: <u>REGLE</u> :	TALOCHE:						
	CURE:							
	DATE: <i>19.02.97</i>	VISA CHEF DE CHANTIER <i>Aime Sogno</i>						
PRELEVEMENTS:	ENTREPRISE:	MAÎTRE D'OEUVRE Nbre:						
	RESULTATS:	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th>INFOS</th> <th>7 JOURS</th> <th>28 JOURS</th> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </table>	INFOS	7 JOURS	28 JOURS			
INFOS	7 JOURS	28 JOURS						
POINT CRITIQUE:	OBSERVATIONS:							
OBJET:								
LEVE LE:								
CONTRÔLE EXTERNE	CONTRÔLE INTERNE							
	<i>[Signature]</i>							
* CONFORMITE D'EXECUTION								
VISA CONTRÔLE EXTERNE	FOUGEROLLE C.S.E	MAÎTRE D'OEUVRE						
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>							

GROUPEMENT FOUGEROLLE C.S.E

BARRAGE AL-BASSAM DE NIANDOUBA

FICHE D'EXECUTION No :

CHANTIER: *Niandouba*

No :

DEFINITION DE L'OUVRAGE: <i>Bureau de ventilation - Au Nord : côté gauche</i>								
PLAN D'EXECUTION: <i>Collyre</i>	COFFRAGE No: <i>212</i>	INDICE: <i>D</i>						
	ACIER No: "	INDICE:						
POINT CRITIQUE EVENTUEL:	OUI:	NON:						
OBJET:								
RECEPTION FERRAILLAGE:	DATE:	VISA CHEF DE PROJET						
COFFRAGES :								
ASPECT PAREMENT:								
DEMOULANT:								
INCORPORATION:								
	DATE: <i>24.02.97</i>	VISA CHEF DE CHANTIER BON A BETONNER <i>Ame Sagna</i>						
BETONNAGE								
TYPE DE BETON <i>classé I</i>								
MOYENS <u>BENNE</u> :								
Nbre VIBREURS:								
SURFACAGE: <u>REGLE</u> :								
CURE: <i>eau</i>								
	DATE: <i>24.2.97</i>	VISA CHEF DE CHANTIER <i>Ame Sagna</i>						
PRELEVEMENTS:	ENTREPRISE:	MAÎTRE D'OEUVRE Nbre:						
	RESULTATS:	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th>INFOS</th> <th>7 JOURS</th> <th>28 JOURS</th> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </table>	INFOS	7 JOURS	28 JOURS			
INFOS	7 JOURS	28 JOURS						
POINT CRITIQUE:	OBSERVATIONS:							
OBJET:								
LEVE LE:								
CONTRÔLE EXTERNE	CONTRÔLE INTERNE							
<i>OK reprise 18/02/97</i>	<i>[Signature]</i>							
# CONFORMITE D'EXECUTION								
VISA CONTRÔLE EXTERNE	FOUGEROLLE C.S.E	MAÎTRE D'OEUVRE						
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>							

GROUPEMENT FOUGEROLLE C.S.E

BARRAGE AL-BASSAM DE NIANDOUBA

FICHE D'EXECUTION No :

CHANTIER: Niandouba

No :

DEFINITION DE L'OUVRAGE: <u>Evacuation (Baches plus H)</u>								
PLAN D'EXECUTION:	COFFRAGE No: <u>205</u>	INDICE: <u>0</u>						
	ACIER No: <u>206</u>	INDICE: <u>A</u>						
POINT CRITIQUE EVENTUEL:	OUI:	NON:						
OBJET:								
RECEPTION FERRAILLAGE:	DATE: <u>17.02.97</u>	VISA CHEF DE PROJET <u>[Signature]</u>						
COFFRAGES:	ASPECT PAREMENT: DEMOULANT: INCORPORATION:							
	DATE: <u>17.02.97</u>	VISA CHEF DE CHANTIER BON A BETONNER <u>Ame Sogno</u>						
BETONNAGE	TYPE DE BETON: <u>classe 3</u>							
	MOYENS BENNE:	MALAXEUR:						
	Nbre VIBREURS:	TALOCHÉ:						
	SURFACAGE: REGLE:							
	CURE:							
	DATE: <u>18.02.97</u>	VISA CHEF DE CHANTIER <u>Ame Sogno</u>						
PRELEVEMENTS:	ENTREPRISE:	MAÎTRE D'OEUVRE Nbre: <u>12</u>						
	RESULTATS:	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>INFOS</td> <td>7 JOURS</td> <td>28 JOURS</td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </table>	INFOS	7 JOURS	28 JOURS			
INFOS	7 JOURS	28 JOURS						
POINT CRITIQUE:	OBSERVATIONS:							
OBJET:								
LEVE LE:								
CONTRÔLE EXTERNE	CONTRÔLE INTERNE							
<u>[Signature]</u> <u>18/02/97</u>	<u>[Signature]</u>							
* CONFORMITE D'EXECUTION								
VISA CONTRÔLE EXTERNE	FOUGEROLLE C.S.E	MAÎTRE D'OEUVRE						
<u>[Signature]</u>	<u>[Signature]</u>							

GROUPEMENT FOUGEROLLE C. S. E

BARRAGE AL-BASSAM DE NIANDOUBA

FICHE D'EXECUTION No :

CHANTIER: *Kiandauba*

No : *Voies des 17e G. cote Mont*

DEFINITION DE L'OUVRAGE: <i>Couloir de Restriction - Plot 1 (A.02)</i>								
PLAN D'EXECUTION:	COFFRAGE No: <i>212</i>	INDICE: <i>0</i>						
	ACIER No: <i>217</i>	INDICE: <i>0</i>						
POINT CRITIQUE EVENTUEL:	OUI:	NON:						
OBJET:								
RECEPTION FERRAILLAGE:	DATE: <i>18-02-97</i>	VISA CHEF DE PROJET <i>J. Thaler</i>						
COFFRAGES:	ASPECT PAREMENT: DEMOULANT: INCORPORATION:							
	DATE: <i>19-02-97</i> <i>(1/2. Levee cote Evacuation)</i>	VISA CHEF DE CHANTIER BON A BETONNER <i>J. Thaler</i>						
BETONNAGE	TYPE DE BETON <i>classe 4</i> MOYENS BENNE: Nbre VIBREURS: <i>2</i> SURFACAGE: REGLE: CURE: <i>eau</i>	MALAXEUR: VALOCHÉ:						
	DATE: <i>20-02-97</i>	VISA CHEF DE CHANTIER <i>Aime Sogno</i>						
PRELEVEMENTS:	ENTREPRISE:	MAÎTRE D'OEUVRE Nbre: <i>12</i>						
	RESULTATS:	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th>INFOS</th> <th>7 JOURS</th> <th>28 JOURS</th> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </table>	INFOS	7 JOURS	28 JOURS			
INFOS	7 JOURS	28 JOURS						
POINT CRITIQUE:	OBSERVATIONS:							
OBJET:								
LEVEE LE:								
CONTRÔLE EXTERNE	CONTRÔLE INTERNE							
<i>18/02/97</i> <i>OK ferrailage</i>	<i>J. Thaler</i>							
* CONFORMITE D'EXECUTION								
VISA CONTRÔLE EXTERNE	FOUGEROLLE C. S. E	MAÎTRE D'OEUVRE						
<i>B. Paul B. P.</i>	<i>J. Thaler</i>							

GROUPEMENT FOUGEROLLE C.S.E

BARRAGE AL-BASSAM DE NIANDOUBA

FICHE D'EXECUTION No :

CHANTIER: Niandouba

No :

DEFINITION DE L'OUVRAGE: <i>Ferrailleur - Sur gauche (Plat 1 = béton)</i>								
PLAN D'EXECUTION:	COFFRAGE No: <i>202</i>	INDICE: <i>0</i>						
	ACIER No: <i></i>	INDICE: <i></i>						
POINT CRITIQUE EVENTUEL:	OUI: <input checked="" type="checkbox"/>	NON: <input type="checkbox"/>						
OBJET:								
RECEPTION FERRAILLAGE:	DATE:	VISA CHEF DE PROJET						
COFFRAGES:	ASPECT PAREMENT:							
	DEMOULANT:							
	INCORPORATION:							
	DATE: <i>19.02.97</i> <i>(11 heures)</i>	VISA CHEF DE CHANTIER BON A BETONNER <i>Ami Sogno</i>						
BETONNAGE	TYPE DE BETON <i>classe 2</i>							
	MOYENS BENNE:	MALAXEUR:						
	Nbre VIBREURS: <i>2</i>							
	SURFACAGE: REGLE:	TALOCHÉ:						
	CURE: <i>eau</i>							
	DATE: <i>19.02.97</i>	VISA CHEF DE CHANTIER <i>Ami Sogno</i>						
PRELEVEMENTS:	ENTREPRISE:	MAÎTRE D'OEUVRE						
		Nbre:						
	RESULTATS:	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th>INFOS</th> <th>7 JOURS</th> <th>28 JOURS</th> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </table>	INFOS	7 JOURS	28 JOURS			
INFOS	7 JOURS	28 JOURS						
POINT CRITIQUE:	OBSERVATIONS:							
OBJET:								
LEVE LE:								
CONTRÔLE EXTERNE	CONTRÔLE INTERNE							
	<i>Thelou</i>							
* CONFORMITE D'EXECUTION								
VISA CONTRÔLE EXTERNE	FOUGEROLLE C.S.E	MAÎTRE D'OEUVRE						
<i>Bernard Baye</i>	<i>Thelou</i>							

GROUPEMENT FOUGEROLLE C.S.E

BARRAGE AL-BASSAM DE NIANDOUBA

FICHE D'EXECUTION No :

CHANTIER :

No :

DEFINITION DE L'OUVRAGE: Mur de gauche du déversoir (2^{ème} levée plots)											
PLAN D'EXECUTION:	COFFRAGE No: 205 INDICE: 0 ACIER No: 206 INDICE: A										
POINT CRITIQUE EVENTUEL:	OUI: NON:										
OBJET:											
RECEPTION FERRAILLAGE:	DATE: 12-02-97 VISA CHEF DE PROJET 										
COFFRAGES:	ASPECT PAREMENT: DEMOULANT: INCORPORATION: DATE: 15-02-97 VISA CHEF DE CHANTIER BON A BETONNER Aime SAGNA										
BETONNAGE	TYPE DE BETON classe 2 MOYENS BENNE : MALAXEUR: Nbre VIBREURS: 2 SURFACAGE: REGLE : TALOCHÉ: CURE: eau DATE: 16/02/1997 VISA CHEF DE CHANTIER Aime SAGNA										
PRELEVEMENTS:	ENTREPRISE: MAÎTRE D'OEUVRE Nbre:										
RESULTATS:	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 50%;">INFOS</th> <th style="width: 25%;">7 JOURS</th> <th style="width: 25%;">28 JOURS</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="height: 20px;"></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	INFOS	7 JOURS	28 JOURS							
INFOS	7 JOURS	28 JOURS									
POINT CRITIQUE:	OBSERVATIONS:										
OBJET:											
LEVE LE:											
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;">CONTRÔLE EXTERNE</td> <td style="width: 50%;">CONTRÔLE INTERNE</td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">De Jal Boye 16/02/97 ok Ferrailage</td> <td style="padding: 5px;"></td> </tr> </table>	CONTRÔLE EXTERNE	CONTRÔLE INTERNE	De Jal Boye 16/02/97 ok Ferrailage		<p style="text-align: center;">* CONFORMITE D'EXECUTION</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 33%;">VISA CONTRÔLE EXTERNE</td> <td style="width: 33%;">FOUGEROLLE C.S.E</td> <td style="width: 33%;">MAÎTRE D'OEUVRE</td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;"></td> <td style="padding: 5px;"></td> <td style="padding: 5px;"></td> </tr> </table>	VISA CONTRÔLE EXTERNE	FOUGEROLLE C.S.E	MAÎTRE D'OEUVRE			
CONTRÔLE EXTERNE	CONTRÔLE INTERNE										
De Jal Boye 16/02/97 ok Ferrailage											
VISA CONTRÔLE EXTERNE	FOUGEROLLE C.S.E	MAÎTRE D'OEUVRE									

GROUPEMENT FOUGEROLLE C.S.E

BARRAGE AL-BASSAM DE NIANDOUBA

FICHE D'EXECUTION No :

CHANTIER: *Niandouba.*

No :

DEFINITION DE L'OUVRAGE: <i>Plan épave de mur en C1^e sur plot 3</i>								
PLAN D'EXECUTION:	COFFRAGE No: <i>205</i>	INDICE: <i>0</i>						
	ACIER No: <i>206</i>	INDICE: <i>0</i>						
POINT CRITIQUE EVENTUEL:	OUI:	NON:						
OBJET:								
RECEPTION FERRAILLAGE:	DATE: <i>12.02.97</i>	VISA CHEF DE PROJET <i>[Signature]</i>						
COFFRAGES:	ASPECT PAREMENT: DEMOULANT: INCORPORATION:							
	DATE: <i>15.02.97</i> <i>Notin</i>	VISA CHEF DE CHANTIER BON A BETONNER <i>Aime Soigne</i>						
BETONNAGE	TYPE DE BETON <i>classe 2</i> MOYENS BENNE: Nbre VIBREURS: <i>2</i> SURFACAGE: REGLE: CURE: <i>eau</i>	MALAXEUR: VALOCHÉ:						
	DATE: <i>15.02.97</i>	VISA CHEF DE CHANTIER <i>Aime Soigne</i>						
PRELEVEMENTS:	ENTREPRISE:	MAÎTRE D'OEUVRE Nbre:						
	RESULTATS:	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th>INFOS</th> <th>7 JOURS</th> <th>28 JOURS</th> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </table>	INFOS	7 JOURS	28 JOURS			
INFOS	7 JOURS	28 JOURS						
POINT CRITIQUE:	OBSERVATIONS:							
OBJET:								
LEVE LE:								
CONTRÔLE EXTERNE	CONTRÔLE INTERNE							
	<i>[Signature]</i>							
CONFORMITE D'EXECUTION								
VISA CONTRÔLE EXTERNE	FOUGEROLLE C.S.E	MAÎTRE D'OEUVRE						
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>							

GROUPEMENT FOUGEROLLE C.S.E

BARRAGE AL-BASSAM DE NIANDOUBA

FICHE D'EXECUTION No :

CHANTIER: Niandouba

No :

DEFINITION DE L'OUVRAGE: <u>Rada Dersou plat B</u>								
PLAN D'EXECUTION:	COFFRAGE No: <u>205</u>	INDICE: <u>0</u>						
	ACIER No: <u>206</u>	INDICE: <u>A</u>						
POINT CRITIQUE EVENTUEL:	OUI:	NON:						
OBJET:								
RECEPTION FERRAILLAGE:	DATE: <u>12.02.97</u>	VISA CHEF DE PROJET <u>[Signature]</u>						
COFFRAGES:	ASPECT PAREMENT: DEMOULANT: INCORPORATION:							
	DATE: <u>14.02.97</u> <u>Adou Aho. mudi</u>	VISA CHEF DE CHANTIER BON A BETONNER <u>Amu Soqna</u>						
BETONNAGE	TYPE DE BETON <u>classé</u> MOYENS BENNE: Nbre VIBREURS: <u>2</u> SURFACAGE: REGLE: CURE: <u>eau</u>	MALAXEUR: VALOCHÉ:						
	DATE: <u>15.02.97</u>	VISA CHEF DE CHANTIER <u>Amu Soqna</u>						
PRELEVEMENTS:	ENTREPRISE:	MAÎTRE D'OEUVRE Nbre: <u>12</u>						
	RESULTATS:	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>INFOS</td> <td>7 JOURS</td> <td>28 JOURS</td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </table>	INFOS	7 JOURS	28 JOURS			
INFOS	7 JOURS	28 JOURS						
POINT CRITIQUE:	OBSERVATIONS:							
OBJET:								
LEVE LE:								
CONTRÔLE EXTERNE	CONTRÔLE INTERNE							
<u>OK ferrailage 12/02/97</u> <u>[Signature]</u>	<u>[Signature]</u>							
# CONFORMITE D'EXECUTION								
VISA CONTRÔLE EXTERNE	FOUGEROLLE C.S.E	MAÎTRE D'OEUVRE						
<u>[Signature]</u>	<u>[Signature]</u>							

GROUPEMENT FOUGEROLLE C.S.E

BARRAGE AL-BASSAM DE NIANDOUBA

FICHE D'EXECUTION No :

CHANTIER: *Niandouba*

No :

DEFINITION DE L'OUVRAGE: <i>Couloir de Retention (Dalle Pleine)</i>		COFFRAGE No: <i>212</i>		INDICE: <i>A</i>
PLAN D'EXECUTION:		ACIER No: <i>218</i>	INDICE: <i>B</i>	
POINT CRITIQUE EVENTUEL:		OUI:	NON:	
OBJET:				
RECEPTION FERRAILLAGE:	DATE: <i>11.02.97</i>	VISA CHEF DE PROJET <i>[Signature]</i>		
COFFRAGES:		ASPECT PAREMENT:		
		DEMOULANT:		
		INCORPORATION:		
		DATE: <i>11.02.97</i>	VISA CHEF DE CHANTIER BON A BETONNER <i>A une soigne</i>	
BETONNAGE	TYPE DE BETON: <i>classe</i>		MALAXEUR:	
	MOYENS	BENNE:		
	Nbre VIBREURS: <i>2</i>		VALOCHES:	
	SURFACAGE:	REGLE:		
	CURE: <i>eau</i>			
	DATE: <i>11.02.97</i>	VISA CHEF DE CHANTIER <i>A une soigne</i>		
RELEVEMENTS:	ENTREPRISE:	MAÎTRE D'OEUVRE	Nbre: <i>12</i>	
RESULTATS:		INFOS	7 JOURS	28 JOURS
POINT CRITIQUE:		OBSERVATIONS:		
OBJET:				
LEVE LE:				
CONTRÔLE EXTERNE	CONTRÔLE INTERNE			
<i>OK ferrailage 11/02/97</i> <i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>			
# CONFORMITE D'EXECUTION				
VISA CONTRÔLE EXTERNE	FOUGEROLLE C.S.E	MAÎTRE D'OEUVRE		
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>			






GROUPEMENT FOUGEROLLE C.S.E

BARRAGE AL-BASSAM DE NIANDOUBA

FICHE D'EXECUTION No :

CHANTIER: Niandouba côté Droit

No :

DEFINITION DE L'OUVRAGE: Ploz A vol? (Radier ouvrage de redistribution)							
PLAN D'EXECUTION:	COTTRAGE No: 212 INDICE: D ACIER No: 217 INDICE: 0						
POINT CRITIQUE EVENTUEL:	OUI: NON:						
OBJET:							
RECEPTION FERRAILLAGE:	DATE: 12.02.97 VISA CHEF DE PROJET 						
DIFFRAGES:	ASPECT PAREMENT: DEMOULANT: INCORPORATION: DATE: 14.02.97 VISA CHEF DE CHANTIER BON A BETONNER Ami Sogno						
BETONNAGE	TYPE DE BETON: sans S MOYENS BENNE: MALAXEUR: Nbre VIBREURS: 2 SURFACAGE: REGLE: VALOCHÉ: CURE: eau DATE: 14.02.97 VISA CHEF DE CHANTIER Ami Sogno						
PRELEVEMENTS:	ENTREPRISE: MAÎTRE D'OEUVRE Nbre: 2						
RESULTATS:	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>INFOS</th> <th>7 JOURS</th> <th>28 JOURS</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table>	INFOS	7 JOURS	28 JOURS			
INFOS	7 JOURS	28 JOURS					
POINT CRITIQUE:	OBSERVATIONS:						
OBJET:							
LEVE LE:							
CONTRÔLE EXTERNE BR ferrillage 13/02/97 	CONTRÔLE INTERNE 						
* CONFORMITE D'EXECUTION							
VISA CONTRÔLE EXTERNE	FOUGEROLLE C.S.E	MAÎTRE D'OEUVRE					
							




GROUPEMENT FOUGEROLLE C.S.E

BARRAGE AL-BASSAM DE NIANDOUBA

FICHE D'EXECUTION No :

CHANTIER :

No :

DEFINITION DE L'OUVRAGE: <i>Mur de gauche Plot n°3</i>								
PLAN D'EXECUTION :	COFFRAGE No :	INDICE :						
	ACIER No : <i>204/0</i>	INDICE :						
POINT CRITIQUE EVENTUEL :	OUI :	NON :						
OBJET :								
RECEPTION FERRAILLAGE :	DATE : <i>04/02/1997</i>	VISA CHEF DE PROJET 						
COFFRAGES :	ASPECT PAREMENT :							
	DEMOULANT :							
	INCORPORATION :							
	DATE :	VISA CHEF DE CHANTIER BON A BETONNER						
BETONNAGE	TYPE DE BETON							
	MOYENS BENNE :	MALAXEUR :						
	Nbre VIBREURS :							
	SURFACAGE :	REGLE :						
	CURE :	TALOCHÉ :						
	DATE :	VISA CHEF DE CHANTIER						
PRELEVEMENTS :	ENTREPRISE :	MAÎTRE D'OEUVRE						
		Nbre :						
	RESULTATS :	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>INFOS</td> <td>7 JOURS</td> <td>28 JOURS</td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </table>	INFOS	7 JOURS	28 JOURS			
INFOS	7 JOURS	28 JOURS						
POINT CRITIQUE :	OBSERVATIONS :							
OBJET :								
LEVE LE :								
CONTRÔLE EXTERNE	CONTRÔLE INTERNE							
<i>OK ferraillage 04/02/97</i>								
CONFORMITE D'EXECUTION								
VISA CONTRÔLE EXTERNE	FOUGEROLLE C.S.E	MAÎTRE D'OEUVRE						
								

GROUPEMENT FOUGEROLLE C.S.E

BARRAGE AL-BASSAM DE NIANDOUBA

FICHE D'EXECUTION No :

CHANTIER: *Niandouba*

No :

DEFINITION DE L'OUVRAGE: <i>Curage de l'ur. N. N. P. de l'ur. A. C. S. E.</i>		
PLAN D'EXECUTION:	COFFRAGE No: <i>212</i>	INDICE: <i>C</i>
	ACIER No:	INDICE:
POINT CRITIQUE EVENTUEL:	OUI:	NON:
OBJET:		
RECEPTION FERRAILLAGE:	DATE:	VISA CHEF DE PROJET

COFFRAGES :	ASPECT PAREMENT:	
	DEMOULANT:	
	INCORPORATION:	
	DATE: <i>3.02.91</i>	VISA CHEF DE CHANTIER BON A BETONNER <i>A. Sougné</i>

BETONNAGE	TYPE DE BETON <i>Classe 3 selon norme</i>	
	MOYENS <u>BENNE</u> :	MALAXEUR:
	Nbre VIBREURS:	
	SURFACAGE: <u>REGLE</u> :	TALOCHÉ:
	CURE:	
	DATE: <i>3.02.91</i>	VISA CHEF DE CHANTIER <i>A. Sougné</i>

PRELEVEMENTS :	ENTREPRISE :	MAÎTRE D'OEUVRE	Nbre :
	RESULTATS :	INFOS	7 JOURS
			28 JOURS

POINT CRITIQUE:	OBSERVATIONS :			
OBJET:				
LEVE LE:				
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>CONTRÔLE EXTERNE</td> <td>CONTRÔLE INTERNE</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;"><i>[Signature]</i></td> </tr> </table>		CONTRÔLE EXTERNE	CONTRÔLE INTERNE	
CONTRÔLE EXTERNE	CONTRÔLE INTERNE			
	<i>[Signature]</i>			

CONFORMITE D'EXECUTION		
VISA CONTRÔLE EXTERNE	FOUGEROLLE C.S.E	MAÎTRE D'OEUVRE
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	

GROUPEMENT FOUGEROLLE C.S.E

BARRAGE AL-BASSAM DE NIANDOUBA

FICHE D'EXECUTION No :

CHANTIER: *Nianglaaba* No : *PLOT "B"*
DALLE DE PROPRETE

DEFINITION DE L'OUVRAGE: Rocher de seuil Plot B								
PLAN D'EXECUTION:	COFFRAGE No: <i>206</i>	INDICE: <i>0</i>						
	ACIER No:	INDICE:						
POINT CRITIQUE EVENTUEL:	OUI:	NON:						
OBJET:								
RECEPTION FERRAILLAGE:	DATE:	VISA CHEF DE PROJET						
COFFRAGES : ASPECT PAREMENT: DEMOULANT: INCORPORATION: DATE: <i>3.02.97</i>								
		VISA CHEF DE CHANTIER BON A BETONNER <i>Ame Souma</i>						
BETONNAGE	TYPE DE BETON <i>classe Beton propreté</i>							
	MOYENS BENNE:	MALAXEUR:						
	Nbre VIBREURS:							
	SURFACAGE: REGLE:	TALOCHÉ:						
	CURE:							
	DATE: <i>3.02.97</i>	VISA CHEF DE CHANTIER <i>Ame Souma</i>						
PRELEVEMENTS:	ENTREPRISE:	MAÎTRE D'OEUVRE Nbre:						
	RESULTATS:	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th>INFOS</th> <th>7 JOURS</th> <th>28 JOURS</th> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </table>	INFOS	7 JOURS	28 JOURS			
INFOS	7 JOURS	28 JOURS						
POINT CRITIQUE:	OBSERVATIONS:							
OBJET:								
LEVÉE LE:								
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>CONTRÔLE EXTERNE</td> <td>CONTRÔLE INTERNE</td> </tr> <tr> <td> </td> <td><i>[Signature]</i></td> </tr> </table>			CONTRÔLE EXTERNE	CONTRÔLE INTERNE		<i>[Signature]</i>		
CONTRÔLE EXTERNE	CONTRÔLE INTERNE							
	<i>[Signature]</i>							
* CONFORMITE D'EXECUTION								
VISA CONTRÔLE EXTERNE	FOUGEROLLE C.S.E	MAÎTRE D'OEUVRE						
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>							

GROUPEMENT FOUGEROLLE C.S.E

BARRAGE AL-BASSAM DE NIANDOUBA

FICHE D'EXECUTION No:

CHANTIER: *Beaucoup de Restauration Niandouba*

DEFINITION DE L'OUVRAGE: <i>Plan 2. Voie beaucoup de Restauration</i>		
PLAN D'EXECUTION:	COFFRAGE No: <i>212</i>	INDICE: <i>15</i>
	ACIER No: <i>218</i>	INDICE: <i>18</i>
POINT CRITIQUE EVENTUEL:	OUI:	NON:
OBJET:		
RECEPTION FERRAILLAGE:	DATE: <i>3.02.97</i>	VISA CHEF DE PROJET
<i>Receptionne le 31/01/97 OK. [Signature]</i>		<i>[Signature]</i>
COFFRAGES:	ASPECT PAREMENT:	
	DEMOULANT:	
	INCORPORATION:	
	DATE: <i>5.02.97</i>	VISA CHEF DE CHANTIER
	<i>8 heures</i>	BON A BETONNER
		<i>A une Soigne</i>
BETONNAGE	TYPE DE BETON <i>classe 1</i>	
	MOYENS BENNE:	MALAXEUR:
	Nbre VIBREURS: <i>2</i>	
	SURFACAGE: REGLE:	TALOCHÉ:
	CURE: <i>eau</i>	
	DATE: <i>5.02.97</i>	VISA CHEF DE CHANTIER
		<i>A une Soigne</i>
PRELEVEMENTS:	ENTREPRISE:	MAÎTRE D'OEUVRE
		Nbre: <i>12</i>
	RESULTATS:	
		INFOS
		7 JOURS
		28 JOURS
POINT CRITIQUE:	OBSERVATIONS:	
OBJET:		
LEVE LE:		
CONTRÔLE EXTERNE	CONTRÔLE INTERNE	
	<i>[Signature]</i>	
* CONFORMITE D'EXECUTION		
VISA CONTRÔLE EXTERNE	FOUGEROLLE C.S.E	MAÎTRE D'OEUVRE
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	




GROUPEMENT FOUGEROLLE C.S.E

BARRAGE AL-BASSAM DE NIANDOUBA

FICHE D'EXECUTION No: **R9**

CHANTIER:

No :



DEFINITION DE L'OUVRAGE: Ouvrage de restitution (voie plot 2)		COFFRAGE No:		INDICE:	
PLAN D'EXECUTION:		ACIER No: 218/B		INDICE:	
POINT CRITIQUE EVENTUEL:		OUI:		NON:	
OBJET:					
RECEPTION FERRAILLAGE:		DATE: 31/01/1997		VISA CHEF DE PROJET 	
COFFRAGES:		ASPECT PAREMENT:			
		DEMOULANT:			
		INCORPORATION:			
		DATE:		VISA CHEF DE CHANTIER BON A BETONNER	
BETONNAGE		TYPE DE BETON		MALAXEUR:	
		MOYENS BENNE:			
		Nbre VIBREURS:			
		SURFACAGE: REGLE:		VALOCHÉ:	
		CURE:			
		DATE:		VISA CHEF DE CHANTIER Ainojn GABRIEL 	
PRELEVEMENTS:		ENTREPRISE:		MAÎTRE D'OEUVRE	
				Nbre:	
RESULTATS:		INFOS	7 JOURS	28 JOURS	
POINT CRITIQUE:		OBSERVATIONS:			
OBJET:					
LEVE LE:					
CONTRÔLE EXTERNE		CONTRÔLE INTERNE			
* CONFORMITE D'EXECUTION					
VISA CONTRÔLE EXTERNE		FOUGEROLLE C.S.E		MAÎTRE D'OEUVRE	
 31/01/97 OK ferrailage					

GROUPEMENT FOUGEROLLE C.S.E

BARRAGE AL-BASSAM DE NIANDOUBA

FICHE D'EXECUTION No :

CHANTIER: Barrage de Niandouba No : R8

DEFINITION DE L'OUVRAGE: <u>Ouvrage de restitution - Plot n°3 (dalle)</u>							
PLAN D'EXECUTION: <u>219/0</u>	COFFRAGE No: <u>213/0</u> ACIER No: <u>219/0</u>						
POINT CRITIQUE EVENTUEL:	OUI: _____ NON: _____						
OBJET:							
RECEPTION FERRAILLAGE:	DATE: <u>30/01/97</u> VISA CHEF DE PROJET 						
COFFRAGES :	ASPECT PAREMENT:						
	DEMOULANT:						
	INCORPORATION:						
	DATE: <u>31/02/1997</u> VISA CHEF DE CHANTIER BON A BETONNER						
BETONNAGE	TYPE DE BETON <u>classe I</u>						
	MOYENS <u>BENNE</u> : MALAXEUR:						
	Nbre VIBREURS: <u>2</u>						
	SURFACAGE: <u>REGLE</u> : TALOCHÉ:						
	CURE:						
	DATE: <u>01/02/1997</u> VISA CHEF DE CHANTIER <u>Aimé SABRA</u>						
PRELEVEMENTS:	ENTREPRISE: MAÎTRE D'OEUVRE Nbre: <u>12</u>						
	RESULTATS:						
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th>INFOS</th> <th>7 JOURS</th> <th>28 JOURS</th> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </table>	INFOS	7 JOURS	28 JOURS			
INFOS	7 JOURS	28 JOURS					
POINT CRITIQUE:	OBSERVATIONS:						
OBJET:							
LEVE LE:							
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>CONTRÔLE EXTERNE</td> <td>CONTRÔLE INTERNE</td> </tr> <tr> <td><u>JK ferraillage 30/01/97</u></td> <td><u>1/02/97</u></td> </tr> </table>	CONTRÔLE EXTERNE	CONTRÔLE INTERNE	<u>JK ferraillage 30/01/97</u>	<u>1/02/97</u>			
CONTRÔLE EXTERNE	CONTRÔLE INTERNE						
<u>JK ferraillage 30/01/97</u>	<u>1/02/97</u>						
CONFORMITE D'EXECUTION							
VISA CONTRÔLE EXTERNE	FOUGEROLLE C.S.E						
	MAÎTRE D'OEUVRE						

GROUPEMENT FOUGEROLLE C.S.E

BARRAGE AL-BASSAM DE NIANDOUBA

FICHE D'EXECUTION No:

CHANTIER: *Niandouba*

No: *E9*

DEFINITION DE L'OUVRAGE: <i>Deversoir - Bedon Plot B</i>								
PLAN D'EXECUTION:	COTFRAGE No: <i>205</i>	INDICE: <i>0</i>						
	ACIER No: <i>206</i>	INDICE: <i>17</i>						
POINT CRITIQUE EVENTUEL:	OUI:	NON:						
OBJET:								
RECEPTION FERRAILLAGE:	DATE: <i>28.01.97</i>	VISA CHEF DE PROJET <i>[Signature]</i>						
OFFRAGES:	ASPECT PAREMENT:							
	DEMOULANT:							
	INCORPORATION:							
	DATE: <i>25.01.97</i>	VISA CHEF DE CHANTIER BON A BETONNER						
BETONNAGE	TYPE DE BETON <i>classe 15</i>							
	MOYENS BENNE:	MALAXEUR:						
	Nbre VIBREURS: <i>2</i>							
	SURFACAGE: REGLE:	VALOCHTE:						
	CURE: <i>eau</i>							
	DATE: <i>29.01.97</i>	VISA CHEF DE CHANTIER <i>Aime J. GAGNA</i>						
PRELEVEMENTS:	ENTREPRISE:	MAÎTRE D'OEUVRE Nbre:						
	RESULTATS:							
		<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th>INFOS</th> <th>7 JOURS</th> <th>28 JOURS</th> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </table>	INFOS	7 JOURS	28 JOURS			
INFOS	7 JOURS	28 JOURS						
POINT CRITIQUE:	OBSERVATIONS:							
OBJET:								
LEVE LE:								
CONTRÔLE EXTERNE	CONTRÔLE INTERNE							
<i>OK ferrailage 20/01/97</i>	<i>[Signature]</i>							
* CONFORMITE D'EXECUTION								
VISA CONTRÔLE EXTERNE	FOUGEROLLE C.S.E	MAÎTRE D'OEUVRE						
<i>[Signature]</i>								

GROUPEMENT FOUGEROLLE C.S.E

BARRAGE AL-BASSAM DE NIANDOUBA

FICHE D'EXECUTION No :

CHANTIER: Niandouba

No : 61

DEFINITION DE L'OUVRAGE: <i>1m gauche. Plot 2. (Suite 3/</i>								
PLAN D'EXECUTION:	COFFRAGE No: <i>203</i>	INDICE: <i>0</i>						
	ACIER No:	INDICE:						
POINT CRITIQUE EVENTUEL:	OUI:	NON:						
OBJET:								
RECEPTION FERRAILLAGE:	DATE:	VISA CHEF DE PROJET						
COFFRAGES : ASPECT PAREMENT: <i>25</i> DEMOULANT: INCORPORATION: DATE: <i>29.01.97</i> VISA CHEF DE CHANTIER, <i>9 Heurs</i> BON P. BETONNER								
BETONNAGE	TYPE DE BETON <i>class 2</i>							
	MOYENS BENNE:	MALAXEUR:						
	Nbre VIBREURS: <i>2</i>							
	SURFACAGE: REGLE:	TALOCHÉ:						
	CURE: <i>long</i>							
	DATE: <i>29.01.97</i>	VISA CHEF DE CHANTIER <i>Amé J. SAGNA</i>						
PRELEVEMENTS:	ENTREPRISE:	MAÎTRE D'OEUVRE Nbre:						
	RESULTATS:	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="width: 30%;">INFOS</th> <th style="width: 35%;">7 JOURS</th> <th style="width: 35%;">28 JOURS</th> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </table>	INFOS	7 JOURS	28 JOURS			
INFOS	7 JOURS	28 JOURS						
POINT CRITIQUE:	OBSERVATIONS:							
OBJET:								
LEVÉ LE:								
CONTRÔLE EXTERNE	CONTRÔLE INTERNE							
	<i>[Signature]</i>							
* CONFORMITE D'EXECUTION								
VISA CONTRÔLE EXTERNE	FOUGEROLLE C.S.E	MAÎTRE D'OEUVRE						
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>							

GROUPEMENT FOUGEROLLE C.S.E

BARRAGE AL-BASSAM DE NIANDOUBA

FICHE D'EXECUTION No:

CHANTIER: *Niandouba*

No: *E8*

DEFINITION DE L'OUVRAGE: <i>Evolement Radier Poutre</i>								
PLAN D'EXECUTION:	COTTRAGE No: <i>205</i>	INDICE: <i>0</i>						
	ACIER No: <i>206</i>	INDICE: <i>A</i>						
POINT CRITIQUE EVENTUEL:	OUI:	NON:						
OBJET:								
RECEPTION FERRAILLAGE:	DATE: <i>28.01.97</i>	VISA CHEF DE PROJET <i>[Signature]</i>						
OFFRAGES:	ASPECT PAREMENT:							
	DEMOULANT:							
	INCORPORATION:							
	DATE: <i>29.01.97</i> <i>16 Heures</i>	VISA CHEF DE CHANTIER BON A BETONNER						
BETONNAGE	TYPE DE BETON <i>class I</i>							
	MOYENS BENNE:	MALAXEUR:						
	Nbre VIBREURS: <i>2</i>							
	SURFACAGE: REGLE:	TALOCHE:						
	CURE: <i>eau</i>							
	DATE: <i>30.01.97</i>	VISA CHEF DE CHANTIER <i>Aime SAGNA</i>						
PRELEVEMENTS:	ENTREPRISE:	MAÎTRE D'OEUVRE						
		Nbre:						
	RESULTATS:	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th>INFOS</th> <th>7 JOURS</th> <th>28 JOURS</th> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </table>	INFOS	7 JOURS	28 JOURS			
INFOS	7 JOURS	28 JOURS						
POINT CRITIQUE:	OBSERVATIONS:							
OBJET:								
LEVE LE:								
CONTRÔLE EXTERNE	CONTRÔLE INTERNE							
<i>OK ferrillage 28/01/97</i> <i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>							
* CONFORMITE D'EXECUTION								
VISA CONTRÔLE EXTERNE	FOUGEROLLE C.S.E	MAÎTRE D'OEUVRE						
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>							

GROUPEMENT FOUGEROLLE C.S.E

BARRAGE AL-BASSAM DE NIANDOUBA


FICHE D'EXECUTION No: **R7**

CHANTIER: **Niandouba**

No: '

DEFINITION DE L'OUVRAGE: **ouvrage de restitution (Rebet plot 2)**
 PLAN D'EXECUTION: COFFRAGE No: **2121B** INDICE:
 ACIER No: **2181B** INDICE:

POINT CRITIQUE EVENTUEL: OUI: NON:
 OBJET:

RECEPTION FERRAILLAGE: " " DATE: **27/01/97** VISA CHEF DE PROJET


COFFRAGES: ASPECT PAREMENT:
 DEMOULANT:
 INCORPORATION:
 DATE: **27/01/97** VISA CHEF DE CHANTIER
 BON A BETONNER

BETONNAGE TYPE DE BETON **classe I**
 MOYENS BENNE: MALAXEUR:
 Nbre VIBREURS: **2**
 SURFACAGE: REGLE: VALOCHÉ:
 CURE: eau
 DATE: **27/01/97** VISA CHEF DE CHANTIER
Ame in SABINA

PRELEVEMENTS: ENTREPRISE: MAÎTRE D'OEUVRE Nbre: **12**
 RESULTATS:

INFOS	7 JOURS	28 JOURS

POINT CRITIQUE: **Armatures de reperas 3 et 4**
 OBJET: **Tangues de bords**
 LEVE LE: **contrôle le 27/01/97 par Youhamadou Kallidou GAYE**

OBSERVATIONS: **Il a été constaté après le contrôle des armatures avec le ferrailleur N. SARR désigné par CSE / Fougérolle en tangues suivantes:**
 - 3 HA 20 de reperas 3
 - 8 HA 16 de reperas 4.

CONTRÔLE EXTERNE: **A Geyssier 27/01/97**
 CONTRÔLE INTERNE: **[Signature]**

CONFORMITE D'EXECUTION

VISA CONTRÔLE EXTERNE	FOUGEROLLE C.S.E	MAÎTRE D'OEUVRE
[Signature]	[Signature]	

* ATTENDRE DIRECTIVES DU "CONTROLE" POUR RACCORDEMENT ALTIMÉTRIQUE AVEC LES PLOTS #1 ET #3. **BARRES manquantes remises en conformité. OK pour le béton. 28/07/97 N GAYE**

GROUPEMENT FOUGEROLLE C.S.E

222,220

BARRAGE AL-BASSAM DE NIANDOUBA

FICHE D'EXECUTION No :

CHANTIER: Barrage de Niandouba

No :

DEFINITION DE L'OUVRAGE: <u>Ouvrage de restitution plot 4 (radier)</u>							
PLAN D'EXECUTION:	COFFRAGE No: <u>213</u> INDICE: ACIER No: <u>220</u> INDICE:						
POINT CRITIQUE EVENTUEL:	OUI: NON:						
OBJET:							
RECEPTION FERRAILLAGE:	DATE: <u>24/01/1997</u> VISA CHEF DE PROJET						
COFFRAGES :	ASPECT PAREMENT: DEMOULANT: INCORPORATION:						
	DATE: <u>25/01/1997</u> VISA CHEF DE CHANTIER, BON A BETONNER, <u>Aime SAGNA.</u>						
BETONNAGE	TYPE DE BETON MOYENS BENNE: MALAXEUR: Nbre VIBREURS: SURFACAGE: REGLE: TALOCHE: CURE:						
	DATE: VISA CHEF DE CHANTIER						
PRELEVEMENTS:	ENTREPRISE: MAÎTRE D'OEUVRE Nbre:						
	RESULTATS:						
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>INFOS</th> <th>7 JOURS</th> <th>28 JOURS</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table>	INFOS	7 JOURS	28 JOURS			
INFOS	7 JOURS	28 JOURS					
POINT CRITIQUE:	OBSERVATIONS: <u>Le Ingénieur du bureau de Contrôle (BC) M. Alla Diruf a procédé à la réception du ferraillage le 25/01/97 (manque de bourse de repère 58) - Repère mis en conformité avant le coulage suivi par le Bureau de Contrôle SSC-SOCOTEC</u>						
OBJET:							
LEVE LE:							
CONTRÔLE EXTERNE	CONTRÔLE INTERNE						
<u>Dr Armature, 25/01/97</u> <u>[Signature]</u>							
* CONFORMITE D'EXECUTION							
VISA CONTRÔLE EXTERNE	FOUGEROLLE C.S.E MAÎTRE D'OEUVRE						
<u>[Signature]</u>	<u>[Signature]</u>						

GROUPEMENT FOUGEROLLE C.S.E

BARRAGE AL-BASSAM DE NIANDOUBA

FICHE D'EXECUTION No :

CHANTIER: *Niandouba*

No :

DEFINITION DE L'OUVRAGE: <i>Barrage de restitution. Vider plot 3</i>		
PLAN D'EXECUTION:	COFFRAGE No: <i>2130</i>	INDICE:
	ACIER No:	INDICE:
POINT CRITIQUE EVENTUEL:	OUI:	NON:
OBJET:		
RECEPTION FERRAILLAGE:	DATE:	VISA CHEF DE PROJET
COFFRAGES :		
ASPECT PAREMENT:		
DEMOULANT:		
INCORPORATION:		
	DATE: <i>20.01.97</i>	VISA CHEF DE CHANTIER
	<i>14430</i>	BON A BETONNER
		<i>Aume Sodma</i>
BETONNAGE	TYPE DE BETON <i>class F</i>	
	MOYENS BENNE:	MALAXEUR:
	Nbre VIBREURS: <i>2</i>	
	SURFACAGE: REGLE:	VALOCHÉ:
	CURE: <i>eau</i>	
	DATE: <i>21.01.97</i>	VISA CHEF DE CHANTIER
		<i>Aume Sodma</i>
COULEVEMENTS:	ENTREPRISE:	MAÎTRE D'OEUVRE
		Nbre: <i>1 2</i>
	RESULTATS:	
		INFOS
		7 JOURS
		28 JOURS
POINT CRITIQUE: <i>COFFRAGE EXTRÉMITÉS AMONT/AVANT</i>	OBSERVATIONS:	
OBJET: <i>RADIER - BÉTON AMONT</i>	<i>VOIR COMMENTAIRES</i>	
LEVÉ LE: <i>20-01-97</i>	<i>LEVÉ TOPO. 20/01/97 -</i>	
	<i>Be / a / Boje</i>	
CONTRÔLE EXTERNE	CONTRÔLE INTERNE	
<i>Be / a / Boje</i>	<i>J. Chade</i>	
* CONFORMITÉ D'EXECUTION		
VISA CONTRÔLE EXTERNE	FOUGEROLLE C.S.E	MAÎTRE D'OEUVRE
	<i>J. Chade</i>	

* SE RÉFÉRER AU DIRECTEUR POUR APPROBATION. *B Boje*

GROUPEMENT FOUGEROLLE C.S.E

BARRAGE AL-BASSAM DE NIANDOUBA

FICHE D'EXECUTION No :

CHANTIER: Barrage Niandouba No :

DEFINITION DE L'OUVRAGE: <u>Plan de gâchée. Evacuation sur 1 plan 2.</u>								
PLAN D'EXECUTION:	COFFRAGE No: <u>202</u>	INDICE: <u>0</u>						
	ACIER No:	INDICE:						
POINT CRITIQUE EVENTUEL:	OUI:	NON:						
OBJET:								
RECEPTION FERRAILLAGE:	DATE:	VISA CHEF DE PROJET						
COFFRAGES : ASPECT PAREMENT: DEMOULANT: INCORPORATION:								
	DATE: <u>17-01-07</u>	VISA CHEF DE CHANTIER BON A BETONNER						
BETONNAGE	TYPE DE BETON <u>dosse II</u>							
	MOYENS BENNE:	MALAXEUR:						
	Nbre VIBREURS: <u>2</u>							
	SURFACAGE: REGLE:	VALOCHÉ:						
	CURE: <u>eau</u>							
	DATE: <u>20.1.07</u>	VISA CHEF DE CHANTIER <u>Ame Saone</u>						
PRELEVEMENTS:	ENTREPRISE:	MAÎTRE D'OEUVRE Nbre: <u>12</u>						
	RESULTATS:	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th>INFOS</th> <th>7 JOURS</th> <th>28 JOURS</th> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </table>	INFOS	7 JOURS	28 JOURS			
INFOS	7 JOURS	28 JOURS						
POINT CRITIQUE:	OBSERVATIONS:							
OBJET:								
LEVE LE:								
CONTRÔLE EXTERNE	CONTRÔLE INTERNE							
	<u>[Signature]</u>							
* CONFORMITE D'EXECUTION								
VISA CONTRÔLE EXTERNE	FOUGEROLLE C.S.E	MAÎTRE D'OEUVRE						
<u>[Signature]</u>	<u>[Signature]</u>							

GROUPEMENT FOUGEROLLE C.S.E

BARRAGE AL-BASSAM DE NIANDOUBA

FICHE D'EXECUTION No :

CHANTIER: Barrage Niandouba No :

DEFINITION DE L'OUVRAGE: <u>Durée Restauration Prols</u>								
PLAN D'EXECUTION:	COFFRAGE No: <u>211</u>	INDICE: <u>B</u>						
	ACIER No:	INDICE:						
POINT CRITIQUE EVENTUEL:	OUI:	NON:						
OBJET:								
RECEPTION FERRAILLAGE:	DATE:	VISA CHEF DE PROJET						
OFFRAGES : <u>Contrôle implantation Prols</u>								
ASPECT PAREMENT:								
DEMOULANT:								
INCORPORATION:								
	DATE: <u>17.01.97.</u> <u>(10 Heures)</u>	VISA CHEF DE CHANTIER BON A BETONNER.						
BETONNAGE	TYPE DE BETON							
	MOYENS BENNE:	MALAXEUR:						
	Nbre VIBREURS:							
	SURFACAGE: REGLE:	TALOCHÉ:						
	CURE:							
	DATE:	VISA CHEF DE CHANTIER						
PRELEVEMENTS:	ENTREPRISE:	MAÎTRE D'OEUVRE Nbre:						
	RESULTATS:	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th>INFOS</th> <th>7 JOURS</th> <th>28 JOURS</th> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </table>	INFOS	7 JOURS	28 JOURS			
INFOS	7 JOURS	28 JOURS						
POINT CRITIQUE:	OBSERVATIONS:							
OBJET:								
LEVE LE:								
CONTRÔLE EXTERNE	CONTRÔLE INTERNE							
	<u>[Signature]</u>							
* CONFORMITE D'EXECUTION								
VISA CONTRÔLE EXTERNE	FOUGEROLLE C.S.E	MAÎTRE D'OEUVRE						
<u>[Signature]</u>	<u>[Signature]</u>							

GROUPEMENT FOUGEROLLE C.S.E

BARRAGE AL-BASSAM DE NIANDOURA

FICHE D'EXECUTION No :

CHANTIER: Barrage Niandoura No :

DEFINITION DE L'OUVRAGE: <u>Exécution Béton pro G</u>								
PLAN D'EXECUTION:	COFFRAGE No: <u>205</u>	INDICE: <u>0</u>						
	ACIER No: <u>206</u>	INDICE: <u>A</u>						
POINT CRITIQUE EVENTUEL:	OUI:	NON:						
OBJET:								
RECEPTION FERRAILLAGE:	DATE: <u>15.01.97</u>	VISA CHEF DE PROJET <u>[Signature]</u>						
COFFRAGES:	ASPECT PAREMENT:							
<u>Impression</u>	DEMOULANT:							
	INCORPORATION:							
	DATE: <u>16.01.97</u> <u>10 H ems</u>	VISA CHEF DE CHANTIER BON A BETONNER <u>Ame Soome</u>						
BETONNAGE	TYPE DE BETON <u>Stark I</u>							
	MOYENS BENNE:	MALAXEUR:						
	Nbre VIBREURS: <u>2</u>							
	SURFACAGE: REGLE:	VALOCHTE:						
	CURE: <u>eau</u>							
	DATE: <u>16.01.97</u> <u>16 H 30</u>	VISA CHEF DE CHANTIER <u>Ame Soome</u>						
PRELEVEMENTS:	ENTREPRISE:	MAÎTRE D'OEUVRE Nbre: <u>12</u>						
	RESULTATS:	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>INFOS</td> <td>7 JOURS</td> <td>28 JOURS</td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </table>	INFOS	7 JOURS	28 JOURS			
INFOS	7 JOURS	28 JOURS						
POINT CRITIQUE:	OBSERVATIONS:							
OBJET:								
LEVE LE:								
CONTRÔLE EXTERNE	CONTRÔLE INTERNE							
<u>OK ferrailage 16/01/97</u> <u>[Signature]</u>	<u>[Signature]</u>							
* CONFORMITE D'EXECUTION								
VISA CONTRÔLE EXTERNE	FOUGEROLLE C.S.E	MAÎTRE D'OEUVRE						
<u>[Signature]</u>	<u>[Signature]</u>							

GROUPEMENT FOUGEROLLE C.S.E

BARRAGE AL-BASSAM DE NIANDOUBA

FICHE D'EXECUTION No :

CHANTIER: Barrage Niandouba No :






DEFINITION DE L'OUVRAGE: <u>Evacuation. P. 101 C (Radier)</u>								
PLAN D'EXECUTION:	COFFRAGE No: <u>205</u>	INDICE: <u>0</u>						
	ACIER No: <u>206</u>	INDICE: <u>A</u>						
POINT CRITIQUE EVENTUEL:	OUI:	NON:						
OBJET:								
RECEPTION FERRAILLAGE:	DATE: <u>15.01.97</u> (10 Heures)	VISA CHEF DE PROJET <u>[Signature]</u>						
COFFRAGES:	ASPECT PAREMENT: DEMOULANT: INCORPORATION:							
	DATE: <u>17.01.97</u> (15 Heures)	VISA CHEF DE CHANTIER BON A BETONNER. <u>Ame Soume</u>						
BETONNAGE	TYPE DE BETON <u>classe C</u> MOYENS BENNE: Nbre VIBREURS: <u>3</u> SURFACAGE: <u>REGLE</u> CURE: <u>eau</u>	MALAXEUR: <u>—</u> VALOISE:						
	DATE: <u>18.01.97</u>	VISA CHEF DE CHANTIER <u>Ame Soume</u>						
PRELEVEMENTS:	ENTREPRISE:	MAÎTRE D'ŒUVRE Nbre: <u>12</u>						
	RESULTATS:	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th>INFOS</th> <th>7 JOURS</th> <th>28 JOURS</th> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </table>	INFOS	7 JOURS	28 JOURS			
INFOS	7 JOURS	28 JOURS						
POINT CRITIQUE:	OBSERVATIONS:							
OBJET:								
LEVE LE:								
CONTRÔLE EXTERNE	CONTRÔLE INTERNE							
<u>OK Armatures 15/01/97</u> <u>[Signature]</u>	<u>[Signature]</u>							
* CONFORMITE D'EXECUTION								
VISA CONTRÔLE EXTERNE	FOUGEROLLE C.S.E	MAÎTRE D'ŒUVRE						
<u>[Signature]</u>	<u>[Signature]</u>							

GROUPEMENT FOUGEROLLE C.S.E

BARRAGE AL-BASSAM DE NIANDOUBA

FICHE D'EXECUTION No :

CHANTIER: Barrage de Niandouba No :

DEFINITION DE L'OUVRAGE: <u>Coussage de Restauration</u> <u>Plas 3 (voies)</u>								
PLAN D'EXECUTION:	COFFRAGE No: <u>213</u>	INDICE: <u>0</u>						
	ACIER No: <u>207</u>	INDICE: <u>0</u>						
POINT CRITIQUE EVENTUEL:	OUI:	NON:						
OBJET:								
RECEPTION FERRAILLAGE:	DATE: <u>14.01.97</u> <u>10 heures</u>	VISA CHEF DE PROJET 						
COFFRAGES:	ASPECT PAREMENT: DEMOULANT: INCORPORATION:							
	DATE: <u>18.01.97</u> <u>(10 heures)</u>	VISA CHEF DE CHANTIER BON A BETONNER 						
BETONNAGE	TYPE DE BETON MOYENS BENNE: Nbre VIBREURS: SURFACAGE: REGLE: CURE:	MALAXEUR: VALOCHÉ:						
	DATE:	VISA CHEF DE CHANTIER						
PRELEVEMENTS:	ENTREPRISE:	MAÎTRE D'OEUVRE Nbre:						
	RESULTATS:	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th>INFOS</th> <th>7 JOURS</th> <th>28 JOURS</th> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </table>	INFOS	7 JOURS	28 JOURS			
INFOS	7 JOURS	28 JOURS						
POINT CRITIQUE:	OBSERVATIONS:							
OBJET:								
LEVE LE:								
CONTRÔLE EXTERNE	CONTRÔLE INTERNE							
<u>OK ferraillage</u> <u>14/01/97</u> 								
* CONFORMITE D'EXECUTION								
VISA CONTRÔLE EXTERNE	FOUGEROLLE C.S.E	MAÎTRE D'OEUVRE						
								

GROUPEMENT FOUGEROLLE C.S.E

BARRAGE AL-BASSAM DE NIANDOUBA

FICHE D'EXECUTION No :

CHANTIER: *Barrage de Niandouba* No :

DEFINITION DE L'OUVRAGE: <i>Barrage de Restauration Plot 1. (Dolle)</i>							
PLAN D'EXECUTION:	COFFRAGE No: <i>211</i> INDICE: <i>B</i> ACIER No: <i>216</i> INDICE: <i>A</i>						
POINT CRITIQUE EVENTUEL:	OUI: NON:						
OBJET:							
RECEPTION FERRAILLAGE:	DATE: <i>10.01.97</i> <i>(17 Heures)</i> VISA CHEF DE PROJET <i>[Signature]</i>						
DIFFRAGES :	ASPECT PAREMENT: DEMOULANT: INCORPORATION: DATE: <i>11.01.97</i> <i>11 Heures.</i> VISA CHEF DE CHANTIER <i>BON A BETONNER</i> <i>Ame Sagne.</i>						
BETONNAGE	TYPE DE BETON <i>classé</i> MOYENS BENNE: MALAXEUR: Nbre VIBREURS: <i>2</i> SURFACAGE: REGLE: TALOCHÉ: CURE: <i>eau</i> DATE: <i>11.01.1997.</i> VISA CHEF DE CHANTIER <i>Ame Sagne</i>						
PRELEVEMENTS:	ENTREPRISE: MAÎTRE D'OEUVRE Nbre:						
RESULTATS:	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="width: 30%;">INFOS</th> <th style="width: 30%;">7 JOURS</th> <th style="width: 30%;">28 JOURS</th> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </table>	INFOS	7 JOURS	28 JOURS			
INFOS	7 JOURS	28 JOURS					
POINT CRITIQUE:	OBSERVATIONS:						
OBJET:							
LEVE LE:							
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="width: 50%;">CONTRÔLE EXTERNE</th> <th style="width: 50%;">CONTRÔLE INTERNE</th> </tr> <tr> <td><i>ok ferrailage [Signature] 11/01/97</i></td> <td><i>[Signature]</i></td> </tr> </table>	CONTRÔLE EXTERNE	CONTRÔLE INTERNE	<i>ok ferrailage [Signature] 11/01/97</i>	<i>[Signature]</i>			
CONTRÔLE EXTERNE	CONTRÔLE INTERNE						
<i>ok ferrailage [Signature] 11/01/97</i>	<i>[Signature]</i>						
* CONFORMITE D'EXECUTION							
VISA CONTRÔLE EXTERNE	FOUGEROLLE C.S.E	MAÎTRE D'OEUVRE					
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>						

11/01/97

GROUPEMENT FOUGEROLLE C.S.E

BARRAGE AL-BASSAM DE NIANDOUBA

FICHE D'EXECUTION No:

CHANTIER: Niandouba

No :

DEFINITION DE L'OUVRAGE: <u>Roadier Plot F - Evacuateur</u>								
PLAN D'EXECUTION:	COTTRAGE No: <u>205</u>	INDICE: <u>0</u>						
	ACIER No: <u>206</u>	INDICE: <u>A</u>						
POINT CRITIQUE EVENTUEL:	OUI:	NON:						
OBJET:								
RECEPTION FERRAILLAGE: <u>07.01.97</u>	DATE: <u>07.01.97</u>	VISA CHEF DE PROJET <u>J. Thodet</u>						
OFFRAGES:	ASPECT PAREMENT: DEMOULANT: INCORPORATION:							
	DATE: <u>08.01.97</u> <u>16 Heures.</u>	VISA CHEF DE CHANTIER BON A BETONNER <u>Aime Sogna</u>						
BETONNAGE	TYPE DE BETON <u>classe I</u> MOYENS BENNE: Nbre VIBREURS: <u>3</u> SURFACAGE: <u>eau</u> REGLE: CURE: <u>eau</u>	MALAXEUR: <u> </u> TALOCHÉ:						
	DATE: <u>09.01.97</u>	VISA CHEF DE CHANTIER <u>Aime Sogna</u>						
PRELEVEMENTS:	ENTREPRISE:	MAÎTRE D'OEUVRE Nbre: <u>12</u>						
	RESULTATS:	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th>INFOS</th> <th>7 JOURS</th> <th>28 JOURS</th> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </table>	INFOS	7 JOURS	28 JOURS			
INFOS	7 JOURS	28 JOURS						
POINT CRITIQUE:	OBSERVATIONS:							
OBJET:								
LEVE LE:								
CONTRÔLE EXTERNE	CONTRÔLE INTERNE							
<u>OK ferraille / 07/01/97 / [Signature]</u>	<u>[Signature]</u>							
* CONFORMITE D'EXECUTION								
VISA CONTRÔLE EXTERNE	FOUGEROLLE C.S.E	MAÎTRE D'OEUVRE						
<u>[Signature]</u>	<u>[Signature]</u>							

GROUPEMENT FOUGEROLLE C.S.E

BARRAGE AL-BASSAM DE NIANDOUBA

FICHE D'EXECUTION No :

CHANTIER: Niandouba

No :

DEFINITION DE L'OUVRAGE: <u>Besoi Plan E - Evacuation</u>		
PLAN D'EXECUTION:	COFFRAGE No: <u>205</u>	INDICE: <u>0</u>
	ACIER No: <u>206</u>	INDICE: <u>A</u>
POINT CRITIQUE EVENTUEL:	OUI:	NON:
OBJET:		
RECEPTION FERRAILLAGE:	DATE: <u>7.01.97</u>	VISA CHEF DE PROJET <u>[Signature]</u>
COFFRAGES:	ASPECT PAREMENT: <u>Plaine Facile</u>	
	DEMOULANT:	
	INCORPORATION:	
	DATE: <u>7.01.97</u>	VISA CHEF DE CHANTIER
	<u>Reception implantation</u>	<u>BON A BETONNER</u>
	<u>Si possible à 10 heures.</u>	<u>Aume Segna</u>
BETONNAGE	TYPE DE BETON <u>classe I</u>	
	MOYENS BENNE:	MALAXEUR:
	Nbre VIBREURS: <u>2</u>	
	SURFACAGE: REGLE:	TALOCHÉ:
	CURE:	
	DATE: <u>7.01.97</u>	VISA CHEF DE CHANTIER
		<u>Aume Segna</u>
PRELEVEMENTS:	ENTREPRISE:	MAÎTRE D'OEUVRE
		Nbre: <u>12</u>
	RESULTATS:	
		INFOS
		7 JOURS
		28 JOURS
POINT CRITIQUE:	OBSERVATIONS:	
OBJET:	<u>*EXCAVATION A COMPLÉTER.</u>	
LEVÉ LE:		
CONTRÔLE EXTERNE	CONTRÔLE INTERNE	
<u>OK ferrailage [Signature]</u>	<u>[Signature]</u>	
	# CONFORMITE D'EXECUTION	
VISA CONTRÔLE EXTERNE	FOUGEROLLE C.S.E	MAÎTRE D'OEUVRE
<u>[Signature]</u>	<u>[Signature]</u>	


GROUPEMENT FOUGEROLLE C.S.E

BARRAGE AL-BASSAM DE NIANDOUBA

FICHE D'EXECUTION No :

CHANTIER: *Niandouba*

No :

DEFINITION DE L'OUVRAGE: <i>Plot 1. Coulage de Revêtement - Voies</i>								
PLAN D'EXECUTION:	COFFRAGE No: <i>213</i>	INDICE: <i>B</i>						
	ACIER No: <i></i>	INDICE: <i></i>						
POINT CRITIQUE EVENTUEL:	OUI:	NON:						
OBJET:								
RECEPTION FERRAILLAGE:	DATE:	VISA CHEF DE PROJET						
COFFRAGES : ASPECT PAREMENT: <i></i> DEMOULANT: <i></i> INCORPORATION: <i></i>								
	DATE: <i>4.01.97</i>	VISA CHEF DE CHANTIER <i>BON A BETONNER</i> <i>Aume Saegre</i>						
BETONNAGE	TYPE DE BETON <i>classe E</i>							
	MOYENS BENNE: <i></i>	MALAXEUR: <i></i>						
	Nbre VIBREURS: <i>2</i>							
	SURFACAGE: <i></i>	VALOCHÉ: <i></i>						
	CURE: <i>eau</i>							
	DATE: <i>4.01.97</i>	VISA CHEF DE CHANTIER <i>Aume Saegre</i>						
PRELEVEMENTS:	ENTREPRISE: <i></i>	MAÎTRE D'OEUVRE Nbre: <i>12</i>						
	RESULTATS:	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>INFOS</td> <td>7 JOURS</td> <td>28 JOURS</td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </table>	INFOS	7 JOURS	28 JOURS			
INFOS	7 JOURS	28 JOURS						
POINT CRITIQUE:	OBSERVATIONS:							
OBJET:	<i>Reçu le 3/1/97</i> <i>Mais fini</i>							
LEVE LE:								
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>CONTRÔLE EXTERNE</td> <td>CONTRÔLE INTERNE</td> </tr> <tr> <td> </td> <td style="text-align: center;"><i>Aume Saegre</i></td> </tr> </table>			CONTRÔLE EXTERNE	CONTRÔLE INTERNE		<i>Aume Saegre</i>		
CONTRÔLE EXTERNE	CONTRÔLE INTERNE							
	<i>Aume Saegre</i>							
CONFORMITE D'EXECUTION								
VISA CONTRÔLE EXTERNE		FOUGEROLLE C.S.E						
MISSION DE CONTRÔLE		MAÎTRE D'OEUVRE						
 Tecsult International Limitede		<i>Aume Saegre</i>						

GROUPEMENT FOUGEROLLE C.S.E

BARRAGE AL-BASSAM DE NIANDOUBA

FICHE D'EXECUTION No :

CHANTIER: Niandouba

No :

DEFINITION DE L'OUVRAGE: <u>Plan d'exécution de l'ouvrage (2^e lot)</u>		INDICE: <u>0</u>	
PLAN D'EXECUTION:		COFFRAGE No: <u>203</u>	INDICE:
		ACIER No:	INDICE:
POINT CRITIQUE EVENTUEL:		OUI:	NON:
OBJET:			
RECEPTION FERRAILLAGE:		DATE:	VISA CHEF DE PROJET
DIFFRAGES:		ASPECT PAREMENT:	
		DEMOULANT:	
		INCORPORATION:	
		DATE: <u>4.01.97</u>	VISA CHEF DE CHANTIER BON A BETONNER <u>Amei Saop</u>
BETONNAGE		TYPE DE BETON <u>classe 2</u>	
		MOYENS BENNE:	MALAXEUR:
		Nbre VIBREURS: <u>2</u>	
		SURFACAGE: REGLE:	TALOCHÉ:
		CURE: <u>eau</u>	
		DATE: <u>4.01.97</u>	VISA CHEF DE CHANTIER <u>Amei Saop</u>
PRELEVEMENTS:	ENTREPRISE:	MAÎTRE D'OEUVRE	Nbre: <u>12</u>
RESULTATS:		INFOS	7 JOURS
			28 JOURS
POINT CRITIQUE:		OBSERVATIONS: <u>Recu le 3/1/97</u> <u>Mario Jiri</u>	
OBJET:			
LEVE LE:			
CONTRÔLE EXTERNE	CONTRÔLE INTERNE		
<u>J. Chabot</u>			
CONFORMITE D'EXECUTION			
VISA CONTRÔLE EXTERNE	FOUGEROLLE C.S.E	MAÎTRE D'OEUVRE	
<u>Mission de Contrôle</u> <u>J. Chabot</u>			
<small>lecsuit international limitée</small>			

GROUPEMENT FOUGEROLLE C.S.E

BARRAGE AL-BASSAM DE NIANDOUBA

FICHE D'EXECUTION No :

CHANTIER: *Barrage de Niandouba.* No :

DEFINITION DE L'OUVRAGE: <i>Evacuateur pour D. Rodee Evacuateur</i>								
PLAN D'EXECUTION:	COFFRAGE No: <i>205</i>	INDICE: <i>0</i>						
	ACIER No: <i>206</i>	INDICE: <i>A</i>						
POINT CRITIQUE EVENTUEL:	OUI:	NON:						
OBJET:								
RECEPTION FERRAILLAGE:	DATE: <i>24.12.86</i>	VISA CHEF DE PROJET <i>[Signature]</i>						
COFFRAGES:	ASPECT PAREMENT: DEMOULANT: INCORPORATION:							
	DATE: <i>28.12.86</i>	VISA CHEF DE CHANTIER BON A BETONNER <i>A une Saepne.</i>						
BETONNAGE	TYPE DE BETON <i>dosse 1</i>							
	MOYENS BENNE:	MALAXEUR:						
	Nbre VIBREURS: <i>2</i>							
	SURFACAGE: REGLE:	TALOCHÉ:						
	CURE: <i>eau</i>							
	DATE: <i>30.12.86</i>	VISA CHEF DE CHANTIER <i>[Signature]</i>						
PRELEVEMENTS:	ENTREPRISE:	MAÎTRE D'OEUVRE Nbre: <i>12</i>						
	RESULTATS:	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th>INFOS</th> <th>7 JOURS</th> <th>28 JOURS</th> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </table>	INFOS	7 JOURS	28 JOURS			
INFOS	7 JOURS	28 JOURS						
POINT CRITIQUE:	OBSERVATIONS:							
OBJET:								
LEVÉ LE:								
CONTRÔLE EXTERNE	CONTRÔLE INTERNE							
<i>SR ferrillage [Signature] - 27/12/86</i>	<i>[Signature]</i>							
* CONFORMITE D'EXECUTION								
VISA CONTRÔLE EXTERNE	FOUGEROLLE C.S.E	MAÎTRE D'OEUVRE						
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>							

GROUPEMENT FOUGEROLLE C.S.E

BARRAGE AL-BASSAM DE NIANDOUBA

FICHE D'EXECUTION No:

CHANTIER: Barrage de Niandouba No: Arête

DEFINITION DE L'OUVRAGE: Plan de concr de travaux - Plot 3		CÔFFRAGE No: 203		INDICE: 0
PLAN D'EXECUTION:		ACIER No: 207		INDICE: 0
POINT CRITIQUE EVENTUEL:		OUI:	NON:	
OBJET:				
RECEPTION FERRAILLAGE:		DATE: 27.12.96	VISA CHEF DE PROJET <i>[Signature]</i>	
CÔFFRAGES:		ASPECT PAREMENT:		
		DEMOULANT:		
		INCORPORATION:		
		DATE: 27.12.96	VISA CHEF DE CHANTIER BON A BETONNER <i>Aime Sagna</i>	
BETONNAGE		TYPE DE BETON <i>clom II</i>		
		MOYENS BENNE:		
		Nbre VIBREURS: 2		
		SURFACAGE: REGLE:		
		CURE: <i>eau</i>		
		DATE: 28.12.96	VISA CHEF DE CHANTIER <i>Aime Sagna</i>	
PRELEVEMENTS:		ENTREPRISE:	MAÎTRE D'OEUVRE	Nbre: 12
		RESULTATS:		
		INFOS	7 JOURS	28 JOURS
POINT CRITIQUE:		OBSERVATIONS:		
OBJET:				
LEVE LE:				
CONTRÔLE EXTERNE		CONTRÔLE INTERNE		
<i>5M ferrailage 27/12/96 [Signature]</i>		<i>[Signature]</i>		
CONFORMITE D'EXECUTION				
VISA CONTRÔLE EXTERNE		FOUGEROLLE C.S.E		MAÎTRE D'OEUVRE
<i>[Signature]</i>		<i>[Signature]</i>		

GROUPEMENT FOUGEROLLE C.S.E

BARRAGE AL-BASSAM DE NIANDOUBA

FICHE D'EXECUTION No:

CHANTIER: Barrage de Niandouba No:

DEFINITION DE L'OUVRAGE: Elevateur de Beton plat F	COTTRAGE No: 205	INDICE: D
PLAN D'EXECUTION:	ACIER No: 206	INDICE: A

POINT CRITIQUE EVENTUEL:	OUI:	NON:
OBJET:		

OK

RECEPTION FERRAILLAGE:	DATE: 24.12.96	VISA CHIEF DE PROJET <i>[Signature]</i>
------------------------	-----------------------	--

COTTRAGES:	ASPECT PAREMENT: Plain Facille
	DEMOULANT:
	INCORPORATION:

DATE: 24.12.96	VISA CHIEF DE CHANTIER BON A BILTONNER
-----------------------	---

BETONNAGE	TYPE DE BETON Grain F	MALAXEUR:
	MOYENS BENNE:	
	Nbre VIBREURS: 2	
	SURFACAGE: REGLE:	VALOCHET:
	CURE: eau	

DATE: 26.12.96	VISA CHIEF DE CHANTIER Arme Saone
-----------------------	---

PRELEVEMENTS:	ENTREPRISE:	MAITRE D'OEUVRE	Nbre 12
---------------	-------------	-----------------	----------------

RESULTATS:	INFOS	7 JOURS	28 JOURS

POINT CRITIQUE:	OBSERVATIONS:
OBJET:	
LEVE CL:	

CONTRÔLE LATÉRAL	CONTRÔLE INTERNE
	<i>[Signature]</i>

CONFORMITE D'EXECUTION

VISA CONTRÔLE LATÉRAL <i>[Signature]</i>	FOUGEROLLE C.S.E <i>[Signature]</i>	MAITRE D'OEUVRE
---	--	-----------------

GROUPEMENT FOUGEROLLE C.S.E

BARRAGE AL-BASSAM DE NIANDOUBA

FICHE D'EXECUTION No :

CHANTIER: *Barrage de Niandouba no :*

DEFINITION DE L'OUVRAGE: <i>Création de Restauration</i>	COTTRAGE No: <i>N° 4</i>	INDICE: <i>0</i>
PLAN D'EXECUTION:	ACHR No: <i>220</i>	INDICE: <i>0</i>

POINT CRITIQUE EVENTUEL:	OUI:	NON:
OBJET:		

RECEPTION FERRAILLAGE: <i>Bucher Anti. Renaud</i>	DATE: <i>21.12.96</i>	VISA CHIEF DE PROJET <i>Attale</i>
--	-----------------------	---------------------------------------

COTTRAGES :	ASPECT PAREMENT:	
	DEMOULANT:	
	INCORPORATION:	
	DATE:	VISA CHIEF DE CHANTIER BON A BETONNER

BETONNAGE	TYPE DE BETON <i>classé</i>	MALAXEUR:
	MOYENS BENNE:	
	Nbre VIBREURS: <i>2</i>	
	SURFACAGE: <u>REGLE</u> :	<u>VALOISE</u> :
	CURE:	
	DATE: <i>23.12.96.</i>	VISA CHIEF DE CHANTIER <i>Ame Soame</i>

PRELEVEMENTS:	ENTREPRISE:	MAÎTRE D'OEUVRE
		<i>N° 12</i>
	RESULTATS:	
		INFOS
		7 JOURS
		28 JOURS

POINT CRITIQUE:	OBSERVATIONS:
OBJET:	
LEVEE DE:	
CONTRÔLE EXTERNE	CONTRÔLE INTERNE
	<i>Attale</i>

CONFORMITE D'EXECUTION		
VISA CONTRÔLE EXTERNE <i>Stéphane</i>	FOUGEROLLE C.S.E. <i>Attale</i>	MAÎTRE D'OEUVRE

GROUPEMENT FOUGEROLLE C.S.E

BARRAGE AL-BASSAM DE NIANDOUBA

FICHE D'EXECUTION No :

CHANTIER: *Barrage de Niandouba* No :

DEFINITION DE L'OUVRAGE: <i>Au de structure. Plan 2. Levee 6. Evacuation</i>								
PLAN D'EXECUTION:	COFFRAGE No: <i>202</i>	INDICE: <i>0</i>						
	ACIER No:	INDICE:						
POINT CRITIQUE EVENTUEL:	OUI:	NON:						
OBJET:								
RECEPTION FERRAILLAGE:	DATE:	VISA CHEF DE PROJET						
COFFRAGES :								
ASPECT PAREMENT:								
DEMOULANT:								
INCORPORATION:								
	DATE: <i>19.12.96</i>	VISA CHEF DE CHANTIER BON A BETONNER <i>Ame Soigne</i>						
BETONNAGE								
TYPE DE BETON <i>Solus 2</i>								
MOYENS BENNE:								
Nbre VIBREURS: <i>2</i>								
SURFACAGE: REGLE:								
CURE: <i>eau</i>								
	DATE: <i>20.12.1996</i>	VISA CHEF DE CHANTIER <i>Ame Soigne</i>						
PRELEVEMENTS:	ENTREPRISE:	MAÎTRE D'ŒUVRE Nbre: <i>12</i>						
	RESULTATS:	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>INFOS</td> <td>7 JOURS</td> <td>28 JOURS</td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </table>	INFOS	7 JOURS	28 JOURS			
INFOS	7 JOURS	28 JOURS						
POINT CRITIQUE:		OBSERVATIONS:						
OBJET:								
LEVEE LE:								
CONTRÔLE EXTERNE	CONTRÔLE INTERNE							
<i>[Signature]</i>								
CONFORMITE D'EXECUTION								
VISA CONTRÔLE EXTERNE	FOUGEROLLE C.S.E	MAÎTRE D'ŒUVRE						
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>							

GROUPEMENT FOUGEROLLE C.S.E

BARRAGE AL-BASSAM DE NIANDOUBA

FICHE D'EXECUTION No:

CHANTIER: *Barrage de Niandouba* No:

DEFINITION DE L'OUVRAGE: <i>Evacuateur</i>		
PLAN D'EXECUTION:	COFFRAGE No:	INDICE:
	ACIER No: <i>206</i>	INDICE: <i>A</i>
POINT CRITIQUE EVENTUEL:	OUI:	NON:
OBJET:		
RECEPTION FERRAILLAGE:	DATE: <i>18-12-96</i>	VISA CHEF DE PROJET <i>[Signature]</i>

COFFRAGES:	ASPECT PAREMENT:	VISA CHEF DE CHANTIER BON A BETONNER <i>Ame Saagne</i>
	DEMOULANT:	
	INCORPORATION:	
	DATE: <i>19-12-96</i>	
	<i>Beton 20-12-96</i>	

BETONNAGE	TYPE DE BETON: <i>class 1</i>	MALAXEUR:
	MOYENS BENNE:	
	Nbre VIBREURS: <i>2</i>	VALOISE:
	SURFACAGE: REGLE:	
	CURE: <i>eau</i>	
	DATE: <i>20-12-96</i>	VISA CHEF DE CHANTIER <i>Ame Saagne</i>

PRELEVEMENTS:	ENTREPRISE:	MAÎTRE D'OEUVRE	Nbre: <i>1</i>
	RESULTATS:	INFOS	7 JOURS
			28 JOURS

POINT CRITIQUE:	OBSERVATIONS:
OBJET:	
LEVÉE DE:	
CONTRÔLE EXTERNE	CONTRÔLE INTERNE

CONFORMITE D'EXECUTION		
VISA CONTRÔLE EXTERNE	FOUGEROLLE C.S.E	MAÎTRE D'OEUVRE
<i>Bertin / Beyer</i>	<i>[Signature]</i>	

Bertin / Beyer
19/12/96

GROUPEMENT FOUGEROLLE C.S.E

BARRAGE AL-BASSAM DE NIANDOUBA

FICHE D'EXECUTION No :

CHANTIER: Barrage de Niandouba No :

DEFINITION DE L'OUVRAGE: Emménagement de Restauration No 11		
PLAN D'EXECUTION:	COFFRAGE No: 213	INDICE: A
	ACIER No:	INDICE:
POINT CRITIQUE EVENTUEL:	OUI:	NON:
OBJET:		
RECEPTION FERRAILLAGE:	DATE:	VISA CHIEF DE PROJET

COFFRAGES :	ASPECT PAREMENT:	VISA CHIEF DE CHANTIER: BON A BÉTONNER
	DEMOULANT:	
	INCORPORATION:	
	DATE:	

BETONNAGE	TYPE DE BETON Béton Propre	VISA CHIEF DE CHANTIER: Aime Sogre
	MOYENS BENNE:	
	Nbre VIBREURS:	
	SURFACAGE: REGLE:	
	CURE:	
	DATE: 18-12-96	

PRELEVEMENTS:	ENTREPRISE:	MAÎTRE D'OEUVRE	Nbre:
---------------	-------------	-----------------	-------

RESULTATS:	INFOS	7 JOURS	28 JOURS

POINT CRITIQUE:	OBSERVATIONS:
OBJET:	
LEVEE LI:	

CONTRÔLE EXTERNE	CONTRÔLE INTERNE	
CONFORMITE D'EXECUTION		
VISA CONTRÔLE EXTERNE	FOUGEROLLE C.S.E	MAÎTRE D'OEUVRE
<i>S. G. / B. G.</i>	<i>J. L. Sogre</i>	

GROUPEMENT FOUGEROLLE/C.S.E.

BARRAGE AL BASSAM DE NIANDOUBA

DEMANDE D'APPROBATION N°...R24....

Date et heure d'activité : 14/12/1996 8^H

Item à vérifier : Coffrage du plot 3 (radier)

Localisation : Ouvrage de restitution

Date de soumission : 11/12/1996

Demande effectuée par : MIBAYE *if*

Demande reçue par : Date :

Commentaires :

Contrôlée par : *Bertrand Baye*

Signature et Date : 12/12/96

Remarques : ELEV. DU RADIER A CONTROLER
AVANT BÉTONNAGE

Verification effectuée le 16/12/96
OK

Approuvée:

Non Approuvée:

Bertrand Baye

GROUPEMENT FOUGEROLLE/C.S.E.

BARRAGE AL BASSAM DE NIANDOUBA

DEMANDE D'APPROBATION N°...R2.....

Date et heure d'activité : 13/12/1996 après-midi

Item à vérifier : Ferrailage des plots 3 (radier)

Localisation : Ouvrage de restitution

Date de soumission : 11/12/1996

Demande effectuée par : M. GAYE Jf

Demande reçue par : M. K. Gaye Date : 11/12/96

Commentaires :

Empty box for comments.

Contrôlée par : M. K. Gaye

Signature et Date : M. K. Gaye - 14/12/96

Remarques :

Empty box for remarks.

Approuvée:

Non Approuvée:

GROUPEMENT FOUGEROLLE C.S.E

BARRAGE AL-BASSAM DE NIANDOUBA

FICHE D'EXECUTION No :

CHANTIER: Barrage de Niandouba No :

DEFINITION DE L'OUVRAGE: Evacuateur Beton Plot D	COTFRAGE No:	INDICE:
PLAN D'EXECUTION:	ACIER No: 206	INDICE: A
POINT CRITIQUE EVENTUEL:	OUI:	NON:
OBJET:		

RECEPTION FERRAILLAGE:	DATE: 11.12.96	VISA CHEF DE PROJET <i>[Signature]</i>
------------------------	-----------------------	---

COTFRAGES :	ASPECT PAREMENT:
	DEMOULANT:
	INCORPORATION:
	DATE:
	VISA CHEF DE CHANTIER BON A BETONNER

BETONNAGE	TYPE DE BETON class I	MALAXEUR:
	MOYENS BENNE:	
	Nbre VIBREURS: 2	
	SURFACAGE: REGLE:	VALOISE:
	CURE: eau	
	DATE: 14.12.97	VISA CHEF DE CHANTIER Aumo Sagne

PRELEVEMENTS:	ENTREPRISE:	MAÎTRE D'OEUVRE Nbre: 12
	RESULTATS:	

POINT CRITIQUE:	OBSERVATIONS:
OBJET:	
LEVEE LI:	
CONTRÔLE EXTERNE	CONTRÔLE INTERNE
	<i>[Signature]</i>

CONFORMITE D'EXECUTION		
VISA CONTRÔLE EXTERNE <i>[Signature]</i>	FOUGEROLLE C.S.E <i>[Signature]</i>	MAÎTRE D'OEUVRE

GROUPEMENT FOUGEROLLE/C.S.E.

BARRAGE AL BASSAM DE NIANDOUBA


DEMANDE D'APPROBATION N°.....

Date et heure d'activité : 12/12/1996

Item à vérifier : Feuilles et béton de propreté des baches du plot D

Localisation : Evacuateur de crue

Date de soumission : 11/12/1996

Demande effectuée par : M. GAYE 

Demande reçue par : Date :

Commentaires :
.....
.....
.....
.....


Contrôlée par : 

Signature et Date : 12/12/96

Remarques :
.....
.....
.....
.....

Approuvée:

Non Approuvée :



GROUPEMENT FOUGEROLLE/C.S.E.

BARRAGE AL BASSAM DE NIANDOUBA

DEMANDE D'APPROBATION N°.....

Date et heure d'activité : 13/12/1996 14^H-00

Item à vérifier : Feuilles + béton de propreté du plot E

Localisation : Evacuateur de crue

Date de soumission : 11/12/1996

Demande effectuée par : M. GAYE *[Signature]*

Demande reçue par : Date :

Commentaires :
.....
.....
.....
.....

Contrôlée par : *[Signature]*

Signature et Date : 12/12/96

Remarques :
.....
.....
.....
.....

Approuvée: X

Non Approuvée :

[Signature]

GROUPEMENT FOUGEROLLE/C.S.E.

BARRAGE AL BASSAM DE NIANDOUBA

DEMANDE D'APPROBATION N° R1.....

Date et heure d'activité : 11/12/1996

Item à vérifier : fermeture d'une bêche anti-renard du plot N°3

Localisation : Ouvrage de restitution

Date de soumission : 11/12/1996

Demande effectuée par : M. GAYE

Demande reçue par : M.K. Gaye Date : 11/12/96

Commentaires :

Contrôlée par : M.K. Gaye

Signature et Date : M.K. Gaye 11/12/96

Remarques :

Approuvée:

Non Approuvée:

GROUPEMENT FOUGEROLLE C.S.E

BARRAGE AL-BASSAM DE NIANDOUBA

FICHE D'EXECUTION No:

CHANTIER: *Niandouba*

No :

DEFINITION DE L'OUVRAGE: <i>Coupage de vent Section - Plot n°1.</i>		
PLAN D'EXECUTION:	COFFRAGE No:	INDICE:
	ACIER No: <i>2A6</i>	INDICE: <i>A</i>
POINT CRITIQUE EVENTUEL:	OUI:	NON:
OBJET:		
RECEPTION FERRAILLAGE:	DATE:	VISA CHEF DE PROJET
<i>Vote Plot 1</i>	<i>10-12-96</i>	<i>[Signature]</i>

COFFRAGES :	ASPECT PAREMENT:	VISA CHEF DE CHANTIER BON A BETONNER
	DEMOULANT:	
	INCORPORATION:	
	DATE:	

BETONNAGE	TYPE DE BETON	VISA CHEF DE CHANTIER
	MOYENS BENNE:	
	Nbre VIBREURS:	
	SURFACAGE: REGLE:	
	CURE:	
	DATE:	

PRELEVEMENTS :	ENTREPRISE:	MAÎTRE D'OEUVRE	Nbre:
	RESULTATS:	INFOS	7 JOURS

POINT CRITIQUE :	OBSERVATIONS :			
OBJET:				
LEVÉE LE:				
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;">CONTRÔLE EXTERNE</td> <td style="width: 50%;">CONTRÔLE INTERNE</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;"><i>[Signature]</i></td> </tr> </table>		CONTRÔLE EXTERNE	CONTRÔLE INTERNE	
CONTRÔLE EXTERNE	CONTRÔLE INTERNE			
	<i>[Signature]</i>			

CONFORMITE D'EXECUTION		
VISA CONTRÔLE EXTERNE	FOUGEROLLE C.S.E	MAÎTRE D'OEUVRE
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>

GROUPEMENT FOUGEROLLE C.S.E

BARRAGE AL-BASSAM DE NIANDOUBA

FICHE D'EXECUTION No :

CHANTIER: *Niandouba*

No :

DEFINITION DE L'OUVRAGE: <i>Evacuateur Beeher</i>		
PLAN D'EXECUTION:	COFFRAGE No: <i>205</i>	INDICE: <i>0</i>
	ACIER No: <i>206</i>	INDICE: <i>A</i>
POINT CRITIQUE EVENTUEL:	OUI:	NON:
OBJET:		
RECEPTION FERRAILLAGE:	DATE: <i>10.12.96</i>	VISA CHEF DE PROJET
<i>10.12.96 Beeher plan E</i>		<i>[Signature]</i>

COFFRAGES :	ASPECT PAREMENT:		
	DEMOULANT:		
<i>Beeher plan E</i>	INCORPORATION:		VISA CHEF DE CHANTIER
	DATE: <i>10-12-96</i>		BON A BETONNER <i>Ame Saagne</i>

BETONNAGE	TYPE DE BETON <i>classé F</i>		
	MOYENS BENNE:		
<i>Beeher plan E</i>	Nbre VIBREURS: <i>2</i>		MALAXEUR:
	SURFACAGE: REGLE:		TALOCHÉ:
	CURE:		
	DATE: <i>10-12-96</i>		VISA CHEF DE CHANTIER <i>Ame Saagne</i>

PRELEVEMENTS :	ENTREPRISE :	MAÎTRE D'OEUVRE	Nbre: <i>12</i>
----------------	--------------	-----------------	-----------------

RESULTATS :	INFOS	7 JOURS	28 JOURS

POINT CRITIQUE:	OBSERVATIONS :			
OBJET:				
LEVÉE LE:				
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;">CONTRÔLE EXTERNE</td> <td style="width: 50%;">CONTRÔLE INTERNE</td> </tr> <tr> <td> </td> <td><i>[Signature]</i></td> </tr> </table>		CONTRÔLE EXTERNE	CONTRÔLE INTERNE	
CONTRÔLE EXTERNE	CONTRÔLE INTERNE			
	<i>[Signature]</i>			

CONFORMITE D'EXECUTION		
VISA CONTRÔLE EXTERNE	FOUGEROLLE C.S.E	MAÎTRE D'OEUVRE
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	

GROUPEMENT FOUGEROLLE C.S.E

BARRAGE AL-BASSAM DE NIANDOUBA

FICHE D'EXECUTION No:

CHANTIER: *Niandouba*

No :

DEFINITION DE L'OUVRAGE: <i>Couvrage de ventilation - Plot n°1.</i>		
PLAN D'EXECUTION:	COFFRAGE No:	INDICE:
	ACIER No: <i>2A6</i>	INDICE: <i>A</i>
POINT CRITIQUE EVENTUEL:	OUI:	NON:
OBJET:		
RECEPTION FERRAILLAGE:	DATE:	VISA CHEF DE PROJET
<i>Voie Plot 1</i>	<i>10-12-96</i>	<i>[Signature]</i>

COFFRAGES :	ASPECT PAREMENT:	VISA CHEF DE CHANTIER BON A BETONNER
	DEMOULANT:	
	INCORPORATION:	
	DATE:	

BETONNAGE	TYPE DE BETON	
	MOYENS BENNE:	MALAXEUR:
	Nbre VIBREURS:	
	SURFACAGE: REGLE:	TALOCHE:
	CURE:	
	DATE:	VISA CHEF DE CHANTIER

PRELEVEMENTS:	ENTREPRISE:	MAÎTRE D'OEUVRE	Nbre:
	RESULTATS:	INFOS	7 JOURS
			28 JOURS

POINT CRITIQUE:	OBSERVATIONS:			
OBJET:				
LEVE LE:				
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;">CONTRÔLE EXTERNE</td> <td style="width: 50%;">CONTRÔLE INTERNE</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;"><i>[Signature]</i></td> </tr> </table>		CONTRÔLE EXTERNE	CONTRÔLE INTERNE	
CONTRÔLE EXTERNE	CONTRÔLE INTERNE			
	<i>[Signature]</i>			

CONFORMITE D'EXECUTION		
VISA CONTRÔLE EXTERNE	FOUGEROLLE C.S.E	MAÎTRE D'OEUVRE
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>

GROUPEMENT FOUGEROLLE C.S.E

BARRAGE AL-BASSAM DE NIANDOUBA

FICHE D'EXECUTION No:

CHANTIER: *Barrage Niandouba.*

No :

DEFINITION DE L'OUVRAGE: <i>Plan droit de l'usure (coulage) Plat 3</i>		
PLAN D'EXECUTION:	COFFRAGE No: <i>203</i>	INDICE: <i>0</i>
	ACIER No:	INDICE: <i>'</i>
POINT CRITIQUE EVENTUEL:	OUI:	NON:
OBJET:		
RECEPTION FERRAILLAGE:	DATE:	VISA CHEF DE PROJET

COFFRAGES : <i>lisse 1 et 2.</i>	ASPECT PAREMENT:	VISA CHEF DE CHANTIER BON A BETONNER <i>Ame Souma</i>
	DEMOULANT:	
	INCORPORATION:	
	DATE: <i>9-12-96</i>	

BETONNAGE	TYPE DE BETON <i>Solnet</i>	MALAXEUR:
	MOYENS BENNE:	
	Nbre VIBREURS: <i>2</i>	TALOCHE:
	SURFACAGE: REGLE:	
	CURE: <i>eau</i>	
	DATE: <i>9.12.96 à 14H30.</i>	VISA CHEF DE CHANTIER <i>Souma</i>

PRELEVEMENTS:	ENTREPRISE:	MAÎTRE D'OEUVRE	Nbre: <i>12</i>
	RESULTATS:	INFOS	7 JOURS 28 JOURS

POINT CRITIQUE:	OBSERVATIONS:			
OBJET:				
LEVE LE:				
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;">CONTRÔLE EXTERNE</td> <td style="width: 50%;">CONTRÔLE INTERNE</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;"><i>[Signature]</i></td> </tr> </table>		CONTRÔLE EXTERNE	CONTRÔLE INTERNE	<i>[Signature]</i>
CONTRÔLE EXTERNE	CONTRÔLE INTERNE			
<i>[Signature]</i>				

CONFORMITE D'EXECUTION		
VISA CONTRÔLE EXTERNE	FOUGEROLLE C.S.E	MAÎTRE D'OEUVRE
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	

GROUPEMENT FOUGEROLLE/C.S.E.

BARRAGE AL BASSAM DE NIANDOUBA

DEMANDE D'APPROBATION N° EL.....

Date et heure d'activité : 09/12/1996

Item à vérifier : Fouilles pour fondation de la bêche (amont + aval)
des plots D et E

Localisation : Evacuateur de Oues

Date de soumission : 09/12/1996

Demande effectuée par : M. GAYE

Demande reçue par : Date :

Commentaires :

Contrôlée par :

Signature et Date :

Remarques :

Approuvée:

Non Approuvée :

Bertol Gaye

GROUPEMENT FOUGEROLLE/C.S.E.

BARRAGE AL BASSAM DE NIANDOUBA

DEMANDE D'APPROBATION N°..E.L.....

Date et heure d'activité : 09/12/1996

Item à vérifier : Fouilles pour fondation de la bêche (amont+aval)
des plots D et E

Localisation : Evacuateur de Oues

Date de soumission : 09/12/1996

Demande effectuée par : M. GAYE H

Demande reçue par : M.K. Gaye Date : 09/12/96

Commentaires :

Contrôlée par : Youhemadou Kalidou Gaye -

Signature et Date : [Signature] 09/12/96

Remarques :

Approuvée:

Non Approuvée:

GROUPEMENT FOUGEROLLE C.S.E

BARRAGE AL-BASSAM DE NIANDOUBA

FICHE D'EXECUTION No: **E2**

CHANTIER:

No :

DEFINITION DE L'OUVRAGE: Evacuateur de oues - beches du plot D		
PLAN D'EXECUTION:	COFFRAGE No:	INDICE:
	ACIER No:	INDICE:
POINT CRITIQUE EVENTUEL:	OUI:	NON:
OBJET:		
RECEPTION FERRAILLAGE:	DATE: 09/12/1996	VISA CHEF DE PROJET

COFFRAGES :	ASPECT PAREMENT:	VISA CHEF DE CHANTIER BON A BETONNER
	DEMOULANT:	
	INCORPORATION:	
	DATE:	

BETONNAGE	TYPE DE BETON	VISA CHEF DE CHANTIER	
	MOYENS BENNE:		MALAXEUR:
	Nbre VIBREURS:		TALOCHÉ:
	SURFACAGE: REGLE:		
	CURE:		
	DATE:		

PRELEVEMENTS :	ENTREPRISE:	MAÎTRE D'OEUVRE	Nbre:
	RESULTATS:	INFOS	7 JOURS

POINT CRITIQUE:	OBSERVATIONS:			
OBJET:				
LEVÉ LE:				
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;">CONTRÔLE EXTERNE</td> <td style="width: 50%;">CONTRÔLE INTERNE</td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> </tr> </table>		CONTRÔLE EXTERNE	CONTRÔLE INTERNE	
CONTRÔLE EXTERNE	CONTRÔLE INTERNE			

CONFORMITE D'EXECUTION		
VISA CONTRÔLE EXTERNE	FOUGEROLLE C.S.E	MAÎTRE D'OEUVRE
Ngouy Gage		

GROUPEMENT FOUGEROLLE C.S.E

BARRAGE AL-BASSAM DE NIANDOUBA

FICHE D'EXECUTION No :

CHANTIER: *Barrage Niandouba*

No :

DEFINITION DE L'OUVRAGE: <i>Courage Restauration - Plot 3</i>		
PLAN D'EXECUTION:	COFFRAGE No: <i>211</i>	INDICE: <i>B</i>
	ACIER No:	INDICE:
POINT CRITIQUE EVENTUEL:	OUI:	NON:
OBJET:		
RECEPTION FERRAILLAGE:	DATE:	VISA CHEF DE PROJET

COFFRAGES :	ASPECT PAREMENT:	
	DEMOULANT:	
	INCORPORATION:	
	DATE:	VISA CHEF DE CHANTIER BON A BETONNER

BETONNAGE	TYPE DE BETON <i>class 3 Plot n°3</i>	
MOYENS	BENNE:	MALAXEUR:
Nbre VIBREURS: <i>1</i>		
SURFACAGE:	REGLE:	VALOCHÉ:
CURE:		
	DATE: <i>3.12.96</i>	VISA CHEF DE CHANTIER <i>H. M. Seigne</i>

PRELEVEMENTS : ENTREPRISE: *Sami* MAÎTRE D'OEUVRE Nbre:

POINT CRITIQUE: OBJET: LEVE LE:	RESULTATS:		
	INFOS	7 JOURS	28 JOURS
CONTRÔLE EXTERNE	CONTRÔLE INTERNE <i>[Signature]</i>		

CONFORMITE D'EXECUTION		
VISA CONTRÔLE EXTERNE	FOUGEROLLE C.S.E	MAÎTRE D'OEUVRE
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	

GROUPEMENT FOUGEROLLE/C.S.E.

BARRAGE AL BASSAM DE NIANDOUBA

DEMANDE D'APPROBATION N°...34...

Date et heure d'activité : 29/11/1996

Item à vérifier : Bétonnage 3^{ème} levée plot n°9
du niveau 26.50 au niveau 28.00

Localisation : Mur de brique de l'évacuateur de oue

Date de soumission : 28/11/1996

Demande effectuée par : M. GAYE

Demande reçue par : M. K. GAYE // E. Gaye Date : 28/11/96

Commentaires :

Contrôlée par : M. Mohamedou Kalidou Gaye

Signature et Date : // E. Gaye 28/11/96

Remarques :

Approuvée : X

Non Approuvée :

GROUPEMENT FOUGEROLLE/C.S.E.

BARRAGE AL BASSAM DE NIANDOUBA

DEMANDE D'APPROBATION N° 32

Date et heure d'activité : 28/11/1996

Item à vérifier : Coffrage 3^{ème} et 4^{ème} levée plot N° 2
du niveau 26.50 au niveau 29.50

Localisation : Mur de droite de l'évacuateur

Date de soumission : 28/11/1996

Demande effectuée par : M. GAYE

Demande reçue par : M. K. Gaye M. Gaye Date : 28/11/96

Commentaires :

Contrôlée par : M. K. Gaye

Signature et Date : M. Gaye 28/11/96

Remarques :

Approuvée: Non Approuvée:

GROUPEMENT FOUGEROLLE/C.S.E.

BARRAGE AL BASSAM DE NIANDOUBA

DEMANDE D'APPROBATION N° 35.....

Date et heure d'activité : 28/11/1996

Item à vérifier : Béton de blocage plot n°2

Localisation : Ouvrage de restitution

Date de soumission : 28/11/1996

Demande effectuée par : M. GAYE

Demande reçue par : M. K. Gaye M. K. Gaye Date : 28/11/96

Commentaires :

Contrôlée par : M. K. Gaye

Signature et Date :

M. K. Gaye 28/11/96

Remarques :

Approuvée:

Non Approuvée :

GROUPEMENT FOUGEROLLE/C.S.E.

BARRAGE AL BASSAM DE NIANDOUBA

DEMANDE D'APPROBATION N° 30.....

Date et heure d'activité : 23/11/1996

Item à vérifier : Coffrage + bétonnage

Localisation : Mur de droite de l'évacuateur :
levée n° 2 plot n° 2

Date de soumission : 22/11/1996

Demande effectuée par : M. GAYE

Demande reçue par : Bertrand Boyer Date : 22-11-96

Commentaires :
.....
.....
.....
.....

Contrôlée par : B. Boyer

Signature et Date : Bertrand Boyer 22-11-96

Remarques :
.....
.....
.....
.....

Approuvée : Non Approuvée :

GROUPEMENT FOUGEROLLE/C.S.E.
BARRAGE AL BASSAM DE NIANDOUBA

DEMANDE D'APPROBATION N° 29.....

Date et heure d'activité 22/11/1996.....

Item à vérifier : Coffrage + bétonnage.....

Localisation : Mur de droite de l'évacuateur :
levée n°1 plot 2.....

Date de soumission : 22/11/1996.....

Demande effectuée par : M. GAYE 

Demande reçue par : Bertrand Boyer..... Date : 22-11-96

Commentaires :

Contrôlée par : B. Boyer

Signature et Date : Bertrand Boyer 22-11-96

Remarques : VÉRIF. DU COFFRAGE LE 20-11-96; LE COFFRAGE
A ÉTÉ REPLACÉ (CORRIGÉ) LE 21-11-96. Voir croquis.

Approuvée:

Non Approuvée :

GROUPEMENT FOUGEROLLE/C.S.E.

BARRAGE AL BASSAM DE NIANDOUBA

DEMANDE D'APPROBATION N°...14....

Date et heure d'activité : 14 / 11 / 1996

Item à vérifier : Béton de blocage aval

Localisation : Mur droit du déversoir

Date de soumission : 14 / 11 / 1996

Demande effectuée par : M. GAYE

Demande reçue par MR So Date : 13. 12. 96

Commentaires :

Contrôlée par : So

Signature et Date : 15. 11. 96

Remarques :

Approuvée : [Signature]
TEESULT
MISSION DE CONTRÔLE
Teesult International Limitede
01200 1 412 10 1

Non Approuvée :

GROUPEMENT FOUGEROLLE/C.S.E.

BARRAGE AL BASSAM DE NIANDOUBA

DEMANDE D'APPROBATION N° 13

Date et heure d'activité : 12/11/1996

Item à vérifier : Béton de propreté **OK**

Localisation : Mur gauche du déversoir

Date de soumission : 11/11/1996

Demande effectuée par : M. GAYE *[Signature]*

Demande reçue par : Lo *[Signature]* Date : 11.11.96.

Commentaires :
.....
.....
.....
.....

Contrôlée par : Lo

Signature et Date : 12.11.96

Remarques :
.....
.....
.....
.....

TECSULT
MIS EN CONTRÔLE
12.11.96
Tecsult International Limited

Non Approuvée :

GROUPEMENT FOUGEROLLE/C.S.E.

BARRAGE AL BASSAM DE NIANDOUBA

DEMANDE D'APPROBATION N°...12...

Date et heure d'activité : 11/11/1996

Item à vérifier : Feuilles pour fondation OK

Localisation : Mur gauche du Déversoir

Date de soumission : 11/11/1996

Demande effectuée par : M. GAYE HJ

Demande reçue par : Hc Lo Date : 11.11.96

Commentaires :

Contrôlée par : Lo

Signature et Date : 12.11.96

Remarques :

Approuvée
TECSULT
MISSION DE CONTRÔLE
Tecsult International Limited
012015-201996

Non Approuvée :

GROUPEMENT FOUGEROLLE/C.S.E.

BARRAGE AL BASSAM DE NIANDOUBA

DEMANDE D'APPROBATION N° 11.....

Date et heure d'activité : 11/11/1996

Item à vérifier : Béton de blocage amont

Localisation : Mur droit du Déversoir

Date de soumission : 11/11/1996

Demande effectuée par : M. GAYE *[Signature]*

Demande reçue par : *[Signature]* Date : 11.11.96

Commentaires :
.....
.....
.....
.....

Contrôlée par : *[Signature]*

Signature et Date : 12.11.96 *[Signature]*

Remarques :
.....
.....
.....
.....

Approuvée: 12.11.96

Non Approuvée :



GROUPEMENT FOUGEROLLE/C.S.E.

BARRAGE AL BASSAM DE NIANDOUBA

DEMANDE D'APPROBATION N° 10

Date et heure d'activité : 8/11/1996

Item à vérifier : Béton de propreté

Localisation : Mur droit du Déversoir

Date de soumission : 8/11/1996

Demande effectuée par : M. GAYE

Demande reçue par : *Lo* Date : 12.11.96

Commentaires :

Contrôlée par : *Lo* Signature et Date : 9.11.96

Remarques :

Approuvée : 9.11.96
 MISSION DE CONTRÔLE
 Tecsuit International Limitée
 experts-conseils

Non Approuvée :

GROUPEMENT FOUGEROLLE C.S.E

BARRAGE AL-BASSAM DE NIANDOUBA

FICHE D'EXECUTION No: 002

CHANTIER: Barrage Niandouba No: 1252/11601

DEFINITION DE L'OUVRAGE: <i>Plan de dalle, Evacuation</i>		
PLAN D'EXECUTION:	COFFRAGE No: <i>203</i>	INDICE: <i>0</i>
	ACIER No:	INDICE: <i>'</i>
POINT CRITIQUE EVENTUEL:	OUI:	NON:
OBJET:		
RECEPTION FERRAILLAGE:	DATE:	VISA CHEF DE PROJET

COFFRAGES:	ASPECT PAREMENT:	VISA CHEF DE CHANTIER BON A BETONNER <i>Niandouba N'Diaye</i>
	DEMOULANT:	
	INCORPORATION:	
	DATE:	


BETONNAGE	TYPE DE BETON <i>classe B 3 (Béton papier)</i>	VISA CHEF DE CHANTIER
	MOYENS <i>BEANNE:</i>	
	Nbre <i>VIBREURS:</i>	
	SURFACAGE: <i>REGLE:</i>	VACUUM:
	CURE:	
	DATE: <i>06. novembre 1996</i>	

PRELEVEMENTS:	ENTREPRISE:	MAÎTRE D'OEUVRE	Nbre:
	RESULTATS:		
		INFOS	7 JOURS
			28 JOURS

POINT CRITIQUE:	<i>R.A.S</i>	OBSERVATIONS:
OBJET:		
LEVE LE:		

CONTRÔLE EXTERNE	CONTRÔLE INTERNE
<i>[Signature]</i>	

CONFORMITE D'EXECUTION		
VISA CONTRÔLE EXTERNE	FOUGEROLLE C.S.E	MAÎTRE D'OEUVRE
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	



FEUILLES DE RÉCEPTION

TERRASSEMENTS

FEUILLES DE RÉCEPTION - TERRASSEMENTS

GROUPEMENT FOUGEROLLE/C.S.E.

BARRAGE AL BASSAM DE NIANDOUBA

DEMANDE D'APPROBATION N°: Jiv. 2.1.

Date et heure d'activité : le 27/11/97

Item à vérifier : Enrochement, caniveau, au pied du drain

Localisation : Jiv. PK 0+695, au PK 0+740,30

Date de soumission : le 27/11/97

Demande effectuée par : Aboubacar Ch. Guéye

Demande reçue par : H. Gnyel Date : 27/11/97

Commentaires : Contrôle effectué pendant le levé topographique de la zone. Les travaux sont terminés.

Contrôlée par : H. Gnyel

Signature et Date : H. Gnyel 27/11/97

Remarques :

Approuvée:

Non Approuvée:

GROUPEMENT FOUGEROLLE/C.S.E.

BARRAGE AL BASSAM DE NIANDOUBA

DEMANDE D'APPROBATION N° AN. 90.

Date et heure d'activité : Le 20/11/97

Item à vérifier : Le blai complémentaire canal de fuite de l'ouvrage de restitution

Localisation :

du Pk 0+20.9 à la rivière.

Date de soumission :

Le 20/11/97

Demande effectuée par :

Aboubacar ch. Guye

Demande reçue par :

H. K. Guye

Date :

20/11/97

Commentaires :

Contrôlée par :

B BOYER

Signature et Date :

Boyer

22/11/97

Remarques :

LEVÉ TOPO. FAIT JUSQU'À 361 M. DE L'AXE DU BARRAGE.

Approuvée :

Non Approuvée :

GROUPEMENT FOUGEROLLE/C.S.E.

BARRAGE AL BASSAM DE NIANDOUBA

DEMANDE D'APPROBATION N° ANU.89

Date et heure d'activité : Le 14/11/97

Item à vérifier : Dressage talus gauche de la rampe

..... piéte digue

.....

.....

Localisation : PK 0+625 au PK 0+670

.....

.....

Date de soumission : Le 14/11/97

Demande effectuée par : Aboubacar Ch. Gueye

Demande reçue par : G. K. Gye Date : 14/11/97

Commentaires :

.....

.....

.....

.....

Contrôlée par : B. Boyer

Signature et Date : Bretzel Boyer 15/11/97

Remarques :

.....

.....

.....

Approuvée:

Non Approuvée:

GROUPEMENT FOUGEROLLE/C.S.E.
BARRAGE AL BASSAM DE NIANDOUBA

DEMANDE D'APPROBATION N° *11.11.88*

Date et heure d'activité : *Le 13/11/97*

Item à vérifier : *Seiba complémentaire canal de fuite de Durage*
de restitution

Localisation : *PK 0+0.6.2 au PK 0+209*

(Casci barrage vers canal de fuite)

Date de soumission : *Le 13/11/97*

Demande effectuée par : *Aboubakar Ch. Gouye*

Demande reçue par : *P. Gouye* Date : *13/11/97*

Commentaires :

Contrôlée par : *B. BOYER*

Signature et Date : *Bernard Boyer*

Remarques :

Approuvée :

Non Approuvée :

GROUPEMENT FOUGEROLLE/C.S.E.

BARRAGE AL BASSAM DE NIANDOUBA

DEMANDE D'APPROBATION N° div 86

Date et heure d'activité : le 3/11/97

Item à vérifier : Dressage /alus droite de la piste à la digue.

Localisation : Zampe digue.

Date de soumission : le 3/11/97

Demande effectuée par : Aboulsan Ch. djouye

Demande reçue par : B. BOYER Date : 03-11-97

Commentaires :

Contrôlée par : B. BOYER
Signature et Date : B. Boyer 07-11-97

Remarques :

Approuvée:

Non Approuvée:

GROUPEMENT FOUGEROLLE/C.S.E.

BARRAGE AL BASSAM DE NIANDOUBA

DEMANDE D'APPROBATION N° AV 85

Date et heure d'activité : le 2/11/97

Item à vérifier : Excavation bassin de dissipation, emprise 10 m
au canal de fuite.

Localisation : Deversoir.

Date de soumission : le 2/11/97

Demande effectuée par : Aboubakar Ch. Gueye

Demande reçue par : B. BOYER Date :

Commentaires :
.....
.....
.....
.....

Contrôlée par : B. BOYER

Signature et Date : Bertul Boyer 13-11-97

Remarques :
.....
.....
.....

Approuvée:

Non Approuvée:

GROUPEMENT FOUGEROLLE/C.S.E.

BARRAGE AL BASSAM DE NIANDOUBA

DEMANDE D'APPROBATION N° *fin 86*

Date et heure d'activité : *le 3/11/97*

Item à vérifier : *Dressage / a luis droite de la porte a la digue*

Localisation : *Zampe digue*

Date de soumission : *le 3/11/97*

Demande effectuée par : *Abouba Ch. Djouye*

Demande reçue par : *B. BOYER* Date : *07-11-97*

Commentaires :

Contrôlée par : *B. BOYER*

Signature et Date : *B. Boyer* *07-11-97*

Remarques :

Approuvée :

Non Approuvée :

GROUPEMENT FOUGEROLLE/C.S.E.

BARRAGE AL BASSAM DE NIANDOUBA

DEMANDE D'APPROBATION N° 41184

Date et heure d'activité : Le 24/10/17

Item à vérifier : Roche de forçage

Localisation : sur PK 0+648,08

Date de soumission : le 24/10/17

Demande effectuée par : Aboubakar Ch. Diagne

Demande reçue par : Date :

Commentaires :
.....
.....
.....

Contrôlée par :

Signature et Date :

Remarques : Approuvé au 0+648

Approuvée: X

Non Approuvée:

GROUPEMENT FOUGEROLLE/C.S.E.

BARRAGE AL BASSAM DE NIANDOUBA

DEMANDE D'APPROBATION N° *Jiv. 83*

Date et heure d'activité : *Le 23/10/97*

Item à vérifier : *Drenage de talus aval*

Localisation : *PK 0+625 au PK 0+670*

Date de soumission : *Le 23/10/97*

Demande effectuée par : *Abou Bakar, ch. charge*

Demande reçue par : *Aboulaye Diop* Date : *23/10/97*

Commentaires :
*Receptionné de 625 au 0+670
Reprise devant être faite 648,08
(poche forage)*


Contrôlée par :

Signature et Date : *Aboulaye Diop 23-10-97*

Remarques :
*Poche de forage à reprendre
au PK 0+648,08*

Approuvée: *X*

Non Approuvée:



GROUPEMENT FOUGEROLLE/C.S.E.

BARRAGE AL BASSAM DE NIANDOUBA

DEMANDE D'APPROBATION N° *Jir.82-*

Date et heure d'activité : *le 8/10/97*

Item à vérifier : *Drainage talus aval*

Localisation : *du Pk 0+700 au Pk 0+750*

Date de soumission : *le 8/10/97*

Demande effectuée par : *Abouba car Ch. Guéye*

Demande reçue par : *Abdoulaye Diop* Date : *08/10/97*

Commentaires :

Contrôlée par : *Abdoulaye Diop*
 Signature et Date : *Abdoulaye Diop 09-10-97*

Remarques : *Approuvé après 2 reprises sur 15 m*

Approuvée:

Non Approuvée:

Abdoulaye Diop

GROUPEMENT FOUGEROLLE/C.S.E.

BARRAGE AL BASSAM DE NIANDOUBA

DEMANDE D'APPROBATION N° *dir*.....

Date et heure d'activité : *le 3/10/97*

Item à vérifier : *Drainage talus aval*

Localisation : *du Pk 0750 au Pk 0800*

Date de soumission : *le 3/10/97*

Demande effectuée par : *Abouloca, el Guize*

Demande reçue par : *M. K. Goye* Date : *04/10/97*

Commentaires :
.....
.....
.....

Contrôlée par : *M. K. Goye*

Signature et Date : *M. K. Goye* *04/10/97*

Remarques :
.....
.....

Approuvée: *X*

Non Approuvée:

GROUPEMENT FOUGEROLLE/C.S.E.

BARRAGE AL BASSAM DE NIANDOUBA

DEMANDE D'APPROBATION N° 414/80

Date et heure d'activité : 3/10/97

Item à vérifier : Tranchée du Pied de drain à la rivière

..... (Exécuté, comme prévu, suivant directives de Tec.sult N° TEC.007
du 14/07/97), sous le contrôle de Mr Goye, ingénieur, représentant
TEC.sult, présent sur les lieux lors des travaux

Localisation : PK 1250, au Prolongement de la rivière
..... distance 39m.

Date de soumission : 3/10/97

Demande effectuée par Aboubacar Ch. Guye

Demande reçue par : M. K. Goye Date : 03/10/97

Commentaires :
.....
.....
.....

Contrôlée par : M. K. Goye

Signature et Date : [Signature] 03/10/97

Remarques :
.....
.....

Approuvée: X

Non Approuvée :

GROUPEMENT FOUGEROLLE/C.S.E.

BARRAGE AL BASSAM DE NIANDOUBA

DEMANDE D'APPROBATION N° *Juv. 7.9*

Date et heure d'activité : *Le 31/10/97*

Item à vérifier : *Drainage talus ouest*

Localisation : *du Pk 14.12 au Pk 14.60*

Date de soumission : *Le 31/10/97*

Demande effectuée par : *Aboubakar Ch. Guye*

Demande reçue par : *N. K. Guye* Date : *08/10/97*

Commentaires :

Contrôlée par : *N. K. Guye*

Signature et Date : *N. K. Guye* *08/10/97*

Remarques :

Approuvée: *XX*

Non Approuvée :

GROUPEMENT FOUGEROLLE/C.S.E.

BARRAGE AL BASSAM DE NIANDOUBA

DEMANDE D'APPROBATION N° *11078*

Date et heure d'activité : *Le 30/09/97*

Item à vérifier : *Drainage du talus aval*

Localisation : *du Pk 1+150 au Pk 1+200*

Date de soumission : *Le 30/09/97*

Demande effectuée par : *Aboubacar, Ch. Oueye*

Demande reçue par : *M. K. Gaye* Date : *01/10/97*

Commentaires :

Contrôlée par : *M. K. Gaye*

Signature et Date : *[Signature]* *01/10/97*

Remarques :

Approuvée: *XX*

Non Approuvée :

GROUPEMENT FOUGEROLLE/C.S.E.

BARRAGE AL BASSAM DE NIANDOUBA

DEMANDE D'APPROBATION N° *Av. 77...*

Date et heure d'activité : *le 25/09/97*

Item à vérifier : *Dressage du talus aval du*

Localisation : *du Pk 1.265 au Pk 1.412*

Date de soumission : *le 25/09/97*

Demande effectuée par : *Aboubacar Ch. Guèye*

Demande reçue par : *M. K. Guèye* Date : *25/09/97*

Commentaires :
.....
.....
.....

Contrôlée par : *Mouhamadou K. Guèye*

Signature et Date : *M. K. Guèye* *25/09/97*

Remarques :
.....
.....

Approuvée: ... *XX*

Non Approuvée :

GROUPEMENT FOUGEROLLE/C.S.E.

BARRAGE AL BASSAM DE NIANDOUBA

DEMANDE D'APPROBATION N° Jiv.76

Date et heure d'activité : le 22/09/97

Item à vérifier : Poste Natelas remaniement et remplissage

Localisation : Z=(33,50) du P.K. 0+250 au P.K. 0+475

Z=(31,00) du P.K. 0+576 au P.K. 1+460

Date de soumission : le 22/09/97

Demande effectuée par : Aboubacar Cheikh Guye

Demande reçue par : M. K. Guye Date : 22/09/97

Commentaires :
.....
.....
.....
.....

Contrôlée par :

Signature et Date :

Remarques :
.....
.....
.....

Approuvée :

Non Approuvée :

GROUPEMENT FOUGEROLLE/C.S.E.

BARRAGE AL BASSAM DE NIANDOUBA

DEMANDE D'APPROBATION N° Jiv. 75

Date et heure d'activité : Le 19/09/97

Item à vérifier : Drainage talus aval

Localisation : PK 1200 au PK 1266

Date de soumission : Le 19/09/97

Demande effectuée par Abdoucar Ch. Guéye

Demande reçue par M. K. Goye Date : 18/09/97


Commentaires :

Contrôlée par : Abdoulaye Diop
Signature et Date : 19-09-97

Remarques : approuvé après rectificatif

Approuvée: X

Non Approuvée:



GROUPEMENT FOUGEROLLE/C.S.E.

BARRAGE AL BASSAM DE NIANDOUBA

DEMANDE D'APPROBATION N° 41074

Date et heure d'activité : le 19/09/97

Item à vérifier : Dessage talus aval

Localisation : PK 1125 au 1150

Date de soumission : le 19/09/97

Demande effectuée par Aboubaour ch. Gueye

Demande reçue par : N. K. Gueye Date : 19/09/97

Commentaires :
.....
.....
.....

Contrôlée par : N. K. Gueye

Signature et Date : N. K. Gueye 19/09/97

Remarques :
.....
.....

Approuvée: XX

Non Approuvée:

GROUPEMENT FOUGEROLLE/C.S.E.

BARRAGE AL BASSAM DE NIANDOUBA

DEMANDE D'APPROBATION N° *fiu.73*

Date et heure d'activité : *17/09/97*

Item à vérifier : *Enrochement cariveau au pied du barrage*

Localisation : *du PK 1+125 au PK 1+325*

Date de soumission : *le 17/09/97*

Demande effectuée par : *Aboubacar Ch. Guye*

Demande reçue par : *M. K. Guye* Date : *18/09/97*

Commentaires :
.....
.....
.....
.....

Contrôlée par : *M. K. Guye*

Signature et Date : *M. K. Guye* *18/09/97*

Remarques :
.....
.....
.....

Approuvée:

Non Approuvée:

GROUPEMENT FOUGEROLLE/C.S.E.

BARRAGE AL BASSAM DE NIANDOUBA

DEMANDE D'APPROBATION N° 72.....

Date et heure d'activité : le 16/09/97

Item à vérifier : Caniveau au pied du drain

Localisation : du P.K. 1460 au P.K. 1+325 et
..... du P.K. 0+850 au P.K. 0+775

Date de soumission : le 16/09/97

Demande effectuée par : Aboubacar Cheikh Guéye

Demande reçue par : N. K. Gaye Date : 16/09/97

Commentaires :
.....
.....
.....
.....

Contrôlée par : N. K. Gaye

Signature et Date : [Signature] 16/09/97

Remarques :
.....
.....
.....

Approuvée: ...XX...

Non Approuvée:

GROUPEMENT FOUGEROLLE/C.S.E.

BARRAGE AL BASSAM DE NIANDOUBA

DEMANDE D'APPROBATION N° Jiu. 71.

Date et heure d'activité : le 16/09/97

Item à vérifier : Drainage talus aval

Localisation : du PK 0+800 au PK 0+850

Date de soumission : le 16/09/97

Demande effectuée par : Aboubacar Ch. Guye

Demande reçue par : M. K. Guye Date : 16/09/97

Commentaires :
Calculs effectués suivant les levés topographiques
de l'entreprise

Contrôlée par : M. K. Guye

Signature et Date : M. K. Guye 16/09/97

Remarques :
La protection en aval en matelas Beng non
encore faite. A tenir en compte pour la mise en
place de la terre végétale

Approuvée: XX

Non Approuvée:

GROUPEMENT FOUGEROLLE/C.S.E.

BARRAGE AL BASSAM DE NIANDOUBA

DEMANDE D'APPROBATION N° *Aiv. 70*

Date et heure d'activité : le *13/03/97*

Item à vérifier : *Surage talus aval*

Localisation : *du Pk 1+050 au Pk 1+125*

Date de soumission : le *13/03/97*

Demande effectuée par *Aboubacar Ch. Guye*

Demande reçue par : *M. K. Guye* Date : *13/03/97*

Commentaires :
.....
.....
.....
.....

Contrôlée par : *M. K. Guye*

Signature et Date : *M. K. Guye* *15/03/97*

Remarques :
.....
.....
.....

Approuvée: *XX*

Non Approuvée :

GROUPEMENT FOUGEROLLE/C.S.E.

BARRAGE AL BASSAM DE NIANDOUBA

DEMANDE D'APPROBATION N° *liv 70*

Date et heure d'activité : *le 13/09/97*

Item à vérifier : *Dressage talus aval*

Localisation : *du PK 1+050 au PK 1+100*

Date de soumission : *le 13/09/97*

Demande effectuée par : *Abouba cou Ch Gueye*

Demande reçue par : *M. K. Gaye* Date : *13/09/97*

Commentaires :

Contrôlée par : *M. K. Gaye*

Signature et Date : *M. K. Gaye* *13/09/97*

Remarques :

Approuvée: *XX*

Non Approuvée

GROUPEMENT FOUGEROLLE/C.S.E.

BARRAGE AL BASSAM DE NIANDOUBA

DEMANDE D'APPROBATION N° *Aiv...69*

Date et heure d'activité : *Le 11/09/97*

Item à vérifier : *Excavation, caniveau, au pied du drain*

Localisation : *PK 0+775, au PK 0+850*

Date de soumission : *Le 11/09/97*

Demande effectuée par : *Aboubacar Ch. Guéye*

Demande reçue par : *H. K. Gnyé* Date : *11/09/97*

Commentaires :

Contrôlée par : *M. K. Gnyé*

Signature et Date : *M. K. Gnyé 11/09/97*

Remarques : *pente bonnd OK*

Approuvée: *XX*

Non Approuvée:

GROUPEMENT FOUGEROLLE/C.S.E.

BARRAGE AL BASSAM DE NIANDOUBA

DEMANDE D'APPROBATION N° *liv. 68.*

Date et heure d'activité : *le 8/09/97*

Item à vérifier : *Dressage falus aval*

Localisation : *du PK 0+950 au PK 1+050*

Date de soumission : *le 8/09/97*

Demande effectuée par : *Aboukacar, ch. d'usage*

Demande reçue par : *P. K. Gaye* Date : *28/09/97*

Commentaires :

Contrôlée par : *P. K. Gaye*

Signature et Date : *P. K. Gaye 28/09/97*

Remarques : *depr. de nivellement de la zone*

Approuvée: OK

Non Approuvée:

GROUPEMENT FOUGEROLLE/C.S.E.

BARRAGE AL BASSAM DE NIANDOUBA

DEMANDE D'APPROBATION N° *MU 66*

Date et heure d'activité : *Le 4/09/97*

Item à vérifier : *Drainage de falus, aval*

Localisation : *PK 0+950 au PK 0+975*

Date de soumission : *Le 4/09/97*

Demande effectuée par : *Aboubacar Ch. Gueye*

Demande reçue par : *Abdoulaye Diop* Date : *04-09-97*

Commentaires :

Contrôlée par : *Abdoulaye Diop*

Signature et Date : *Abdiop 04-09-97*

Remarques : *Contrôle effectué à la corde et approuvé*

Approuvée :

Non Approuvée :

Abdiop

GROUPEMENT FOUGEROLLE/C.S.E.

BARRAGE AL BASSAM DE NIANDOUBA

DEMANDE D'APPROBATION N° 11.1.65

Date et heure d'activité : le 2/09/97.....

Item à vérifier : Dressage de talus aval.....

Localisation : du PK 0+925 au 0+950.....

Date de soumission : le 2/09/97.....

Demande effectuée par : Aboubacar Ch. Guéye.....

Demande reçue par : Abdoulaye Mof Date : 02/09/97

Commentaires :
.....
.....
.....
.....

Contrôlée par : Abdoulaye Mof.....

Signature et Date : [Signature] 02-09-97.....

Remarques :
.....
.....
.....

Approuvée:

Non Approuvée:

[Signature]

GROUPEMENT FOUGEROLLE/C.S.E.

BARRAGE AL BASSAM DE NIANDOUBA

DEMANDE D'APPROBATION N° J.V. 64...

Date et heure d'activité : 30/08/97

Item à vérifier : Drusage talus aval

Localisation : PK 0+850 au PK 0+925

Date de soumission : 30/08/97
Demande effectuée par : Aboubacar Ch. Guéye

Demande reçue par : I. K. Gaye Date : 31/08/97

Commentaires : Certificat délivré à l'entrepreneur
10 en trisition

Contrôlée par : I. K. Gaye

Signature et Date : 31/08/97

Remarques :

Approuvée: XX
I. K. Gaye

Non Approuvée :

GROUPEMENT FOUGEROLLE/C.S.E.

BARRAGE AL BASSAM DE NIANDOUBA

DEMANDE D'APPROBATION N° Div. 63.

Date et heure d'activité : 29/08/97

Item à vérifier : L'emplissage gabions sur fossin de dissipation

Localisation :

..... Paliers gauche :

..... (23,80), (22,80), (21,80), (20,80), (19,80)

Date de soumission :

..... 29/08/97

Demande effectuée par :

..... Aboubacar Ch. Guéye

Demande reçue par :

..... 29/08/97 Il. K. Gaye

Date : 29/08/97

Commentaires :

..... Calculs montrant la validité de

..... la ventée.

Contrôlée par :

..... Il. K. Gaye

Signature et Date :

..... Il. K. Gaye

..... 29/08/97

Remarques :

.....
.....
.....
.....

Approuvée: XX

Non Approuvée :

GROUPEMENT FOUGEROLLE/C.S.E.

BARRAGE AL BASSAM DE NIANDOUBA

DEMANDE D'APPROBATION N° Div...62.

Date et heure d'activité : 29/08/97

Item à vérifier : Remplissage gabions sur deversoir

Localisation : Paliers : (27,80), (28,80), (26,80), (25,80)

Date de soumission : 29/08/97

Demande effectuée par : Aboubakar Ch. Guéji

Demande reçue par : M. K. Gaye Date : 29/08/97

Commentaires : Calculs pendant la levée topo Id
1.2 entreprise

Contrôlée par : M. K. Gaye

Signature et Date : M. K. Gaye 29/08/97

Remarques :

Approuvée : XX

Not Approuvée

GROUPEMENT FOUGEROLLE/C.S.E.

BARRAGE AL BASSAM DE NIANDOUBA


DEMANDE D'APPROBATION N° D.I.V. 61

Date et heure d'activité : 27/08/97

Item à vérifier : Dressage de talus, orment

Localisation : PK 1100 au PK 1032

Date de soumission : 27/08/97

Demande effectuée par : Abou bacar Ch. Guèye 

Demande reçue par : Abdoulaye Diop Date : 27/08/97

Commentaires :

Contrôlée par : Abdoulaye Diop et M. K. Gaye

Signature et Date : 

Remarques : Contrôle effectué à la corde

Approuvée:

Non Approuvée:



GROUPEMENT FOUGEROLLE/C.S.E.

BARRAGE AL BASSAM DE NIANDOUBA

DEMANDE D'APPROBATION N° J.I.V. 60

Date et heure d'activité : 26/08/97

Item à vérifier : Dressage talus amont

Localisation : du PK 1100 au PK 1400 et du PK 1025 au PK 1032

Date de soumission : 26/08/97

Demande effectuée par : Aboubacar ch. Guéye

Demande reçue par : Abdoulaye Diop Date : 27-08-97

Commentaires :

Contrôlée par : Abdoulaye Diop

Signature et Date : [Signature] 27-08-97

Remarques : Contrôle fait à la corde.
Veuillez retirer la bande d'argile
reposant sur la limite des matelas avant
d'étaler le bidim pour le raccordement
entre les PK 1+100 au PK 1+400

Approuvée: X

Non Approuvée :

[Signature]

GROUPEMENT FOUGEROLLE/C.S.E.

BARRAGE AL BASSAM DE NIANDOUBA

DEMANDE D'APPROBATION N° Div. 59

Date et heure d'activité : 14/8/97

Item à vérifier : Dressage Talus Amont

Localisation : Pk 0+975 au Pk 1+025

Date de soumission : 14/8/97

Demande effectuée par : Abou Guèye

Demande reçue par : Abdoulaye Diop

Date : 14/08/97

Commentaires :

Contrôlée par : Abdoulaye Diop

Signature et Date : Diop 14-08-97

Remarques :

Contrôle fait à la corde et suivant les relevés de calcul de Abou Guèye

Approuvée:

Non Approuvée:

Diop

GROUPEMENT FOUGEROLLE/C.S.E.

BARRAGE AL BASSAM DE NIANDOUBA

DEMANDE D'APPROBATION N° Jiv. 58.

Date et heure d'activité : 13/08/97 10h.

Item à vérifier : Jusage Talus, amont

Localisation : PK. 0.925 au 0.975

Date de soumission : 13/08/97

Demande effectuée par : MR Aboulcar Ch. Gueye 

Demande reçue par : MR Abdoulaye Siop. Date : 13/08/97

Commentaires :

Contrôlée par : Abdoulaye Siop

Signature et Date : 13-08-97 ~~Aboulcar~~

Remarques : Contrôle fait à la corde et suivant les relevés de Abou Gueye (topographe).

Approuvée: X

Non Approuvée :



GROUPEMENT FOUGEROLLE/C.S.E.

BARRAGE AL BASSAM DE NIANDOUBA

DEMANDE D'APPROBATION N° 01/57

Date et heure d'activité : 11/8/97 à 8H

Item à vérifier : Arrosage Talus Amont

Localisation : PK 850 au PK 925

Date de soumission : 11/8/97

Demande effectuée par : met ~~thel~~

Demande reçue par : Abdoulaye Diop Date : 11-08-97

Commentaires :

Contrôlée par : Abdoulaye Diop

Signature et Date : ~~AS Diop~~ / 11-08-97

Remarques : Contrôle fait à la corde et suivant les calculs de relevés avec ABou Guèye.

Approuvée: X

Non Approuvée

AS Diop

GROUPEMENT FOUGEROLLE/C.S.E.

BARRAGE AL BASSAM DE NIANDOUBA

DEMANDE D'APPROBATION N° Div 56

Date et heure d'activité : 4/8/97 15h

Item à vérifier : Reception camion Arain

Localisation : Pk 1050 au Pk 1125

Date de soumission : notet Attaker

Demande effectuée par : 4/8/97

Demande reçue par : Date :

Commentaires :

Contrôlée par : Abdoulaye Diop

Signature et Date : ~~Diop~~ 4/08/97

Remarques :

Approuvée : X

Diop

Non Approuvée :

GROUPEMENT FOUGEROLLE/C.S.E.

BARRAGE AL BASSAM DE NIANDOUBA

DEMANDE D'APPROBATION N° 014.55

Date et heure d'activité : 4/8/97 15h

Item à vérifier : Dressage Talus Amont

Localisation : PK 0+800 au PK 0+850


Date de soumission : 4/8/97

Demande effectuée par : le Mr let 

Demande reçue par : Date :

Commentaires :
.....
.....
.....
.....

Contrôlée par : Abdoulaye Diop

Signature et Date :  06-08-97

Remarques : Contrôle fait à la corde
.....
.....

Approuvée:

Non Approuvée :



GROUPEMENT FOUGEROLLE/C.S.E.

BARRAGE AL BASSAM DE NIANDOUBA

DEMANDE D'APPROBATION N° 01V54

Date et heure d'activité : 29/07/97 à 15H

Item à vérifier : Dressage Talus Amont

Localisation : PK 0,775 au PK 0,800

Date de soumission : 28/7/97

Demande effectuée par : mlet P. Hf

Demande reçue par : Abdoulaye Diop Date : 28-07-97

Commentaires :

Contrôlée par : Abdoulaye Diop

Signature et Date : ~~Diop~~ 29/07/97 15h00

Remarques : Contrôle fait à la corde

Approuvée: X

Non Approuvée :

~~Diop~~

GROUPEMENT FOUGEROLLE/C.S.E.

BARRAGE AL BASSAM DE NIANDOUBA

DEMANDE D'APPROBATION N°

Div 13

Date et heure d'activité : 28/7/97 à 8h

Item à vérifier : Dressage Talus Amont devant ouvrage de restitution

Localisation :

Date de soumission : 25/7/97

Demande effectuée par : M. Let

[Signature]

Demande reçue par : B. Boyer

Date : 25-07-97

Commentaires :

Contrôlée par : B. Boyer

Signature et Date : Bertrand Boyer

26-07-97 9:00

Remarques : VOIR NOTE ANNEXÉE.

Approuvée: X

B.B.

Non Approuvée :

GROUPEMENT FOUGEROLLE/C.S.E.

BARRAGE AL BASSAM DE NIANDOUBA

DEMANDE D'APPROBATION N° Div 52

Date et heure d'activité : 25-7-97 at 09h

Item à vérifier : ouvrage de restitution
Enrochement Amont

Localisation : Amont


Date de soumission : 26/07/97

Demande effectuée par : Amlet 

Demande reçue par : N. K. Gaye Date : 26/07/97

Commentaires :
.....
.....
.....
.....

Contrôlée par : B. BOYER

Signature et Date :  26-07-97 9:00

Remarques : LOCALISATION ET ELEVATIONS CORRECTES
.....
.....

Approuvée: B.B.

Non Approuvée:

GROUPEMENT FOUGEROLLE/C.S.E.

BARRAGE AL BASSAM DE NIANDOUBA

DEMANDE D'APPROBATION N° DIV 49

Date et heure d'activité : 24/07/97 à 16h

Item à vérifier : Dressage Talus AVAL

Localisation : PK 468.86 au PK 250

Date de soumission : 23/07/97

Demande effectuée par : M. K. Goye

Demande reçue par : M. K. Goye Date : 23/07/97

Commentaires :

Contrôlée par : B. BOYER
Signature et Date : B. Boyer 25/07/97 18:00

Remarques : TALUS PRÊT 25/07/97 À 15:00
REPROFILAGE ACCEPTÉ

Approuvée : X
BB

Non Approuvée :

GROUPEMENT FOUGEROLLE/C.S.E.

BARRAGE AL BASSAM DE NIANDOUBA

DEMANDE D'APPROBATION N°.....

Date et heure d'activité : 21/07 à 16h

Item à vérifier : caniveau Aval

Localisation : PK 400 au PK 250

Date de soumission : 23/07/97

Demande effectuée par : Milet [Signature]

Demande reçue par : M. K. Goye Date : 23/07/97

Commentaires :

Contrôlée par : B. BOYER

Signature et Date Bertrand Boyer 25/07/97 10:00

Remarques : EXCAVATION CORRECTE, LOCALISATION ACCEPTABLE

Approuvée
B.B.

Non Approuvée

GROUPEMENT FOUGEROLLE/C.S.E.

BARRAGE AL BASSAM DE NIANDOUBA

DEMANDE D'APPROBATION N° Div 51

Date et heure d'activité : 25-7-97 à 10h

Item à vérifier : DRESSAGE Talus cote 28,50

Localisation : PK 1+163 au PK 1+184

Date de soumission : 24/07/97

Demande effectuée par :

Mulet



Demande reçue par :

24/07/97 N. R. Boyer

Date :

24/07/97

Commentaires :

Contrôlée par :

B. BOYER

Signature et Date :

B. Boyer

Remarques :

LE TALUS A ÉTÉ RECEPTIONNÉ ET
APPROUVÉ LE 22-07-97 AUX ch. 1+163 à 1+184.

Approuvée : X

Non Approuvée :

GROUPEMENT FOUGEROLLE/C.S.E.

BARRAGE AL BASSAM DE NIANDOUËA

DEMANDE D'APPROBATION N° Div 48

Date et heure d'activité : 22/7/97 à 8h

Item à vérifier : Dressage Talus Aval

Localisation : Pk 0+400 au Pk 0,475.

Pk 1+325 au Pk 1+375

Pk 1+125 au Pk 1+200

Date de soumission 21/7/97

Demande effectuée par : Mulet *[Signature]*

Demande reçue par : B. Boyer Date 21-07-97 17:15

Commentaires :
.....
.....
.....
.....

Contrôlée par : B. Boyer

Signature et Date : Bertrand Boyer 22-07-97 18:00

Remarques : ch. 0+400 à 0+475 VOIR NOTE ANNEXÉE

ch. 1+125 à 1+200 " "

ch. 1+325 à 1+375 REPRISE CORRECTE.

Approuvée : X
B.B.

Non Approuvée

LEVES TOPO. FAITS LE 22 JUILLET 1997.

CH.	LEVE REPROFILAGE TALUS AVAL CH. 0+400 A 0+475.				
	#PNT	NORD (Y)	EST (X)	ELEVATION	DESCRIPTION O/S LEVE/PLAN
0+475	16310	1424790.12	612590.07	30.660	BT 8.85/8.52
	16311	1424791.72	612588.63	31.687	TA 6.72/ 6.47
	16312	1424793.29	612587.67	32.700	TA 4.88/4.44
0+469	16313	1424786.82	612585.03	30.662	PI 8.70/ 8.52
	16314	1424787.19	612584.89	30.759	TA 8.32/ 8.32
	16315	1424788.41	612583.94	31.662	TA 6.78/ 6.52
	16316	1424790.13	612582.73	32.667	TA 4.67/ 4.51
0+450	16317	1424776.51	612569.25	30.848	PI 8.23/ 8.15
	16318	1424776.86	612569.06	30.956	TA 7.83/7.93
	16319	1424778.17	612568.14	31.816	TA 6.24/ 6.21
	16320	1424779.78	612567.02	32.853	TA 4.28/ 4.14
0+425	16321	1424762.74	612548.35	31.075	PI 7.71/ 7.69
	16322	1424763.01	612548.18	31.181	TA 7.39/7.48
	16323	1424763.82	612547.60	31.679	TA 6.39/6.48
	16324	1424764.50	612547.28	32.079	TA 5.65/5.68
0+400	16325	1424748.89	612527.54	31.332	PI 7.30/ 7.18
	16326	1424749.19	612527.37	31.513	TA 6.95/ 6.82
	16327	1424750.54	612526.33	32.323	TA 5.25/ 5.20

NOTE: NOUS CONSTATONS DES ECARTS SUPERIEURS AUX TOLERANCES DU MARCHE A DIFFERENTS EN-DROITS. AU CH. 0+475, LE TALUS EST TROP LARGE (+ DE 25 CM) A DEUX POINTS LEVES. AUX CH. 0+450 ET 0+425, LE TALUS EST TROP ETROIT (0 CM EN MOINS) A DIFFERENTS POINTS LEVES. NOUS DEMANDONS A L'ENTREPRENEUR DE PRENDRE LES DISPOSITIONS REQUISES AFIN DE RESPECTER LES NORMES CONTRACTUELLES.

CH.	LEVE REPROFILAGE TALUS AVAL CH. 1+125 A 1+184.				
	#PNT	NORD (Y)	EST (X)	ELEVATION	DESCRIPTION O/S LEVE/PLAN
1+125	16330	1425153.75	613128.90	27.272	PIBT 15.37/15.19
	16331	1425154.10	613128.69	27.454	TA 14.97/14.82
	16332	1425155.14	613127.98	28.088	TA 13.71/13.55
	16333	1425156.19	613127.28	28.750	TA 12.44/12.34
1+137	16334	1425160.39	613138.71	27.242	BT 15.47/15.25
	16335	1425160.68	613138.51	27.336	PITA 15.12/15.06
	16336	1425161.84	613137.84	28.017	TA 13.79/13.70
	16337	1425162.92	613137.20	28.709	TA 12.54/12.42
1+150	16338	1425167.89	613149.53	27.233	PIBT 15.43/15.26
	16339	1425168.20	613149.33	27.435	TA 15.07/14.86
	16340	1425169.29	613148.61	28.088	TA 13.77/13.55
	16341	1425170.18	613147.95	28.657	TA 12.66/12.53
1+163	16342	1425175.19	613160.69	27.196	PIBT 15.77/15.34
	16343	1425175.49	613160.44	27.308	TA 15.38/15.11
	16344	1425176.65	613159.68	28.068	TA 13.99/13.59
	16345	1425177.63	613158.93	28.837	TA 12.76/12.17
1+175	16346	1425182.82	613171.57	27.259	PIBT 15.66/15.21
	16347	1425183.10	613171.30	27.403	TA 15.27/14.92
	16348	1425184.42	613170.49	28.151	TA 13.73/13.43
	16349	1425185.24	613170.00	28.664	TA 12.77/12.51
1+184	16350	1425186.89	613177.95	27.155	BT 15.93/15.42
	16351	1425187.17	613177.80	27.226	PITA 15.62/15.28

16352	1425188.35	613176.90	28.003 TA	14.13/13.72
16353	1425189.36	613176.20	28.672 TA	12.90/12.50

NOTE:NOUS CONSTATONS DU CH. 1+163 AU 1+184 UNE SURLARGEUR SUPERIEURE AUX TOLERANCES DU MARCHE. NOUS DEMANDONS A L'ENTREPRENEUR DE PRENDRE LES DISPOSITIONS REQUISES AFIN DE RESPECTER LES NORMES CONTRACTUELLES.

LEVE REPRISE REPROFILAGE TALUS AVAL CH. 1+350 A 1+375.

#PNT CH.	NORD (Y)	EST (X)	ELEVATION	DESCRIPTION	O/S	LEVE/PLAN
1+350		16354	1425281.74	613313.94	27.401 BT	15.04/14.93
1+375		16355	1425297.97	613333.07	28.709 BT	12.54/12.43

NOTE:LA REPRISE DU REPROFILAGE DU TALUS AVAL EST CORRECTE.

GROUPEMENT FOUGEROLLE/C.S.E.

BARRAGE AL BASSAM DE NIANDOUBA

DEMANDE D'APPROBATION N° Div 4.5

Date et heure d'activité : 17/07/97 à 15H

Item à vérifier : Dessage Talus Aval cote 29

Localisation : PK 1,125 au PK 1,200

Date de soumission : 10/07/97

Demande effectuée par : Mulet

Demande reçue par : B. BOYER

Date : 16-07-97

Commentaires :

Contrôlée par : B. BOYER

Signature et Date : Bertrand Boyer 21-07-97 15:00

Remarques : TRAVAUX INACHEVÉS LE 21-07-97 À 15:00
- NOUVELLE DEMANDE DE RÉCEPTION ÉMISE.

Approuvée:

Non Approuvée :

GROUPEMENT FOUGEROLLE/C.S.E.

BARRAGE AL BASSAM DE NIANDOUBA

DEMANDE D'APPROBATION N° Div. 47

Date et heure d'activité : 21-7-97 à 15H

Item à vérifier : Arrêtage Talus Amont

Localisation : PK 0,250 au PK 0,395

Date de soumission : 20-7-97

Demande effectuée par : [Signature]

Demande reçue par : B. BOYER Date : 21-07-97 17:15

Commentaires :

Contrôlée par : B. BOYER

Signature et Date : [Signature] 21-07-97 15:00

Remarques : CRÊTE EN SURLARGEUR (PLUS DE 50CM) - VOIR FEUILLE ANNEXÉE

Approuvée:

Non Approuvée : X

[Signature]

LEVES TOPO. FAITS LE 21 JUILLET 1997.

LEVE REPROFILAGE TALUS AMONT CH. 0+325 A 0+250.

CH.	#PNT	NORD (Y)	EST (X)	ELEVATION	DESCRIPTION	O/S LEVE/PLAN
0+325	16290	1424715.65	612459.47	33.171	TA	3.98/ 3.01
	16291	1424716.93	612458.61	32.307	TA	5.52/ 5.17
	16292	1424718.50	612457.44	31.524	BT	7.48/ 7.13
	16293	1424720.47	612456.15	31.457	TN	9.83
0+300	16294	1424700.91	612439.13	33.391	TA	3.40/ 2.46
	16295	1424702.12	612438.43	32.620	TA	4.79/ 4.39
	16296	1424703.73	612437.33	31.799	BT	6.74/ 6.44
	16297	1424705.63	612435.97	31.737	TN	9.07
0+275	16298	1424686.82	612419.14	33.354	TA	3.14/ 2.56
	16299	1424687.49	612418.61	32.919	TA	4.00/ 3.64
	16300	1424689.04	612417.42	32.091	BT	5.94/ 5.71
	16301	1424690.97	612415.96	32.102	TN	8.36
0+250	16302	1424672.35	612397.81	33.388	TA	3.34/ 2.47
	16303	1424673.17	612397.30	32.880	TA	4.30/ 3.74
	16304	1424673.89	612396.62	32.405	BT	5.28/ 4.93
	16305	1424675.82	612395.36	32.367	TN	7.58

NOTE: LE REPROFILAGE DU TALUS AMONT DOIT ETRE REPRIS AU NIVEAU DE LA CRETE. IL EST EN SURLARGEUR (PLUS DE 50 CM). L'ENTREPRENEUR EST PRIE DE NOUS AVISER LORSQUE LA CORRECTION AURA ETE EFFECTUEE.

GROUPEMENT FOUGEROLLE/C.S.E.

BARRAGE AL BASSAM DE NIANDOUBA

DEMANDE D'APPROBATION N° Div. 46

Date et heure d'activité : 17/07/97 à 15

Item à vérifier : barrage Talus Amont

Localisation : PK 0,350 au PK 0,468.86

Date de soumission : 16/07/97

Demande effectuée par : m.let. *[Signature]*

Demande reçue par : B. BOYER Date : 16-07-97

Commentaires :

Contrôlée par : B. BOYER

Signature et Date : *Bertand Boyer* 17-07-97 19:00

Remarques : ok 0+350 à 0+470.

Approuvée : *B.B.*

Non Approuvée :

GROUPEMENT FOUGEROLLE/C.S.E.

BARRAGE AL BASSAM DE NIANDOUBA

DEMANDE D'APPROBATION N° Div 44

Date et heure d'activité : 16-7-1997

Item à vérifier : bressage Talus Aval cote 29

Localisation : PK 1,325 au PK 1,375

Date de soumission : 15-7-1997

Demande effectuée par : Norlet P. N.

Demande reçue par : Touhama Dou Gaze Date : 15/07/97

Commentaires :

Contrôlée par : B. Boyer

Signature et Date : Bertrand Boyer 16-07-97

Remarques : LÈVÉS DU TALUS FAITS AUX
ch. 1+345 ET 1+350. LE TALUS EST
TROP ÉTROIT À CERTAINS ENDRROITS AUX
DEUX PLACES. VOIR FEUILLE ANNEXÉE

Approuvée :

Non Approuvée : X

LEVE EXCAVATION CANAL D'EVACUATION.

CH.	#PNT	NORD (Y)	EST (X)	ELEVATION	DESCRIPTION	O/S LEVE/PLAN
1+345	16240	1425278.35	613310.10	27.085	BT	15.65/15.56
	16241	1425279.73	613309.07	27.727	TA	13.93/14.28
	16242	1425281.48	613307.58	29.114	TA	11.65/11.61
1+350	16243	1425281.89	613313.77	27.317	BT	14.82/15.10
	16244	1425282.99	613312.91	28.115	TA	13.43/13.56
	16245	1425284.24	613311.94	29.020	TA	11.85/11.80

NOTE: LE TALUS DOIT ETRE RENFLOUE OU IL EST TROP ETROIT.

GROUPEMENT FOUGEROLLE/C.S.E.

BARRAGE AL BASSAM DE NIANDOUBA

DEMANDE D'APPROBATION N° Div. 4.3

Date et heure d'activité : 11/7/97 à 8h

Item à vérifier : caniveau BRAIN de pied

Localisation : PK 1050 au PK 1125

Date de soumission : 12/7/97

Demande effectuée par : M. Let *Attard*

Demande reçue par : M. Sirais *MS* Date : 12/7/97

Commentaires :

Contrôlée par : B. BOYER

Signature et Date : *Batist Boyer* 15/07/97

Remarques : * PENTE INVERSÉE
* LARGEUR INSUFFISANTE

Approuvée :

Non Approuvée : X

GROUPEMENT FOUGEROLLE/C.S.E.

BARRAGE AL BASSAM DE NIANDOUBA

DEMANDE D'APPROBATION N° Div 4.2

Date et heure d'activité : 12/7/97

Item à vérifier :

Remblai digue Argile

Localisation : PK 0+900 au PK 0+584, 98

Date de soumission : 12/7/97

Demande effectuée par : NR Nilet

Demande reçue par : Marie Sirois ps Date : 12/7/97

Commentaires :

Contrôlée par : B. Boyer

Signature et Date : *B. Boyer* 12/07/97

Remarques : ch 0+584 - TROP HAUT A CORRIGER

ch. 0+600 A 0+900 ok

Approuvée:

Non Approuvée:

B.B.

GROUPEMENT FOUGEROLLE/C.S.E.

BARRAGE AL BASSAM DE NIANDOLIBA

DEMANDE D'APPROBATION N° Div 4.1

Date et heure d'activité : 14/7/97 à 8h.

Item à vérifier : Dressage Talus Amont

Localisation : PK 0+675 au PK 0+700

Date de soumission : 12/7/97 *Attard*

Demande effectuée par : *nolet*

Demande reçue par : *M. Sirois* Date : 12/7/97

Commentaires :

Contrôlée par : *B. Boyer*
Signature et Date : *Bertul Boyer* 12/07/97

Remarques : *LEVÉ TOPO. FAIT LE 09/07/97. OK*

Approuvée: *B.B.* Non Approuvée:

GROUPEMENT FOUGEROLLE/C.S.E.

BARRAGE AL BASSAM DE NIANDOUBA

DEMANDE D'APPROBATION N° Div. 33

Date et heure d'acceptation : 11/07/97 à 14h30'

Item à vérifier : Dressage du talus aval entre
chainage 0+584,78 et 0+625

Localisation : Digue PK 584,78 → PK 625.

Date de soumission : 10/07/97

Demande effectuée par : Mr MORLET *[Signature]*

Demande reçue par : M. Sirois *[Signature]* Date 10/7/97

Commentaires :

Contrôlée par : B. Boyer

Signature et Date : *Batral Boyer* 12-07-97 8:00

Remarques : TALUS CORRECT ch. 0+584,78 à 0+625.

NOTE: LE TALUS EST LÉGÈREMENT TROP
ÉTROIT AU ch. 0+579.

Approuvée: *B.B.*

Non Approuvée:

LEVES TOPO. FAITS LE 11 JUILLET 1997.

CH.	LEVE REMBLAI DE PROTECTION AMONT DE L'EVACUATEUR.				DESCRIPTION
	#PNT	NORD (Y)	EST (X)	ELEVATION	
0+577	16000	1424859.21	612666.01	28.673	REM
	16001	1424864.24	612662.53	28.635	REM
	16002	1424870.62	612658.28	28.626	REM
0+552	16003	1424845.09	612645.53	28.659	REM
	16004	1424851.24	612641.92	28.681	REM
	16005	1424857.04	612637.54	28.717	REM
0+527	16006	1424830.87	612624.94	28.675	REM
	16007	1424836.91	612620.82	28.709	REM
	16008	1424842.56	612616.89	28.728	REM
0+502	16009	1424816.66	612604.35	28.661	REM
	16010	1424822.70	612600.58	28.750	REM
	16011	1424828.83	612596.19	28.760	REM
0+477	16012	1424802.58	612583.81	28.671	REM
	16013	1424807.87	612580.08	28.710	REM
	16014	1424814.62	612576.01	29.013	REM

NOTE: LE REMBLAI D'ARGILE (28.700) EST ACCEPTE.

CH.	LEVE RPROFILAGE TALUS AVAL CH. 0+579 A 0+625.				DESCRIPTION
	#PNT	NORD (Y)	EST (X)	ELEVATION	
0+579	16020	1424847.70	612676.31	29.611	BT 10.40/10.62
	16021	1424849.23	612675.36	30.563	TA 8.60/ 8.72
	16022	1424851.00	612674.66	31.492	TA 6.74/ 6.86
	16023	1424853.59	612672.86	33.075	HT 3.59/ 3.69
0+585	16024	1424850.94	612681.52	29.602	BT 10.69/10.64
	16025	1424852.40	612680.45	30.604	TA 8(.87/ 8.63
	16026	1424854.05	612679.30	31.582	TA 6.87/ 6.68
	16027	1424856.72	612677.57	33.105	HT 3.70/ 3.63
0+600	16028	1424859.30	612694.21	29.440	BT 11.02/10.96
	16029	1424860.86	612693.08	30.445	TA 9.09/ 8.95
	16030	1424862.55	612692.05	31.434	TA 7.12/ 6.97
	16031	1424864.17	612690.91	32.446	TA 5.13/ 4.95
	16032	1424865.34	612690.10	33.123	HT 3.71/ 3.60
0+625	16033	1424873.01	612715.11	29.166	BT 11.59/11.51
	16034	1424874.61	612714.06	30.185	TA 9.68/ 9.47
	16035	1424876.20	612712.88	31.187	TA 7.70/ 7.47
	16036	1424877.93	612711.77	32.186	TA 5.65/ 5.47
	16037	1424879.49	612710.71	33.119	HT 3.76/ 3.60

NOTE: LE REPROFILAGE DU TALUS AVAL EST CORRECT DU CH. 0+585 A 0+625. IL EST LEGEREMENT TROP ETROIT AU CH. 0+579 (PRES DU MUR).

GROUPEMENT FOUGEROLLE/C.S.E.

BARRAGE AL BASSAM DE NIANDOUBA


DEMANDE D'APPROBATION N° Div. 3.5

Date et heure d'activité : 08/07/1997 14^h-00

Item à vérifier :
Dressage des talus amont entre chainages 0+610 et 0+675
et banquettes du 0+584 au 0+610.

Localisation :
Digue entre chainages 0+610 et 0+675

Date de soumission : 05/07/1997

Demande effectuée par : M. GAYE 

Demande reçue par : B. Boyer Date : 05-07-97

Commentaires :
.....
.....
.....
.....

Contrôlée par : B. Boyer

Signature et Date : B. Boyer 07/07/97 20:30

Remarques : RÉCEPTION FAITE JUSQU'À 0+650.
- REPROFILAGE INACHEVÉ AU ch. 0+675.
.....
.....
.....

Approuvée : B.B.

Non Approuvée :

GROUPEMENT FOUGEROLLE/C.S.E.

BARRAGE AL BASSAM DE NIANDOUBA

DEMANDE D'APPROBATION N°... **Div 37**

Date et heure d'activité : **07/07/1997 - 14^h 30**

Item à vérifier :
Mise en place de la cheminée au droit de l'ouvrage de restitution

Localisation :

Ouvrage de restitution (Digue) entre chainages 748 et 774

Date de soumission : **05/07/1997**

Demande effectuée par : **M. GAYE**

Demande reçue par : **B. BOYER** Date : **05-07-97**

Commentaires :

Contrôlée par : **B. BOYER**

Signature et Date : **Bretel Boyer** **07/07/97 20:30**

Remarques : **ELEV. ± 10 CM.**
LARGEUR ET LOCALISATION ACCEPTABLES.

Approuvée: **X**
BB

Non Approuvée :

GROUPEMENT FOUGEROLLE/C.S.E.

BARRAGE AL BASSAM DE NIANDOUBA

DEMANDE D'APPROBATION N°...DIV 36

Date et heure d'activité : 07/07/1997 17^H30

Item à vérifier :
Drenage des talus aval jusqu'à la cote +28,5
entre les chainages 1+220 et 1+325

Localisation :
Digue entre chainages 1+220 et 1+325

Date de soumission : 05/07/1997

Demande effectuée par : M. GAYE

Demande reçue par : B. BOYER Date : 05-07-97

Commentaires :

Contrôlée par : B. BOYER
Signature et Date : *B. Boyer* 07-07-97 20:30

Remarques : LE TALUS DEVRA ÊTRE RENFLOUÉ AUX
ENDROITS où IL EST TROP ÉTROIT.

Approuvée:

Non Approuvée :

GROUPEMENT FOUGEROLLE/C.S.E.

BARRAGE AL BASSAM DE NIANDOUBA

DEMANDE D'APPROBATION N° RE-12

DEFINITION DE L'OUVRAGE : REMBLAI DIGUE entre PK 0+900..... et PK 1+471 (remblai final)

Traitement assiette : Date et heure d'activité : Résultat :

Remblai alluvionnaire : Date et heure d'activité : 7/07/1997 15^{H-00} Résultat :

Couche N° : Côte: Ep.:..... Compacité : Couche N° : Côte: Ep.:..... Compacité :

Couche N° : Côte: Ep.:..... Compacité : Couche N° : Côte: Ep.:..... Compacité :

Couche N° : Côte: Ep.:..... Compacité : Couche N° : Côte: Ep.:..... Compacité :

Couche N° : Côte: Ep.:..... Compacité : Couche N° : Côte: Ep.:..... Compacité :

Couche N° : Côte: Ep.:..... Compacité : Couche N° : Côte: Ep.:..... Compacité :

Couche N° : Côte: Ep.:..... Compacité : Couche N° : Côte: Ep.:..... Compacité :

Couche N° : Côte: Ep.:..... Compacité : Couche N° : Côte: Ep.:..... Compacité :

Couche N° : Côte: Ep.:..... Compacité : Couche N° : Côte: Ep.:..... Compacité :

Date de soumission : 05/07/1997

Demande effectuée par : M. GAYE

Demande reçue par : B. BOYER Date : 05-07-97

Commentaires : SUITE À UNE DEMANDE DE RÉCEPTION VERBALE (L'ENTREPRENEUR S'APPRÊTANT À POSER LA LATÉRITE) LE LEVÉ COMPLET ch. 0+900 à 1+455 A ÉTÉ FAIT LE 02/07/97. REFUS COMPLET.

Contrôlée par : B. BOYER

Signature et Date : [Signature] 07/07/97 20:00

Remarques : ELEV. ± 10CM. LARGEUR OK

Approuvée: X BB.

Non Approuvée :

GROUPEMENT FOUGEROLLE/C.S.E.

BARRAGE AL BASSAM DE NIANDOUBA

DEMANDE D'APPROBATION N° Div.34

Date et heure d'activité : 03/07/97 7h30

Item à vérifier :

Dressage des talus amont entre chainages
0+584 et 0+610

Localisation : Digue entre chainages 0+584 et 0+610

Date de soumission : 01/07/1997

Demande effectuée par : M. GAYE

Demande reçue par : B. BOYER Date : 02-07-97

Commentaires :
.....
.....
.....
.....

Contrôlée par : B. BOYER

Signature et Date : B. Boyer 03-07-97

Remarques : REPROFILAGE DU TALUS CORRECT DU ch. 0+578
à 0+625 DANS LA PARTIE CONTRÔLÉE.
- BAS DE TALUS À FINALISER AVANT LA MISE EN PLACE DES
MATELAS.

Approuvée : X
B.B.

Non Approuvée :

GROUPEMENT FOUGEROLLE/C.S.E.

BARRAGE AL BASSAM DE NIANDOUBA

DEMANDE D'APPROBATION N° DIV31

Date et heure d'activité : 01/07/97 10^H-00

Item à vérifier :

Dressage des talus aval entre chainages:

1+375 et 1+440

Localisation : Digue (chainages 1+375 à 1+440)

Date de soumission : 30/06/97 *[Signature]*

Demande effectuée par : M. GAME

Demande reçue par : M. Sirois *prs.* Date : 30/6/97

Commentaires :
.....
.....
.....
.....

Contrôlée par : B. BOYER

Signature et Date : *[Signature]* 02-07-97

Remarques : ACCEPTÉ DU CHAINAGE 1+400 À 1+440 INCLUS.

(ch. 1+375 À VÉRIFIER).

* VOIR FEUILLES EN ANNEXE.

Approuvée: *[Signature]*

Non Approuvée :

02/07/97 10:00 AM

GROUPEMENT FOUGEROLLE/C.S.E.

BARRAGE AL BASSAM DE NIANDOUBA

DEMANDE D'APPROBATION N° DIV30

Date et heure d'activité : 01/07/97 14^H30

Item à vérifier :

Drainage des talus amont entre chainages
1+400 et 1+460

Localisation : Digue (chainages 1+400 à 1+460)

Date de soumission : 30/06/1997

Demande effectuée par : M. GAYE

Demande reçue par : M. Sirois Date : 30/6/97

Commentaires :

Contrôlée par : P. BOYER

Signature et Date : P. Boyer 02/07/97

Remarques : ACCEPTÉ du ch. 1+400 à 1+460 INCLUS.

Approuvée: X

Non Approuvée :

P.B.
02/07/97 9:00AM

GROUPEMENT FOUGEROLLE/C.S.E.

BARRAGE AL BASSAM DE NIANDOUBA

DEMANDE D'APPROBATION N° Div 33

Date et heure d'activité : 01/07/1997 14^H30

Item à vérifier :

Réception banquettes supérieures (côte 26.80) du bassin de dissipation (piquets de niveau)

Localisation : Evacuateur de crues : bassin de dissipation

Date de soumission : 01/07/1997

Demande effectuée par : M. GAYE 

Demande reçue par : Date :

Commentaires :

Contrôlée par : B. BOYER

Signature et Date : Bertual Boyer 02/07/97

Remarques : ELEV. ET POSITIONNEMENT ACCEPTABLES.

Approuvée: BB.
02/07/97 11:00AM

Non Approuvée:

GROUPEMENT FOUGEROLLE/C.S.E.

BARRAGE AL BASSAM DE NIANDOUBA

DEMANDE D'APPROBATION N° DIV32

Date et heure d'activité : 07/07/97 - 14^h30

Item à vérifier :

Niveau final (+33,20) matériau
alluvionnaire entre chainages 0+900 et 1+471

Localisation : Digue (chainages 0+900 et 1+471)

Date de soumission : 30/06/1997

Demande effectuée par : M. GAME

Demande reçue par : M. Sirois Date : 30/6/97

Commentaires :
.....
.....
.....
.....

Contrôlée par : B. BOYER

Signature et Date : [Signature] 07/07/97

Remarques : TRAVAUX INACHEVÉS AU MOMENT DU CONTRÔLE
EQUIPEMENTS EN CIRCULATION SUR LE SITE EMPÊ-
CHANT LE LEVÉ TOPO.

Approuvée :

Non Approuvée : X

LEVES TOPO. FAITS LE 01 JUILLET 1997.

CH.	LEVE REPROFILAGE TALUS AMONT CH. 1+425 A 1+466.					
	#PNT	NORD (Y)	EST (X)	ELEVATION	DESCRIPTION	O/S LEVE/PLAN
1+425	15510	1425339.20	613365.10	33.186	TA	3.22/ 2.98
	15511	1425342.17	613363.07	31.762	TA	6.82/ 6.54
	15512	1425345.50	613360.94	30.152	TA	10.77/10.56
	15513	1425347.27	613359.78	29.379	BT	12.88/12.49
	15514	1425349.86	613358.47	29.442	TN	15.76
1+440	15515	1425348.68	613377.26	32.849	TA	4.12/ 3.82
	15516	1425350.45	613376.46	32.016	TA	6.03/ 5.90
	15517	1425352.28	613375.37	31.225	TA	8.16/ 7.88
	15518	1425353.84	613374.26	30.420	TN	10.08/ 9.89
	15519	1425356.19	613372.89	30.423	TN	12.78
1+450	15520	1425353.77	613386.41	33.179	TA	3.12/ 2.99
	15521	1425354.71	613385.77	32.713	TA	4.25/ 4.16
	15522	1425356.34	613384.60	31.908	TA	6.26/ 6.17
	15523	1425358.15	613383.45	31.126	BT	8.41/ 8.13
	15524	1425360.51	613382.65	31.187	TN	10.80
1+460	15525	1425359.38	613394.36	33.190	TA	3.22/ 2.97
	15526	1425360.83	613393.08	32.433	BT	5.15/ 4.86
1+466	15527	1425363.86	613398.22	33.687	HT BT	4.72 (FIN)

NOTE:LE REPROFILAGE DU TALUS AMONT EST ACCEPTE DU CH. 1+425 A 1+466 INCLUS.

CH.	LEVE REPROFILAGE TALUS AVAL CH. 1+280 A 1+440.					
	#PNT	NORD (Y)	EST (X)	ELEVATION	DESCRIPTION	O/S LEVE/PLAN
1+280	15530	1425233.75	613262.35	22.276	BT	25.26/25.18
1+300	15531	1425248.13	613276.33	24.206	BT	21.37/21.32
1+325	15532	1425270.43	613291.45	29.067	TA	11.59/11.71
	15533	1425267.17	613293.62	27.054	TA	15.51/15.62
	15534	1425265.20	613294.84	26.006	BT	17.82/17.72
1+ ³⁷⁵ 350	15535	1425299.10	613332.08	29.055	TA	11.05/11.73
	15536	1425297.96	613333.05	28.615	BT	12.53/12.61
1+400	15537	1425316.10	613351.03	31.041	TA	7.87/ 7.76
	15538	1425314.17	613352.31	29.866	BT	10.13/10.11
1+425	15539	1425329.87	613371.92	30.740	BT	8.33/ 8.36
	15540	1425331.40	613370.96	31.843	TA	6.53/ 6.16
1+440	15541	1425339.28	613383.61	31.244	BT	7.22/ 7.35

NOTE:L'ENTREPRENEUR EST PRIE DE PRENDRE GARDE A RESPECTER LA DISTANCE MINIMALE DU TALUS PAR RAPPORT A L'AXE ET DE SE CONFORMER AUX TOLERANCES DU MARCHE.

CH.	LEVE DRAIN CHEMINEE, OUVRAGE DE RESTITUTION.					
	#PNT	NORD (Y)	EST (X)	ELEVATION	DESCRIPTION	O/S LEVE/PLAN
0+773.5	15550	1424964.05	612832.71	28.874	DC	3.40/ 3.53
	15551	1424962.96	612833.51	28.718	DC	4.75/ 5.18
0+762.0	15552	1424956.47	612824.05	28.881	DC	4.72/ 5.02
	15553	1424957.52	612823.32	28.853	DC	3.45/ 3.55
0+749.2	15554	1424950.37	612812.74	28.674	DC	3.33/ 3.73
	15555	1424949.26	612813.36	28.676	DC	4.49/ 5.22

NOTE:L'ENTREPRENEUR EST PRIE DE RESPECTER LA LARGEUR DE 1.5 M. POUR LE DRAIN CHEMINEE AINSI QUE SON POSITIONNEMENT PAR RAPPORT A L'AXE DU BARRAGE.

LEVE EXCAVATION BANQUETTE NIV.26.80, EVACUATEUR.

CH.	#PNT	NORD (Y)	EST (X)	ELEVATION	DESCRIPTION	O/S LEVE/PLAN
0+481	15560	1424795.63	612592.74	26.763	BT	5.75/ 5.75
	15561	1424791.75	612595.30	26.797	EXC	
0+502	15562	1424790.00	612597.90	26.741	HT	13.39/13.75
	15563	1424807.80	612610.45	26.604	BT	5.75/ 5.75
	15564	1424804.17	612612.71	26.760	EXC	
0+527	15565	1424801.27	612614.69	26.747	HT	13.65/13.75
	15566	1424815.76	612635.72	26.701	HT	13.65/13.75
	15567	1424818.77	612633.50	26.778	EXC	
0+552	15568	1424822.00	612631.03	26.694	BT	5.75/ 5.75
	15569	1424836.15	612651.55	26.630	BT	5.75/ 5.75
0+572	15570	1424832.42	612653.92	26.794	EXC	
	15571	1424829.75	612655.91	26.674	HT	13.60/13.75
	15572	1424841.35	612672.64	26.887	HT	13.55/13.75
	15573	1424844.26	612670.50	26.702	EXC	
	15574	1424847.86	612668.50	26.504	BT	5.75/ 5.75

(26.800)

NOTE: LA BANQUETTE AVAL DE L'EVACUATEUR NIVEAU 26.80 EST ACCEPTABLE.

GROUPEMENT FOUGEROLLE/C.S.E.

BARRAGE AL BASSAM DE NIANDOUBA

DEMANDE D'APPROBATION N° DIV 27

Date et heure d'activité : 26/06/1997 - 15^H -00

Item à vérifier : Bétonnage rampe d'accès en béton piste d'accès
côté rive droite du canal de fuite du bassin de dissipation -

Localisation :

Bassin de dissipation, piste d'accès.

Date de soumission : 26/06/1997

Demande effectuée par : M. GAYE

Demande reçue par : B. BOYER Date : 26-06-97

Commentaires :

Contrôlée par : B. BOYER

Signature et Date : Bertrand Boyer 26-06-97

Remarques : Voir NOTE EN ANNEXE -

-(PLAQUER LE COFFRAGE A 2 METRES AVANT LES PREMIERS
REPÈRES DE NIVELLEMENT)

Approuvée : X
AVEC RESERVE.
B.B.

Non Approuvée :

LEVES TOPO. FAITS LE 26 JUIN 1997.

CH.	LEVE BANQUETTE GAUCHE AVAL EVACUATEUR (MARIO).				
	#PNT	NORD (Y)	EST (X)	ELEVATION	DESCRIPTION
					O/S LEVE/PLAN
0+589.3	15460	1424835.43	612697.65	26.808	HT 32.62
0+579.7	15461	1424830.24	612689.65	26.451	HT 32.35
0+579.7	15462	1424822.94	612694.69	26.246	HT 41.23
0+579.7	15463	1424812.71	612701.66	26.039	HT 53.60
0+588.4	15464	1424817.33	612709.13	26.555	TA 54.03
0+589.0	15465	1424827.27	612702.89	26.684	TA 42.31

CH.	LEVE DESCENTE PISTE DROITE DE L'EVACUATEUR.				
	#PNT	NORD (Y)	EST (X)	ELEVATION	DESCRIPTION
					O/S LEVE/PLAN
0+475.0	15470	1424773.76	612601.37	24.277	DB (24.300)
0+474.8	15471	1424777.59	612598.51	24.296	DB (24.300)
0+472.8	15472	1424776.20	612596.96	24.474	BO (24.487)
0+472.9	15473	1424772.82	612599.53	24.475	BO (24.478)
0+469.9	15474	1424771.37	612596.87	24.754	BO (24.756)
0+469.8	15475	1424774.57	612594.48	24.749	BO (24.765)
0+464.8	15476	1424771.70	612590.36	25.215	BO (25.228)
0+465.0	15477	1424768.63	612592.76	25.214	BO (25.209)
0+460.0	15478	1424765.83	612588.63	25.688	BO (25.672)
0+459.8	15479	1424768.73	612586.42	25.686	BO (25.691)
0+456.9	15480	1424767.03	612583.97	25.954	BO (25.959)
0+457.0	15481	1424764.04	612586.21	25.955	BO (25.950)
0+456.9	15482	1424765.51	612585.14	25.513	EXC
0+464.9	15483	1424769.89	612591.74	24.733	EXC
0+472.8	15484	1424774.48	612598.20	24.000	EXC

NOTE: LA PISTE DEDUTE AU CH. 0+454.8; AU MOMENT DU LEVE, LES PREMIERS REPERES ETAIENT AU CH. 0+457. IL SEMBLE DONC MANQUER 2 METRES SUR LA LONGUEUR DE LA PISTE. L'ENTREPRENEUR EST PRIE DE PLACER SON COFFRAGE EN CONSEQUENCE.

GROUPEMENT FOUGEROLLE/C.S.E.

BARRAGE AL BASSAM DE NIANDOUBA

DEMANDE D'APPROBATION N° 01126

Date et heure d'activité : 26/06/1997 - 10^h30

Item à vérifier : Excavation pour rampe en béton piste
d'accès côté rive droite du canal de fuite du
bassin de dissipation

Localisation :

Bassin de dissipation - piste d'accès en béton

Date de soumission : 26/06/1997

Demande effectuée par : M. GAYE

Demande reçue par : B. BOYER Date : 26-06-97

Commentaires :
.....
.....
.....
.....

Contrôlée par : B. BOYER

Signature et Date : B. Boyer 26-06-97

Remarques : EXCAVATION CORRECTE
.....
.....
.....

Approuvée: X

Non Approuvée :

GROUPEMENT FOUGEROLLE/C.S.E.

BARRAGE AL BASSAM DE NIANDOUBA

DEMANDE D'APPROBATION N°..DIV.25

Date et heure d'activité : ...26/06/1997.....

Item à vérifier : ...Pose cadre du batardeau.....

Localisation : ...Ouvrage de restitution - Batardeau.....

Date de soumission : ...25/06/1997.....

Demande effectuée par : ...M. GAHE [Signature].....

Demande reçue par : ...M. Sirois..... Date : ...25/6/97.....

Commentaires :
.....
.....
.....

Contrôlée par : ...B. BOYER.....

Signature et Date : ...[Signature] 26-06-97.....

Remarques : ...SEUIL INADÉQUAT EN ALTIMÉTRIE.....

S.V.P. — RESOUMETTRE UNE DEMANDE DE RÉCEPTION
APRÈS CORRECTIONS.....

Approuvée:

Non Approuvée : ...X...
p.b.

GROUPEMENT FOUGEROLLE/C.S.E.

BARRAGE AL BASSAM DE NIANDOUBA

DEMANDE D'APPROBATION N°... DIV 24

Date et heure d'activité : 25/06/1997

Item à vérifier : Excavation et dressage des talus du canal d'amenée: entrée ouvrage de restitution.

Localisation :

Canal d'amenée : entrée ouvrage de restitution

Date de soumission : 24/06/1997

Demande effectuée par : M. GAYE

Demande reçue par : M Sirois Date : 24/6/97

Commentaires :

Contrôlée par : B. BOYER

Signature et Date : [Signature] 26/06/97

Remarques : FOND D'EXCAVATION A RABAISSE A LA COTE REQUISE - Vu [Signature] LE 26/06/97.

Approuvée: [Signature]

Non Approuvée :

GRUPEMENT FOUGEROLLE/C.S.E.

BARRAGE AL BASSAM DE NIANDOUBA

DEMANDE D'APPROBATION N°...DIV.23

Date et heure d'activité : 24/06/1997

Item à vérifier :
Dressage des talus amont entre chainages 1+300 et 1+400

Localisation :
Digue entre chainages 1+300 et 1+400

Date de soumission : 24/06/1997

Demande effectuée par : M. GAUE

Demande reçue par : M. Sirois Date : 24/6/97

Commentaires :

Contrôlée par : B. BOYER
Signature et Date : Bertrand Boyer 25/06/97

Remarques : REPROFILAGE OK.

Approuvée: X

Non Approuvée :

GROUPEMENT FOUGEROLLE/C.S.E.

BARRAGE AL BASSAM DE NIANDOUBA

DEMANDE D'APPROBATION N° DR21

Date et heure d'activité : 24 Juin 1996 - 16^h - 00

Item à vérifier :
Cheminée en sable grossier Zone rivière :
niveau terminal

Localisation :
.....
.....

Date de soumission : 23/05/1997

Demande effectuée par : M. GAYE *[Signature]*

Demande reçue par : B. BOYER Date : 23-06-97

Commentaires :
.....
.....
.....

Contrôlée par : B. BOYER

Signature et Date : *[Signature]* 25-06-97

Remarques : ELEVATION ET LOCALISATION ACCEPTABLES.
.....
.....

Approuvée :

Non Approuvée :

GROUPEMENT FOUGEROLLE/C.S.E.

BARRAGE AL BASSAM DE NIANDOUBA

DEMANDE D'APPROBATION N° DR20

DEFINITION DE L'OUVRAGE : DRAIN entre PK 0+740 et PK 0+770

Déblai d'excavation : Date et heure d'activité : Résultat :

Géotextile : Date et heure d'activité : Résultat :

Enrochements : Date et heure d'activité 20/06/97- 16h30 Résultat :

Remblai sable pour filtre : Date et heure d'activité : Résultat :

Couche N° : Côte: Ep.:.....Compacité : Couche N° : Côte: Ep.:.....Compacité :

Couche N° : Côte: Ep.:.....Compacité : Couche N° : Côte: Ep.:.....Compacité :

Couche N° : Côte: Ep.:.....Compacité : Couche N° : Côte: Ep.:.....Compacité :

Couche N° : Côte: Ep.:.....Compacité : Couche N° : Côte: Ep.:.....Compacité :

Couche N° : Côte: Ep.:.....Compacité : Couche N° : Côte: Ep.:.....Compacité :

Couche N° : Côte: Ep.:.....Compacité : Couche N° : Côte: Ep.:.....Compacité :

Couche N° : Côte: Ep.:.....Compacité : Couche N° : Côte: Ep.:.....Compacité :

Couche N° : Côte: Ep.:.....Compacité : Couche N° : Côte: Ep.:.....Compacité :

Couche N° : Côte: Ep.:.....Compacité : Couche N° : Côte: Ep.:.....Compacité :

Date de soumission : 19/06/1997

Demande effectuée par : M. GAYE

Demande reçue par : M. ERIC Belocque Date : 19.06.97

Commentaires :

Contrôlée par : B. BOYER

Signature et Date : Bertrand Boyer 20/06/97 18:00

Remarques : LOCALISATION CONFORME, ELEVATION CONFORME.

Approuvée: X BB

Non Approuvée :

GROUPEMENT FOUGEROLLE/C.S.E.

BARRAGE AL BASSAM DE NIANDOUBA

DEMANDE D'APPROBATION N° DIV 22

Date et heure d'activité : 19/06/1997 (à partir de...)

Item à vérifier : Piste d'accès : béton radier entre PK 0+496 et 0+576

Localisation :

Bassin de dissipation : PK 0+496 à PK 0+576

Date de soumission : 18/06/1997

Demande effectuée par : M. GAYE

Demande reçue par : M. Sicoris Date : 18/6/97

Commentaires :

Contrôlée par : B. BOYER

Signature et Date : B. Boyer 19/06/97 8:30

Remarques : LES REPERES DE NIVELLEMENT (COTE 24.30) SONT ± 1CM BAS. VOIR A BIEN LES RECOUVRIRE LORS DE LA MISE EN PLACE DU BÉTON.

Approuvée : X
ok BB.

Non Approuvée :

GROUPEMENT FOUGEROLLE/C.S.E.

BARRAGE AL BASSAM DE NIANDOUBA

DEMANDE D'APPROBATION N° DIV 21

Date et heure d'activité : 18/06/1997

Item à vérifier :

Piste d'accès : pose des gabions entre PK0+496 et 0+576

Localisation : Bassin de dissipation PK0+496 à PK0+576

Date de soumission : 18/06/1997

Demande effectuée par : M. GAYE

Demande reçue par : M. Sirois Mario Date : 18/6/97

Commentaires :

Contrôlée par : B. BOYER

Signature et Date : B. Boyer 19/06/97 8:30

Remarques : MISE EN PLACE ACCEPTABLE EN LOCALISATION ET EN ÉLEVATION.

Approuvée :

ok BB.

Non Approuvée :

GROUPEMENT FOUGEROLLE/C.S.E.

BARRAGE AL BASSAM DE NIANDOUBA

DEMANDE D'APPROBATION N°... Div 20

Date et heure d'activité : 18/06/1997

Item à vérifier : Dressage des talus aval entre chainages
1+220 et 1+300

Localisation : Digue entre PK 1+220 et PK 1+300

Date de soumission : 17/06/1997

Demande effectuée par : M. GAYE

Demande reçue par : B. BOYER Date : 17-06-97

Commentaires :

Contrôlée par : B. BOYER

Signature et Date : B. Boyer 19/06/97 18:00

Remarques : * RECEPTION FAITE 1+220 à 1+260 ; TRAVAIL
INACHEVÉ SUITE À UN BRIS DE LA PELLE -
* ATTENTION DE NE PAS TROP ENLEVER AU
PIED DU TALUS (voir ch. 1+260) -

Approuvée : X
OK BB.

Non Approuvée :

GROUPEMENT FOUGEROLLE/C.S.E.

BARRAGE AL BASSAM DE NIANDOUBA

DEMANDE D'APPROBATION N° Div 19

Date et heure d'activité : 18/06/1997

Item à vérifier : Dressage des talus amont entre chainages
1+250 et 1+300

Localisation : Digue entre PK 1+250 et PK 1+300

Date de soumission : 17/06/1997

Demande effectuée par : M. GAYE

Demande reçue par : B. BOYER Date : 17-06-97

Commentaires :
.....
.....
.....
.....

Contrôlée par : B. BOYER

Signature et Date : B. Boyer 19/06/97 18:00

Remarques : RÉCEPTION FAITE JUSQU'À 1+300.
- REPROFILAGE OK.

Approuvée : X

Non Approuvée :

GROUPEMENT FOUGEROLLE/C.S.E.

BARRAGE AL BASSAM DE NIANDOUBA

DEMANDE D'APPROBATION N° DR19

DEFINITION DE L'OUVRAGE : DRAIN entre PK 0+770 et PK 0+800

Déblai d'excavation : Date et heure d'activité : ... Résultat :

Géotextile : Date et heure d'activité : ... Résultat :

Enrochements : Date et heure d'activité : 17/06/97 Résultat :

Remblai sable pour filtre : Date et heure d'activité : ... Résultat :

Couche N° : Côte: Ep.:.....Compacité : Couche N° : Côte: Ep.:.....Compacité :

Couche N° : Côte: Ep.:.....Compacité : Couche N° : Côte: Ep.:.....Compacité :

Couche N° : Côte: Ep.:.....Compacité : Couche N° : Côte: Ep.:.....Compacité :

Couche N° : Côte: Ep.:.....Compacité : Couche N° : Côte: Ep.:.....Compacité :

Couche N° : Côte: Ep.:.....Compacité : Couche N° : Côte: Ep.:.....Compacité :

Couche N° : Côte: Ep.:.....Compacité : Couche N° : Côte: Ep.:.....Compacité :

Couche N° : Côte: Ep.:.....Compacité : Couche N° : Côte: Ep.:.....Compacité :

Couche N° : Côte: Ep.:.....Compacité : Couche N° : Côte: Ep.:.....Compacité :

Date de soumission : 17/06/1997

Demande effectuée par : M. GAYE 

Demande reçue par : B. BOYER Date : 17-06-97

Commentaires :

Contrôlée par : B. BOYER

Signature et Date : B. Boyer 19-06-97 18:30

Remarques : VOIR A REMPLIR DANS LA PENTE AVAL.
- LOCALISATION ET ÉLEVATION CORRECTE. 

Approuvée: X
ok BB.

Non Approuvée :

GROUPEMENT FOUGEROLLE/C.S.E.

BARRAGE AL BASSAM DE NIANDOUBA

DEMANDE D'APPROBATION N°

Date et heure d'activité : 17/06/1997 - 10^H-00

Item à vérifier : Excavation bassin de dissipation pour gabions
(banquette côté terrassement = 24.80 m) Ref plan n° 209/A
208/G

Localisation : Digue - Evacuateur (bassin de dissipation)

Date de soumission : 16/06/1997

Demande effectuée par : M. GAYE

Demande reçue par : Mario Sirois Date : 16/6/97

Commentaires :

Contrôlée par : B. BOYER

Signature et Date : [Signature] 18/06/97 12:15

Remarques : ELEV. ACCEPTABLE, LOCALISATION ACCEPTABLE

Approuvée: X

Non Approuvée :

GROUPEMENT FOUGEROLLE/C.S.E.

BARRAGE AL BASSAM DE NIANDOUBA

DEMANDE D'APPROBATION N°...RE-11

DEFINITION DE L'OUVRAGE : REMBLAI DIGUE entre PK 0+168,50 et PK 0+476,82

Traitement assiette : Date et heure d'activité : Résultat :

Remblai alluvionnaire : Date et heure d'activité : 14/06/1997- 8^H Résultat :

Couche N° : Côte: Ep.:.....Compacité : Couche N° : Côte: Ep.:.....Compacité :

Couche N° : Côte: Ep.:.....Compacité : Couche N° : Côte: Ep.:.....Compacité :

Couche N° : Côte: Ep.:.....Compacité : Couche N° : Côte: Ep.:.....Compacité :

Couche N° : Côte: Ep.:.....Compacité : Couche N° : Côte: Ep.:.....Compacité :

Couche N° : Côte: Ep.:.....Compacité : Couche N° : Côte: Ep.:.....Compacité :

Couche N° : Côte: Ep.:.....Compacité : Couche N° : Côte: Ep.:.....Compacité :

Couche N° : Côte: Ep.:.....Compacité : Couche N° : Côte: Ep.:.....Compacité :

Couche N° : Côte: Ep.:.....Compacité : Couche N° : Côte: Ep.:.....Compacité :

Date de soumission : 13/06/1997

Demande effectuée par : M. GAME

Demande reçue par : M. Sirois Date : 13/6/97

Commentaires :

Contrôlée par : B. Boyer

Signature et Date : [Signature] 16/06/97

Remarques : ELEV. OK. LARGEUR OK.

Approuvée: X

Non Approuvée :

[Signature] 16-06-97 18:00

GROUPEMENT FOUGEROLLE C.S.E

BARRAGE AL-BASSAM DE NIANDOUBA

FICHE D'EXECUTION No: **DIV 17**

CHANTIER: **Barrage de Niandouba** No: _____

DEFINITION DE L'OUVRAGE:	Piste d'accès (bassin de dissipation)		
PLAN D'EXECUTION:	COFFRAGE No: 208	INDICE: C	
	ACIER No: 209	INDICE: A	

POINT CRITIQUE EVENTUEL:	OUI:	NON:
OBJET:	<i>Treillis doit être mis en place dans béton frais, demandez qu'il soit réceptionné sur place après la coulé</i>	

RECEPTION FERRAILLAGE:	DATE: 14/06/1997	VISA CHEF DE PROJET
11 HA 12 au 2,00m manquant sur la face des Sums cf. plan 209		<i>P.O.</i>
<i>détail sur piste</i>		

COFFRAGES:	ASPECT PAREMENT:	VISA CHEF DE CHANTIER
	DEMOULANT:	BON A BETONNER
	INCORPORATION:	
	DATE: 14/06/1997	

BETONNAGE	TYPE DE BETON classe I	MALAXEUR: Dumper Sambton
	MOYENS BENNE:	
	Nbre VIBREURS: 3	VALOCHE: + balai
	SURFACAGE: REGLE:	
	CURE:	
	DATE: 14/06/1997	VISA CHEF DE CHANTIER

PRELEVEMENTS:	ENTREPRISE:	MAÎTRE D'OEUVRE	Nbre: 12
	RESULTATS:		

POINT CRITIQUE:	OBSERVATIONS:				
OBJET:	Vu ok. A.B.				
LEVE LE:	Ferrailage achevé à terminer!				
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;">CONTRÔLE EXTERNE</td> <td style="width: 50%;">CONTRÔLE INTERNE</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;"><i>[Signature]</i></td> </tr> </table>	CONTRÔLE EXTERNE	CONTRÔLE INTERNE		<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
CONTRÔLE EXTERNE	CONTRÔLE INTERNE				
	<i>[Signature]</i>				

CONFORMITE D'EXECUTION		
VISA CONTRÔLE EXTERNE	FOUGEROLLE C.S.E	MAÎTRE D'OEUVRE
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	

14/06/97 14:00

GROUPEMENT FOUGEROLLE/C.S.E.

BARRAGE AL BASSAM DE NIANDOUBA

DEMANDE D'APPROBATION N° Div 16

Date et heure d'activité : 13/06/1997

Item à vérifier : Pose des gabions jumbo de la piste d'accès

Localisation : Piste d'accès (bassin de dissipation) : entre chaînes
0+476 et 0+496

Date de soumission : 13/06/1997

Demande effectuée par : M. OUYE

Demande reçue par : M. Sirois Date : 13/6/97

Commentaires :
.....
.....
.....
.....

Contrôlée par : B. BOYER

Signature et Date : Bertand Boyer 14/06/97 14:00

Remarques : LEVÉ TOPO. FAIT 0+476 À 0+518 INCLUS.
- MISE EN PLACE DES GABIONS CORRECTE.
- LIQATURES MANQUANTES DE TOUTS LES DIAPHRAGMES À FAIRE
AVANT LA COULÉE DU BÉTON

Approuvée :

Non Approuvée :

RÉCEPTION REFUSÉE
PAR ERIC PÉLOQUIN MARC SIROIS
[Signature]

GROUPEMENT FOUGEROLLE/C.S.E.

BARRAGE AL BASSAM DE NIANDOUBA

DEMANDE D'APPROBATION N°... **DR18** ...

DEFINITION DE L'OUVRAGE : DRAIN entre PK **0+739** et PK **0+749**

Déblai d'excavation

Date et heure d'activité : **13/06/1997 13h** Résultat : **OK - voir commentaire**

Géotextile

Date et heure d'activité : **14/06/1997** Résultat :

Enrochements

Date et heure d'activité : Résultat :

Remblai sable pour filtre

Date et heure d'activité : **14/06/1997** Résultat :

Couche N° : Côte: Ep.:.....Compacité : Couche N° : Côte: Ep.:.....Compacité :

Couche N° : Côte: Ep.:.....Compacité : Couche N° : Côte: Ep.:.....Compacité :

Couche N° : Côte: Ep.:.....Compacité : Couche N° : Côte: Ep.:.....Compacité :

Couche N° : Côte: Ep.:.....Compacité : Couche N° : Côte: Ep.:.....Compacité :

Couche N° : Côte: Ep.:.....Compacité : Couche N° : Côte: Ep.:.....Compacité :

Couche N° : Côte: Ep.:.....Compacité : Couche N° : Côte: Ep.:.....Compacité :

Couche N° : Côte: Ep.:.....Compacité : Couche N° : Côte: Ep.:.....Compacité :

Couche N° : Côte: Ep.:.....Compacité : Couche N° : Côte: Ep.:.....Compacité :

Date de soumission : **13/06/1997**

Demande effectuée par : **M. GAYE**

Demande reçue par : **M. Siros** Date : **13/6/97**

Commentaires : **Le géotextile existant au PK 0+739 doit être dégagé soigneusement afin de permettre un chevauchement d'au moins 50 cm. Visuellement l'excavation du drain est acceptable.**

Contrôlée par : **Maria Juvénat** 13/6/97

Signature et Date :

Remarques :

Approuvée:

Non Approuvée :

GROUPEMENT FOUGEROLLE/C.S.E.

BARRAGE AL BASSAM DE NIANDOUBA

DEMANDE D'APPROBATION N° DIV 15

Date et heure d'activité : 11/06/1997 15^H-00

Item à vérifier : Dragage des talus amont ch. 1+200 → 1+250

Localisation : Digue entre chainages 1+200 et 1+250

Date de soumission : 10/06/1997

Demande effectuée par : M. GAYE

Demande reçue par : B. BOYER Date : 10/06/97

Commentaires :

Contrôlée par : B. BOYER

Signature et Date : B. Boyer 11/06/97 18:45

Remarques : RIEN À SIGNALER -

Approuvée:

Non Approuvée:

GROUPEMENT FOUGEROLLE/C.S.E.

BARRAGE AL BASSAM DE NIANDOUBA

DEMANDE D'APPROBATION N° DRA17

DEFINITION DE L'OUVRAGE : DRAIN entre PK 0+748,76 et PK 0+761

Déblai d'excavation : Date et heure d'activité : 11/06/1997-15H Résultat :

Géotextile : Date et heure d'activité : Résultat :

Enrochements : Date et heure d'activité : Résultat :

Remblai sable pour filtre : Date et heure d'activité : 11/06/1997-15H Résultat :

Couche N° : Côte: Ep.:.....Compacité : Couche N° : Côte: Ep.:.....Compacité :

Couche N° : Côte: Ep.:.....Compacité : Couche N° : Côte: Ep.:.....Compacité :

Couche N° : Côte: Ep.:.....Compacité : Couche N° : Côte: Ep.:.....Compacité :

Couche N° : Côte: Ep.:.....Compacité : Couche N° : Côte: Ep.:.....Compacité :

Couche N° : Côte: Ep.:.....Compacité : Couche N° : Côte: Ep.:.....Compacité :

Couche N° : Côte: Ep.:.....Compacité : Couche N° : Côte: Ep.:.....Compacité :

Couche N° : Côte: Ep.:.....Compacité : Couche N° : Côte: Ep.:.....Compacité :

Couche N° : Côte: Ep.:.....Compacité : Couche N° : Côte: Ep.:.....Compacité :

Date de soumission : 10/06/1997-

Demande effectuée par : M. GAYE

Demande reçue par : B. BOYER Date : 10/06/97

Commentaires :

Contrôlée par : B. BOYER

Signature et Date : B. Boyer 11/06/97 19:00

Remarques : RIEN A SIGNALER.

Approuvée: X

Non Approuvée :

GROUPEMENT FOUGEROLLE/C.S.E.

BARRAGE AL BASSAM DE NIANDOUBA

DEMANDE D'APPROBATION N° DIV 14.

Date et heure d'activité : 10/06/1997 - 10^H-00

Item à vérifier : Dressage des talus amont chaînage 1+200 au
chaînage 1+250.

Localisation : Digue entre chaînages 1+200 et 1+235

Date de soumission : 09/06/1997

Demande effectuée par : M. GAYE *[Signature]*

Demande reçue par : *[Signature]* Date : 9/6/97

Commentaires :

Contrôlée par : B. BOYER

Signature et Date : *[Signature]* 10/06/97

Remarques : L'EQUIPE TOPO. DU CONTRÔLE
ÉTAIT SUR PLACE DE 10:00 AM. À MIDI -
RIEN N'A PU ÊTRE RÉCEPTIONNÉ PARCE
QUE RIEN N'ÉTAIT PRÊT. NOUS DEMANDONS
LA COLLABORATION DE L'ENTREPRENEUR AFIN
QUE NOUS PUISSIONS FONCTIONNER CORRECTEMENT.

Approuvée: Non Approuvée:

[Signature] 10/06/97

GROUPEMENT FOUGEROLLE/C.S.E.

BARRAGE AL BASSAM DE NIANDOUBA

DEMANDE D'APPROBATION N° DIV.13

Date et heure d'activité : 09/06/1997 - 8^H - 00

Item à vérifier : Dredage des talus amont chainage 1+175 → 1+200

Localisation : Digue entre chainage 1+175 et 1+200 (amont)

Date de soumission : 07/06/1997

Demande effectuée par : M. GAYE

Demande reçue par : Mauro Steini Date : 7/6/97

Commentaires :

Contrôlée par : B. BOYER

Signature et Date : B. Boyer 09/06/97 9:45

Remarques : ATTENTION - SURLARGEUR A LA LIMITE DE LA TOLERANCE (50 CM) - VOIR A NE PAS EXCÉDER -

Approuvée : X

Non Approuvée :

LEVES TOPO. FAITS LE 09 JUIN 1997.

LEVE REPROFILAGE TALUS AMONT CH. 1+200.

CH.	#PNT	NORD (Y)	EST (X)	ELEVATION	DESCRIPTION	O/S LEVE/PLAN
1+200	15060	1425220.55	613173.94	28.964	TA	14.06/13.53
	15061	1425222.15	613172.85	28.159	TA	16.00/15.54
	15062	1425223.75	613171.74	27.344	TA	17.94/17.58
	15063	1425225.51	613170.62	26.546	TA	20.03/19.58
	15064	1425227.07	613169.55	25.763	BT	21.92/21.53
	15065	1425229.12	613168.16	25.842	TN	24.39

NOTE: LE REPROFILAGE DU TALUS AMONT EST ACCEPTE AU CH. 1+200.

GROUPEMENT FOUGEROLLE/C.S.E.

BARRAGE AL BASSAM DE NIANDOUBA

DEMANDE D'APPROBATION N°... DIV 11

Date et heure d'activité : 06/06/1997 - 11^H - 00

Item à vérifier : Dressage des talus amont PK 1+150 → 1+175

Localisation : Digue entre chainages 1+150 et 1+175

Date de soumission : 05/06/1997

Demande effectuée par : M. GAYE 

Demande reçue par : B. BOYER Date : 05/06/97

Commentaires :
.....
.....
.....
.....

Contrôlée par : B. BOYER

Signature et Date :  07/06/97 8:00 AM.

Remarques :
.....
.....
.....
.....

Approuvée:

Non Approuvée:

GROUPEMENT FOUGEROLLE/C.S.E.

BARRAGE AL BASSAM DE NIANDOUBA

DEMANDE D'APPROBATION N°... DR16

DEFINITION DE L'OUVRAGE : DRAIN entre PK 0+761 et PK 0+800

Déblai d'excavation : Date et heure d'activité : Résultat :

Géotextile : Date et heure d'activité : Résultat :

Enrochements : Date et heure d'activité : Résultat :

Remblai sable pour filtre : Date et heure d'activité : 05/06/1997 Résultat :

Couche N° : Côte: Ep.:.....Compacité : Couche N° : Côte: Ep.:.....Compacité :

Couche N° : Côte: Ep.:.....Compacité : Couche N° : Côte: Ep.:.....Compacité :

Couche N° : Côte: Ep.:.....Compacité : Couche N° : Côte: Ep.:.....Compacité :

Couche N° : Côte: Ep.:.....Compacité : Couche N° : Côte: Ep.:.....Compacité :

Couche N° : Côte: Ep.:.....Compacité : Couche N° : Côte: Ep.:.....Compacité :

Couche N° : Côte: Ep.:.....Compacité : Couche N° : Côte: Ep.:.....Compacité :

Couche N° : Côte: Ep.:.....Compacité : Couche N° : Côte: Ep.:.....Compacité :

Couche N° : Côte: Ep.:.....Compacité : Couche N° : Côte: Ep.:.....Compacité :

Date de soumission : 05/06/1997

Demande effectuée par : M. GAYE

Demande reçue par : B. BOYER Date : 05/06/97

Commentaires :

Contrôlée par : B. BOYER

Signature et Date : B. Boyer 05/06/97

Remarques : SABLE GROSSIER VÉRIFIÉ ET APPROUVÉ LE 02/06/97

Au ch. 0+775.

Approuvée: X.....

Non Approuvée :

GROUPEMENT FOUGEROLLE/C.S.E.

BARRAGE AL BASSAM DE NIANDOUBA

DEMANDE D'APPROBATION N° DIV 10

Date et heure d'activité : 03/06/1997. 16^h-00 Demain 8^h00

Item à vérifier : Dressage des talus amont PK1+125 → PK1+175

Localisation : Digue entre chainage 1+125 et 1+175 (amont)

Date de soumission : 03/06/1997

Demande effectuée par : M. GAYE

Demande reçue par : Maïmou Jiré Date : 3/6/97

Commentaires :

Contrôlée par : B. BOYER

Signature et Date : B. Boyer 04/06/97 15:00

Remarques : LE CHAINAGE 1+125 A DÉJÀ ÉTÉ ACCEPTÉ. LE CHAINAGE 1+175 N'EST PAS PRÊT. SEUL LE CHAINAGE 1+150 PEUT ÊTRE RÉCEPTIONNÉ. LE CHAINAGE 1+150 EST ACCEPTÉ.
B. Boyer

Approuvée : ✓ Non Approuvée :

GROUPEMENT FOUGEROLLE/C.S.E.

BARRAGE AL BASSAM DE NIANDOUBA

DEMANDE D'APPROBATION N°... DIV.12

Date et heure d'activité : 05/06/1997

Item à vérifier : Enrochements de protection à l'aval du canal de l'ouvrage de restitution

Localisation : Digue axe du canal de fuite : chainage 0+45 et 0+62

Date de soumission : 05/06/1997

Demande effectuée par : M. GAYE

Demande reçue par : B. BOYER Date : 05/06/97

Commentaires :

Contrôlée par : B. BOYER

Signature et Date : B. BOYER

Remarques : LEVÉ FAIT LE 20 MAI 1997.

Approuvée :

Non Approuvée :

GROUPEMENT FOUGEROLLE/C.S.E.

BARRAGE AL BASSAM DE NIANDOUBA

DEMANDE D'APPROBATION N° Div9...

Date et heure d'activité : 29 Mai 1997 15^H-00

Item à vérifier : Fonds de fouilles pour caniveau en cailloux et gravier latéritiques

Localisation : Digue entre chainage 1+050 et 1+125

Date de soumission : 28/05/1997

Demande effectuée par : M. GAYE

Demande reçue par : M. Sirais Date : 28/5/97

Commentaires :

Contrôlée par : B. BOYER

Signature et Date : B. Boyer 29/05/97 16:00

Remarques :

Approuvée:

Non Approuvée:

GROUPEMENT FOUGEROLLE/C.S.E.

BARRAGE AL BASSAM DE NIANDOUBA

DEMANDE D'APPROBATION N°... **DR15**

DEFINITION DE L'OUVRAGE : DRAIN entre PK **0+577** et PK **0+600**

Déblai d'excavation : Date et heure d'activité : Résultat :

Géotextile : Date et heure d'activité : Résultat :

Enrochements : Date et heure d'activité : **26/05/1997** Résultat :

Remblai sable pour filtre : Date et heure d'activité : Résultat :

Couche N° : Côte: Ep.:.....Compacité : Couche N° : Côte: Ep.:.....Compacité :

Couche N° : Côte: Ep.:.....Compacité : Couche N° : Côte: Ep.:.....Compacité :

Couche N° : Côte: Ep.:.....Compacité : Couche N° : Côte: Ep.:.....Compacité :

Couche N° : Côte: Ep.:.....Compacité : Couche N° : Côte: Ep.:.....Compacité :

Couche N° : Côte: Ep.:.....Compacité : Couche N° : Côte: Ep.:.....Compacité :

Couche N° : Côte: Ep.:.....Compacité : Couche N° : Côte: Ep.:.....Compacité :

Couche N° : Côte: Ep.:.....Compacité : Couche N° : Côte: Ep.:.....Compacité :

Couche N° : Côte: Ep.:.....Compacité : Couche N° : Côte: Ep.:.....Compacité :

Date de soumission : **24/05/1997**

Demande effectuée par : **M. GAYE** *[Signature]*

Demande reçue par : **B. BOYER** Date : **24/05/97**

Commentaires :
.....
.....

Contrôlée par : **B. BOYER**

Signature et Date : *[Signature]* **27/05/97 8:00**

Remarques : **TRAVAUX COMPLETÉS LE 26/05/97 EN FIN DE JOURNÉE.**
.....
.....

Approuvée:

Non Approuvée:

GROUPEMENT FOUGEROLLE/C.S.E.

BARRAGE AL BASSAM DE NIANDOUBA

DEMANDE D'APPROBATION N° DR14

DEFINITION DE L'OUVRAGE : DRAIN entre PK 0+577 et PK 0+600 (raccordement mur gauche)

Déblai d'excavation : Date et heure d'activité : 17/05/97 Résultat :

Géotextile : Date et heure d'activité : Résultat :

Enrochements : Date et heure d'activité : Résultat :

Remblai sable pour filtre : Date et heure d'activité : Résultat :

Couche N° : Côte: Ep.:.....Compacité : Couche N° : Côte: Ep.:.....Compacité :

Couche N° : Côte: Ep.:.....Compacité : Couche N° : Côte: Ep.:.....Compacité :

Couche N° : Côte: Ep.:.....Compacité : Couche N° : Côte: Ep.:.....Compacité :

Couche N° : Côte: Ep.:.....Compacité : Couche N° : Côte: Ep.:.....Compacité :

Couche N° : Côte: Ep.:.....Compacité : Couche N° : Côte: Ep.:.....Compacité :

Couche N° : Côte: Ep.:.....Compacité : Couche N° : Côte: Ep.:.....Compacité :

Couche N° : Côte: Ep.:.....Compacité : Couche N° : Côte: Ep.:.....Compacité :

Couche N° : Côte: Ep.:.....Compacité : Couche N° : Côte: Ep.:.....Compacité :

Date de soumission : 15/05/1997

Demande effectuée par : M. GAYE

Demande reçue par : [Signature] Date : 15/5/97

Commentaires :

Contrôlée par : B. BOYER

Signature et Date : [Signature] 22/05/97

Remarques : SABLE AJOUTÉ AU ch. 0+580 à 0+600.
OK

Approuvée: X

Non Approuvée :

GROUPEMENT FOUGEROLLE/C.S.E.

BARRAGE AL BASSAM DE NIANDOUBA

DEMANDE D'APPROBATION N° DIV8

Date et heure d'activité : 17/05/1997

Item à vérifier : Excavation de la piste d'accès

Localisation : Bassin de dissipation
entre chainages 0+476 et 0+577

Date de soumission : 15/05/1997

Demande effectuée par : M. GAYE

Demande reçue par : M. GAYE

Date : 15/5/97

Commentaires :

Contrôlée par : Bertin Boyer

Signature et Date :

Remarques :

L'EXCAVATION EN AVAL DE L'EVACUATEUR
(POUR LA PISTE) EST ACCEPTÉ DU ch. 0+480 AU
ch. 0+575 INCLUS. DE 17.75.M À 35.0.M DE
L'AXE DU BARRAGE.

Approuvée:

Non Approuvée:

GROUPEMENT FOUGEROLLE/C.S.E.

BARRAGE AL BASSAM DE NIANDOUBA

DEMANDE D'APPROBATION N° DR12

Date et heure d'activité : Mardi 15 Avril 1997

Item à vérifier : Drain sable grossier rive gauche de la zone de la Rivière

Localisation : Digue

Date de soumission : 11/04/1997

Demande effectuée par : M. GAYE

Demande reçue par : B. BOYER

Date : 13/04/97

Commentaires :

Contrôlée par : B. Boyer

Signature et Date : Bertrand Boyer 15/04/97

Remarques : NOUS CONSTATONS DES ECARTS ALTIMÉTRIQUES A PLUSIEURS ENDRITS. POUR LES TOLÉRANCES ET L'APPROBATION VOIR AVEC L'INGÉNIEUR DE CHANTIER (M. SIROIS).

Bertrand Boyer

Approuvée:

Non Approuvée:

GROUPEMENT FOUGEROLLE/C.S.E.

BARRAGE AL BASSAM DE NIANDOUBA

DEMANDE D'APPROBATION N°...DR13

Date et heure d'activité : Mardi 15 Avril 1997

Item à vérifier : Drain cavalier entre ch. 1+175 et 1+350

Localisation : Digue - Zone rivière

Date de soumission : 11/04/1997

Demande effectuée par : M. GAYE

Demande reçue par : B. BOYER Date : 13/04/97

Commentaires :

Contrôlée par : B. BOYER

Signature et Date : *Bertal Boyer* 21/04/97

Remarques : CHANTIER FERMÉ DU 14 AVRIL AU 20 AVRIL 1997 POUR FÊTE TABASKI (VOIR NOTE DE SERVICE INTERNE CSE-FOUGEROLLE).

Approuvée: Non Approuvée:

GROUPEMENT FOUGEROLLE/C.S.E.

BARRAGE AL BASSAM DE NIANDOUBA

DEMANDE D'APPROBATION N° DI13

Date et heure d'activité : 06/04/1997

Item à vérifier : Dressage des talus aval

Localisation : Digue : entre PK 0+975 et 1+125

Date de soumission : 06/04/1997

Demande effectuée par : M. GAIE Hg

Demande reçue par : B. BOYER Date : 07/04/97

Commentaires :

Contrôlée par : B. BOYER

Signature et Date : Bentel Boyer 08/04/97

Remarques : TRAVAUX ACCEPTÉS JUSQU'À 1+100 INCLUS.
Ch. 1+125 À CORRIGER (LÉGÈREMENT).

Approuvée :

Non Approuvée :

0+975 À 1+100 INCLUS.

B. Boyer

GROUPEMENT FOUGEROLLE/C.S.E.

BARRAGE AL BASSAM DE NIANDOUBA

DEMANDE D'APPROBATION N° DIV5

Date et heure d'activité : 06/04/1997

Item à vérifier : Déblai d'excavation et dressage des talus

Localisation : Canal de fuite de l'ouvrage de restitution - Zone des
enrichissements de protection (aval)

Date de soumission : 06/04/1997

Demande effectuée par : M. GAYE

Demande reçue par : B. BOYER Date : 07/04/97

Commentaires :

Contrôlée par : B. BOYER

Signature et Date : Bernard Boyer 07/04/97

Remarques : PARTIE CONTRÔLÉE 46M. À 62M. DE
L'AXE DU BARRAGE.

Approuvée:

Non Approuvée:

GROUPEMENT FOUGEROLLE/C.S.E.

BARRAGE AL BASSAM DE NIANDOUBA

DEMANDE D'APPROBATION N° DR3 bis

DEFINITION DE L'OUVRAGE : DRAIN entre PK 0+700 .. et PK 0+739.....

Déblai d'excavation : Date et heure d'activité : Résultat :

Géotextile : Date et heure d'activité : 05/04/1997 Résultat :

Enrochements : Date et heure d'activité : 05/04/1997 Résultat :

Remblai sable pour filtre : Date et heure d'activité : 05/04/1997 Résultat :

Couche N° : Côte: Ep.:.....Compacité : Couche N° : Côte: Ep.:.....Compacité :

Couche N° : Côte: Ep.:.....Compacité : Couche N° : Côte: Ep.:.....Compacité :

Couche N° : Côte: Ep.:.....Compacité : Couche N° : Côte: Ep.:.....Compacité :

Couche N° : Côte: Ep.:.....Compacité : Couche N° : Côte: Ep.:.....Compacité :

Couche N° : Côte: Ep.:.....Compacité : Couche N° : Côte: Ep.:.....Compacité :

Couche N° : Côte: Ep.:.....Compacité : Couche N° : Côte: Ep.:.....Compacité :

Couche N° : Côte: Ep.:.....Compacité : Couche N° : Côte: Ep.:.....Compacité :

Couche N° : Côte: Ep.:.....Compacité : Couche N° : Côte: Ep.:.....Compacité :

Date de soumission : 06/04/1997.....

Demande effectuée par : M. GAME *[Signature]*.....

Demande reçue par : B. BOYER..... Date : 07/04/97

Commentaires :

Contrôlée par : B. BOYER.....

Signature et Date : Bertal Boyer 07/04/97.....

Remarques : LEVÉ FAIT LE 02/04/97......

Approuvée:

Non Approuvée :

GROUPEMENT FOUGEROLLE/C.S.E.

BARRAGE AL BASSAM DE NIANDOUBA

DEMANDE D'APPROBATION N° DIV4

Date et heure d'activité : 07/04/1997

Item à vérifier : Dressage des talus (en vue semblai contre fondations)

Localisation : Ouvrage de restitution

Date de soumission : 06/04/1997

Demande effectuée par : M. GAHE-ff

Demande reçue par : B. BOYER

Date : 07/04/97

Commentaires :

Contrôlée par : B. BOYER

Signature et Date :

Remarques :

LES TALUS FAITS SONT CORRECTS.
QUELQUES TALUS SONT À FAIRE: (GAUCHE ET
DROITE PRÈS DES MURETS AVALS DE L'OUVRAGE).
TALUTAGE DE LA TRANCHÉE À DROITE DE L'OUVRAGE
EN AVAL À FAIRE AUSSI. Nettoyage du fond des
excavations à compléter (près de l'ouvrage).

Approuvée:

Non Approuvée:

Mano Gira

GROUPEMENT FOUGEROLLE/C.S.E.

BARRAGE AL BASSAM DE NIANDOUBA

DEMANDE D'APPROBATION N°

cl 2

DEFINITION DE L'OUVRAGE : CLE DE LA DIGUE entre PK 1+180 et PK 1+286

Déblais d'excavation : Date et heure d'activité : 13/03/1997 Résultat :

Traitement fond fouilles : Date et heure d'activité : Résultat :

Remblai alluvionnaire : Date et heure d'activité : Résultat :

Couche N° : Côte: Ep.:.....Compacité : Couche N° : Côte: Ep.:.....Compacité :

Couche N° : Côte: Ep.:.....Compacité : Couche N° : Côte: Ep.:.....Compacité :

Couche N° : Côte: Ep.:.....Compacité : Couche N° : Côte: Ep.:.....Compacité :

Couche N° : Côte: Ep.:.....Compacité : Couche N° : Côte: Ep.:.....Compacité :

Couche N° : Côte: Ep.:.....Compacité : Couche N° : Côte: Ep.:.....Compacité :

Couche N° : Côte: Ep.:.....Compacité : Couche N° : Côte: Ep.:.....Compacité :

Couche N° : Côte: Ep.:.....Compacité : Couche N° : Côte: Ep.:.....Compacité :

Couche N° : Côte: Ep.:.....Compacité : Couche N° : Côte: Ep.:.....Compacité :

Date de soumission : 13/03/1997

Demande effectuée par : M. GAYE

Demande reçue par : B. BOYER Date : 14/03/97

Commentaires : VOIR DOCUMENTS JOINTS

Contrôlée par : B. BOYER

Signature et Date : Bentha Boyer 14/03/97

Remarques : VOIR DOCUMENTS JOINTS

Approuvée:

Non Approuvée :

Rem le 14/03/1997

Client: SODAGRI	Projeté par: B. BOYER	Date: 97/03/14	Page de 1 1
Projet: ANAMBE TI - NIANDOUBA	Véifié par:	Date:	Lot:
Sujet: CLEF 1+180 À 1+286	Dessin de référence:	N°:	

SUITE À VOTRE DEMANDE DE RÉCEPTION DE LA CLEF Du ch. 1+180 À 1+286... DATÉE DU 13/03/97, VEUILLEZ PRENDRE RÉCEPTION DES FEUILLES DE LEVÉS TOPO. Du 23-12-96 À AUJOURD'HUI - (CES FEUILLES VOUS ONT ÉTÉ TRANSMISES QUOTIDIENNEMENT).

— Vous constaterez que LES LEVÉS D'EXCAVATION DE LA CLEF ONT ÉTÉ EFFECTUÉS SELON LES BESOINS AU FUR ET À MESURE DE L'AVANCEMENT DES TRAVAUX.

— Nous considérons que POUR TOUS LES TRAVAUX D'EXCAVATION, TOUTES LES INFORMATIONS ONT ÉTÉ REÇUEILLIES ENTRE LES Ch. 1+180 ET 1+350.

Vous trouverez d'ailleurs dans les feuilles de levés jointes toutes les informations pertinentes. Si pour une quelconque raison, vous considérez ces informations comme incomplètes ou incorrectes, nous vous prions de nous en aviser avant le 22 MARS 1997, après quoi ces données seront considérées comme uniques et définitives.

GROUPEMENT FOUGEROLLE/C.S.E.

BARRAGE AL BASSAM DE NIANDOUBA

DEMANDE D'APPROBATION N° DIV 1

Date et heure d'activité : 13/03/1997

Item à vérifier : drainage des talus du PK 1+000 → 1+100
: drainage banquettes (pied de talus) : 1+000 → 1+175
↓ 15 m

Localisation : Digue

Date de soumission : 13/03/1997

Demande effectuée par : M. GAYE

Demande reçue par : B. BOYER Date : 14/03/97

Commentaires : Voir DOCUMENTS JOINTS -

Contrôlée par : B. BOYER

Signature et Date : Bertrand Boyer 14/03/97

Remarques : Voir DOCUMENTS JOINTS -

Approuvée :

Non Approuvée :

Regu le 14/03/1997



Client: SODAGRI	Projeté par: B. BOYER	Date: 97/03/14	Page de 1 1
Projet: ANAMBE II - NIANDOUBA	Véifié par:	Date:	Lot:
Sujet: REPRISSE TALUS AMONT 1+100 A 1+175	Dessin de référence:	N°:	

SUITE A VOTRE DEMANDE DE RECEPTION DU TALUS AMONT ch. 1+000 A 1+175 -- DATEE DU 13/03/97, VEUILLEZ PRENDRE RECEPTION DES FEUILLES DE LEVÉS TOPO. DU 23-12-96 A AUJOURD'HUI - (CES FEUILLES VOUS ONT DÉJÀ ÉTÉ TRANSMISES QUOTIDIENNEMENT).

- VOUS CONSTATEREZ QU'UN LEVÉ TOPO. DATÉ DU 23/12/96 VOUS INFORME D'UNE SURLARGEUR EXCESSIVE DU REMBLAI DU CH 0+800 A 0+975.
- UN LEVÉ DATÉ DU 05/03/97 VOUS INFORME D'UNE SUREXCAVATION IMPORTANTE DANS LE REPROFILAGE DU TALUS DU CH. 0+825 A 0+975. (SUITE A CE LEVÉ, UN REMPLISSAGE EN BÉTON LATÉRITIQUE EST NÉCESSAIRE DANS LA ZONE VISÉE).
- UN LEVÉ DATÉ DU 08/03/97 CONFIRME LA CONFORMITÉ DE LA REPRISSE EN BÉTON DANS LA ZONE TRAVAILLÉE ET LA PRÉCISION DES PIQUETS TOPO. CE LEVÉ SE SITUE DU CH. 0+850 A 1+150.
- UN LEVÉ DATÉ DU 12 MARS 1997 CONFIRME LA RECEPTION DU REMBLAI BÉTONNÉ DU CH. 0+850 A 0+900 ET DU REMBLAI TERRASSÉ DU CH. 1+000 A 1+175.
- * VOTRE DEMANDE DE RECEPTION EST DONC DÉSUÈTE.

GROUPEMENT FOUGEROLLE/C.S.E.

BARRAGE AL BASSAM DE NIANDOUBA

DEMANDE D'APPROBATION N° DR10

DEFINITION DE L'OUVRAGE : DRAIN entre PK 1+200 et PK 1+400

excavation : 1+400 -> 1+200
Sable : 1+400 -> 1+350
Maellons : 1+400 -> 1+320

Déblai d'excavation : Date et heure d'activité : 13/03/1997 Résultat :

Géotextile : Date et heure d'activité : Résultat :

Enrochements : Date et heure d'activité : Résultat :

Remblai sable pour filtre : Date et heure d'activité : Résultat :

Couche N° : Côte: Ep.:.....Compacité : Couche N° : Côte: Ep.:.....Compacité :
Couche N° : Côte: Ep.:.....Compacité : Couche N° : Côte: Ep.:.....Compacité :
Couche N° : Côte: Ep.:.....Compacité : Couche N° : Côte: Ep.:.....Compacité :
Couche N° : Côte: Ep.:.....Compacité : Couche N° : Côte: Ep.:.....Compacité :
Couche N° : Côte: Ep.:.....Compacité : Couche N° : Côte: Ep.:.....Compacité :
Couche N° : Côte: Ep.:.....Compacité : Couche N° : Côte: Ep.:.....Compacité :
Couche N° : Côte: Ep.:.....Compacité : Couche N° : Côte: Ep.:.....Compacité :
Couche N° : Côte: Ep.:.....Compacité : Couche N° : Côte: Ep.:.....Compacité :

Date de soumission : 13/03/1997

Demande effectuée par : M. GAYE

Demande reçue par : B. Boyer Date : 14/03/97

Commentaires : VOIR DOCUMENTS JOINTS

Contrôlée par : B. BOYER

Signature et Date : B. Boyer 14/03/97

Remarques : VOIR DOCUMENTS JOINTS

Approuvée:

Non Approuvée :

Recu le 14/03/1997 Jfj

Client: SODAGRI	Projeté par: B. BOYER	Date: 97/03/14	Page de 1 1
Projet: ANAMBE II - NIANDOUBA	N°:	Vérifié par:	Date: Lot:
Sujet: RÉCEPTION DRAIN 1+200 - 1+400	Dessin de référence:		N°:

SUITE À VOTRE DEMANDE DE RÉCEPTION DU DRAIN ch. 1+200 À 1+400 -- DATÉE DU 13/03/97, VEUILLEZ PRENDRE RÉCEPTION DES FEUILLES DE LEVÉS TOPO. DU 23-12-96 À AUJOURD'HUI.

VOUS TROUVEREZ DANS CES DOCUMENTS TOUTE L'INFORMATION CONCERNANT LES RÉCEPTIONS POUR L'EXCAVATION ET LA MISE EN PLACE DU SABLE GROSSIER DU DRAIN. VOUS TROUVEREZ AUSSI L'INFORMATION CONCERNANT LES TRAVAUX REFUSÉS.

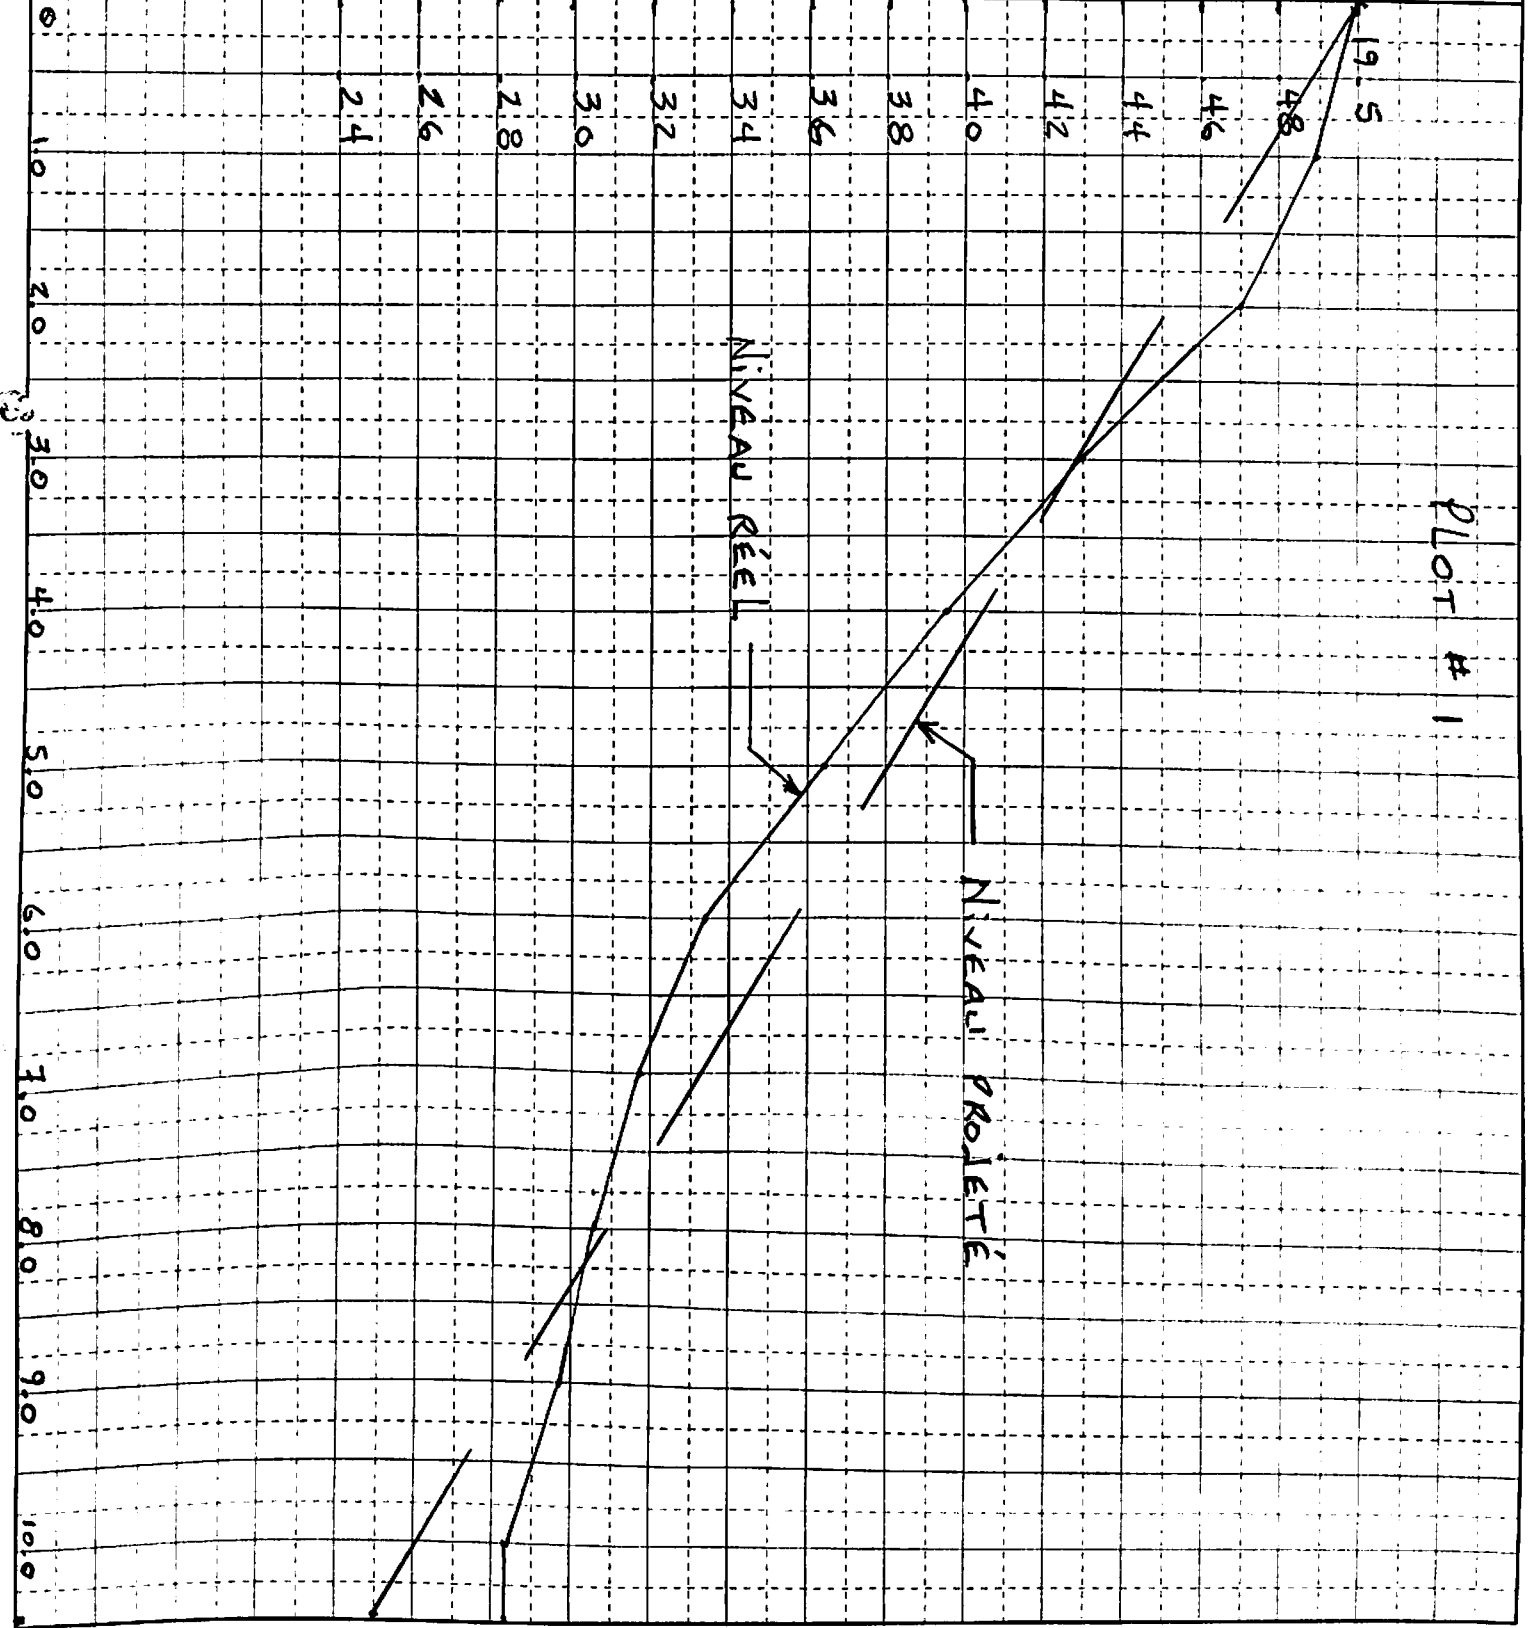
VOUS POURREZ AINSI CONSTATER QUE PRATIQUEMENT AUCUN OUVRAGE N'A PU ÊTRE RÉCEPTIONNÉ À LA 1^{ère} OCCASION. POUR DES RAISONS NÉBULEUSES, TOUT TRAVAIL SEMBLE DEVOIR ÊTRE D'ABORD REFUSÉ AVANT D'ÊTRE EXÉCUTÉ CORRECTEMENT À LA 2^e OU 3^e REPRISE.

LA MISE EN PLACE DES MOELLONS N'A PAS ENCORE ÉTÉ RÉCEPTIONNÉE. PUISQUE AUCUNE DEMANDE (VERBALE) N'A ÉTÉ FAITE À CE JOUR.


— L'EXCAVATION DU DRAIN EST À CE JOUR ACCEPTÉE EN ENTIER DU CH 1+200 À 1+400.

— LE SABLE GROSSIER EST ACCEPTÉ DU CH. 1+240 À 1+400; LES TRAVAUX DE REPRISE N'ÉTANT PAS COMPLÉTÉS DU CH 1+200 À 1+240-

Client: SODAGRI	Projeté par: B. BOYER	Date: 97/01/28	Page de
Projet: ANAMBE II	N°: 5596	Véifié par:	Date:
Sujet: NIAN DOUBA - LEVÉ BÉTON DU RADIER PLOT #1 - OUV. DE RESTITUTION		Dessin de référence:	N°:




Client: SODAGRI	Projeté par: B. BOYER	Date: 97/01/28	Page de
Projet: ANAMBE II	N°: 5596	Vérfifié par:	Date:
Sujet: NIANDOUBA - LEVÉ BÉTON DU RADIER PLOT #3 - OUV. DE RESTITUTION	Dessin de référence:		N°:

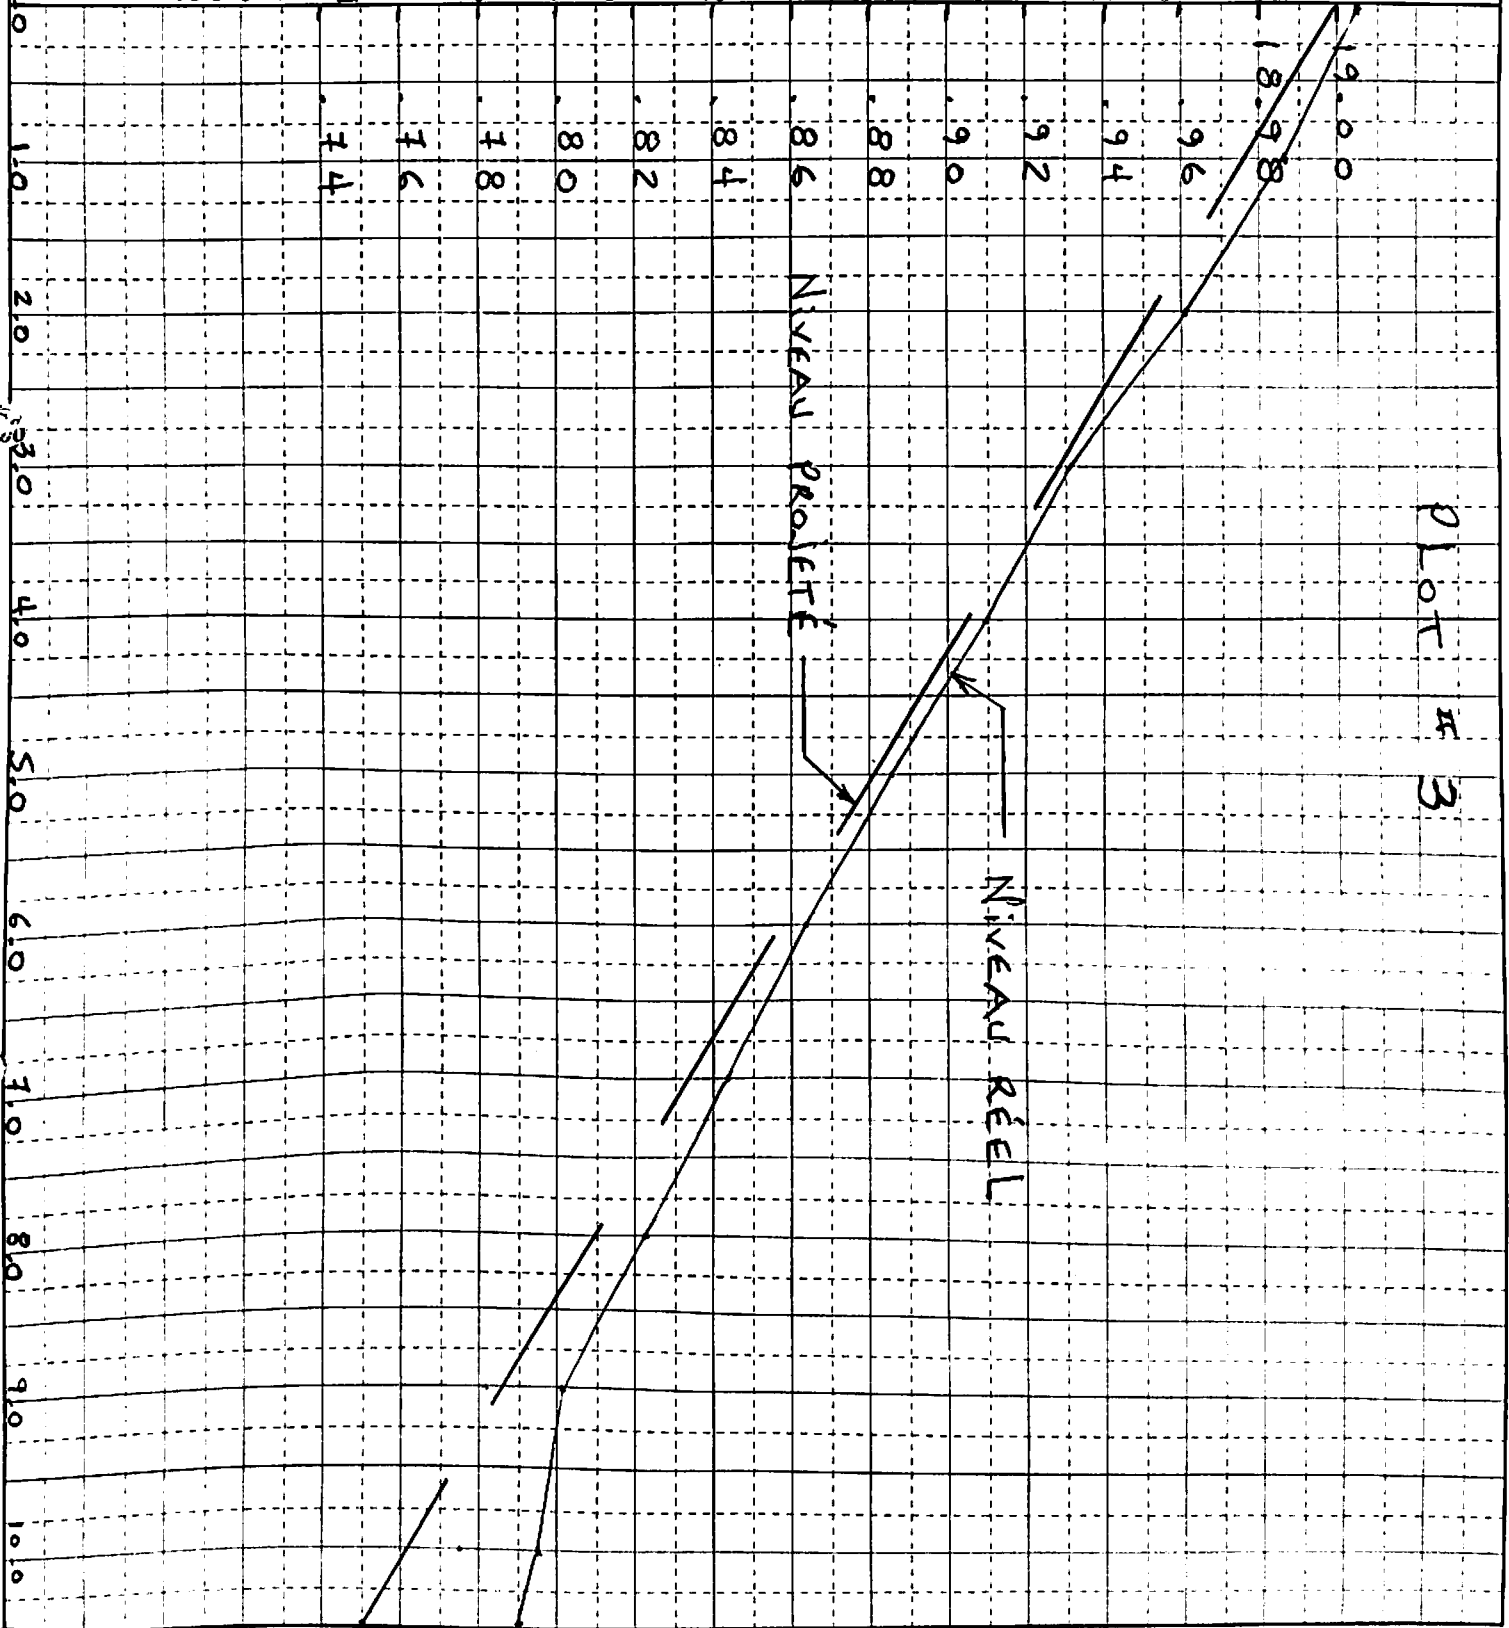


PLOT # 3


Client: SODAGRI	Projeté par: B. BOYER	Date: 97/01/28	Page de
Projet: ANAMBE II	N°: 5596	Véifié par:	Lot:
Sujet: NIANDOUBA - LEVÉ BÉTON DU RADIER PLOT #4 - OUV. DE RESTITUTION	Dessin de référence:		N°:

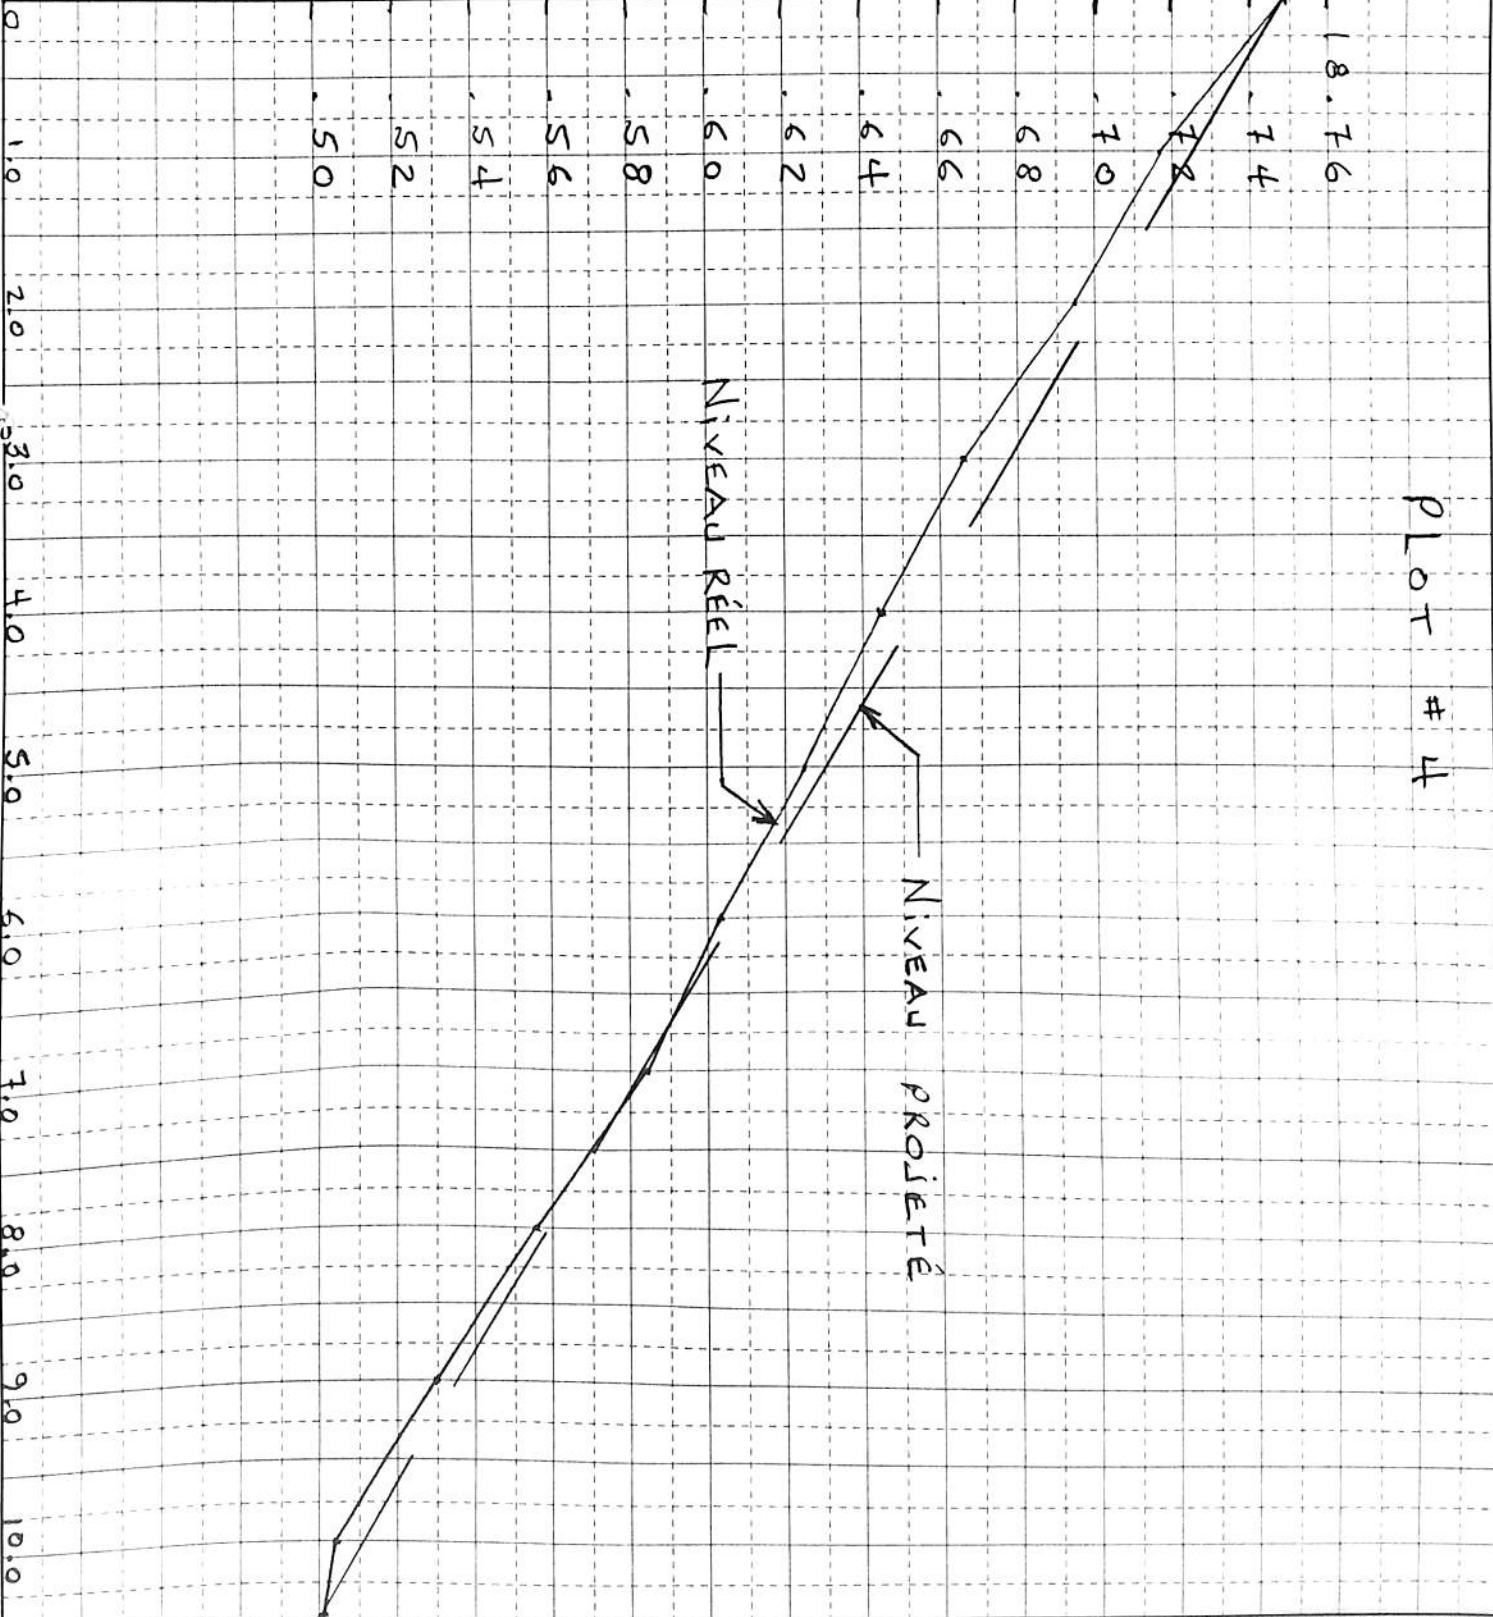

Client: SODAGRI		Projeté par: B. BOYER	Date: 97/01/28	Page de
Projet: ANAMBE II		Véifié par:	Date:	Lot:
N°: 5596		Dessin de référence:		N°:
Sujet: NIAN DOUBA - LEVÉ BÉTON DU RADIER PLOT #1 - OUV. DE RESTITUTION				

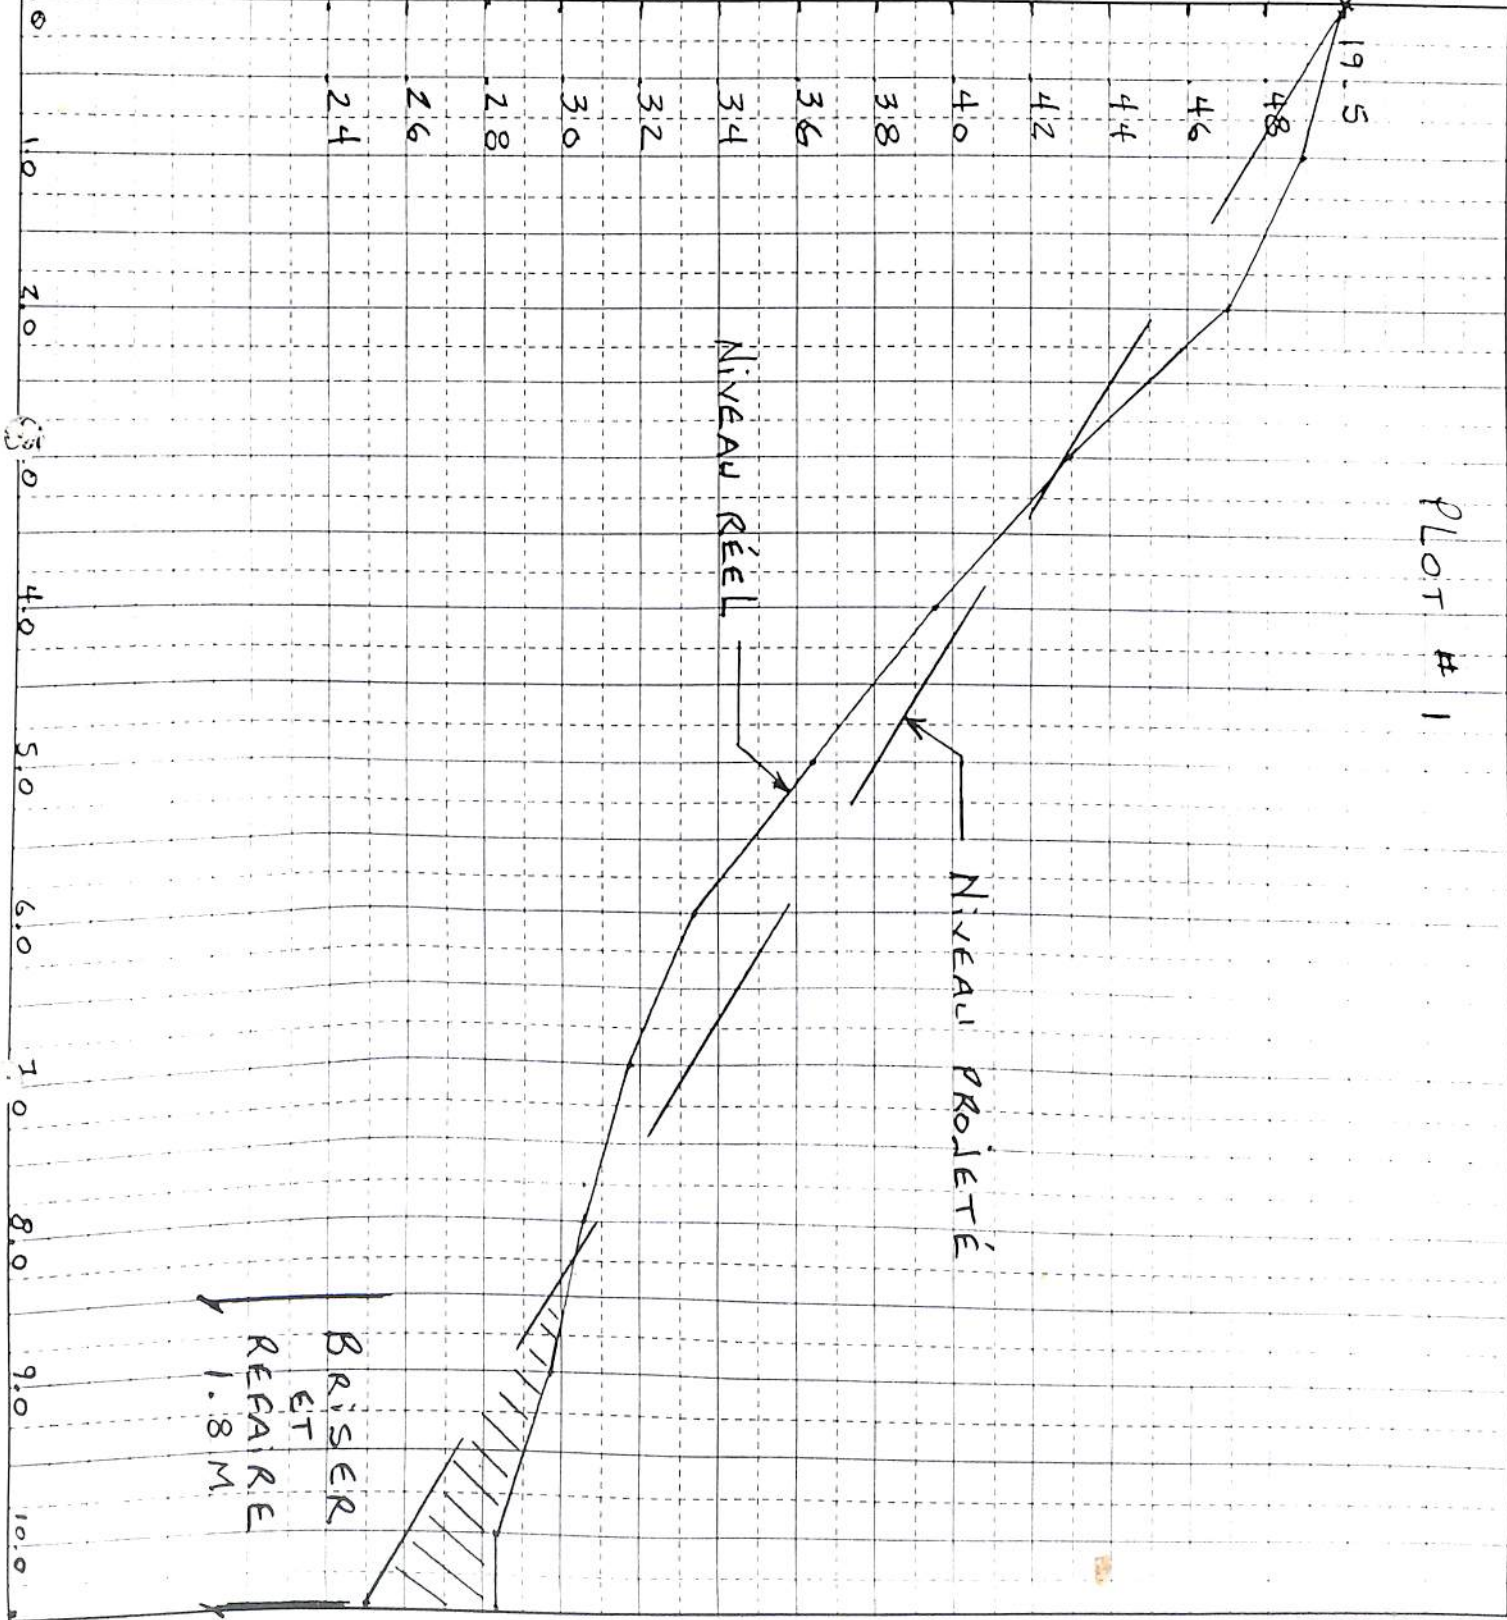


Client: SODAGRI	Projeté par: B. BOYER	Date: 97/01/28	Page de
Projet: ANAMBE II	N°: 5596	Vérifié par:	Lot:
Sujet: NIANDOUBA - LEVÉ BÉTON DU RADIER PLOT #3 - Ouv. DE RESTITUTION	Dessin de référence:	N°:	

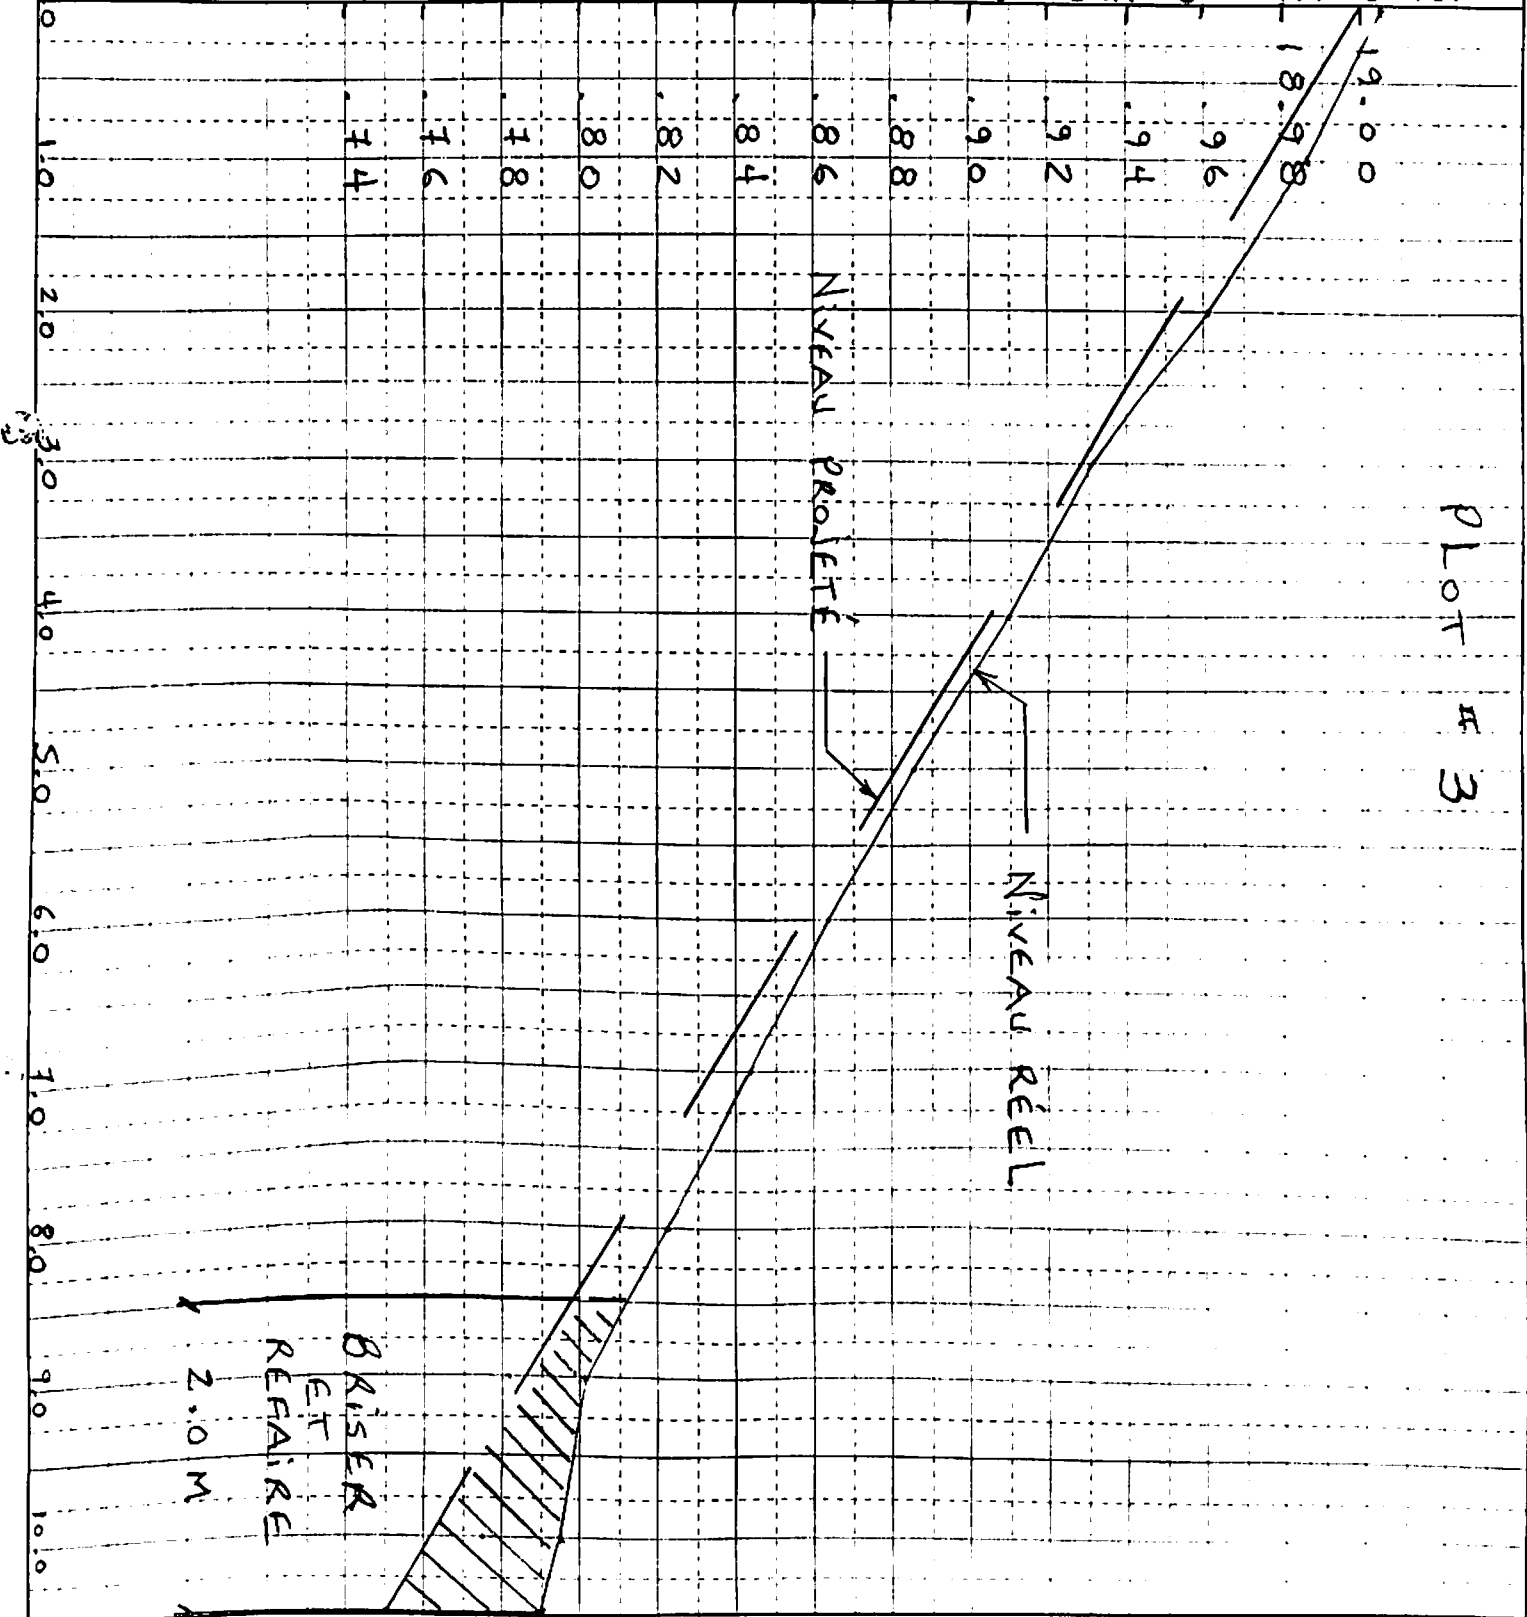



Client: SODAGRI	Projeté par: B. BOYER	Date: 97/01/28	Page de
Projet: ANAMBE II	N°: 5596	Vérfifié par:	Lot:
Sujet: NIANDOUBA - LEVÉ BÉTON DU RADIER PLOT #4 - OUV. DE RESTITUTION	Dessin de référence:	N°:	

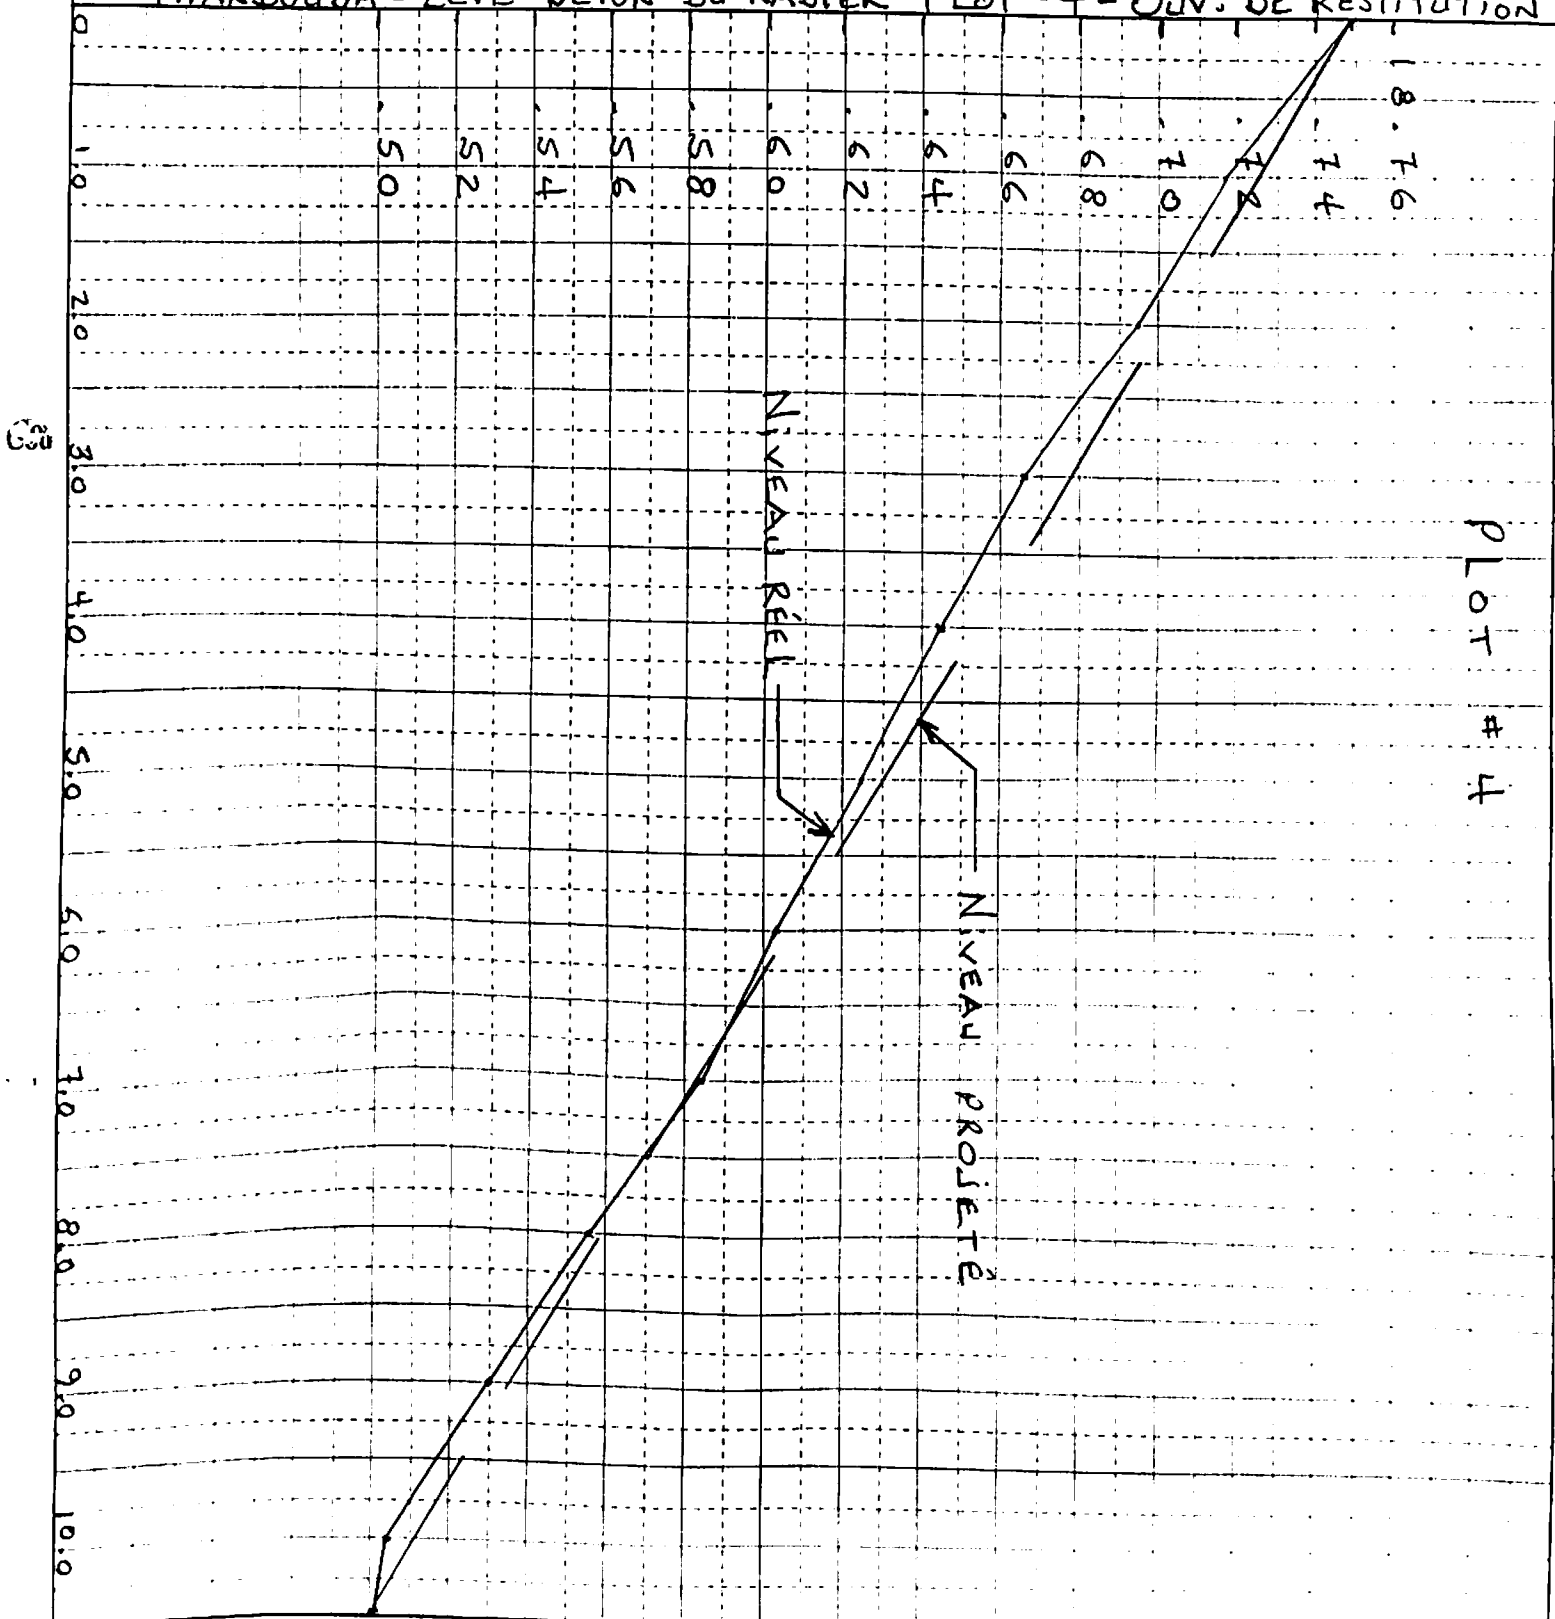

GROUPEMENT FOUGEROLLE/C.S.E.

BARRAGE AL BASSAM DE NIANDOUBA

DEMANDE D'APPROBATION N° DR8

DEFINITION DE L'OUVRAGE : DRAIN entre PK 0+650 et PK 0+695

Déblai d'excavation : Date et heure d'activité : Résultat :

Géotextile : Date et heure d'activité : Résultat :

Enrochements : Date et heure d'activité : 28/01/1997 Résultat :

Remblai sable pour filtre : Date et heure d'activité : Résultat :

Couche N° : Côte: Ep.:.....Compacité :Couche N° : Côte: Ep.:.....Compacité :

Couche N° : Côte: Ep.:.....Compacité :Couche N° : Côte: Ep.:.....Compacité :

Couche N° : Côte: Ep.:.....Compacité :Couche N° : Côte: Ep.:.....Compacité :

Couche N° : Côte: Ep.:.....Compacité :Couche N° : Côte: Ep.:.....Compacité :

Couche N° : Côte: Ep.:.....Compacité :Couche N° : Côte: Ep.:.....Compacité :

Couche N° : Côte: Ep.:.....Compacité :Couche N° : Côte: Ep.:.....Compacité :

Couche N° : Côte: Ep.:.....Compacité :Couche N° : Côte: Ep.:.....Compacité :

Couche N° : Côte: Ep.:.....Compacité :Couche N° : Côte: Ep.:.....Compacité :

Couche N° : Côte: Ep.:.....Compacité :Couche N° : Côte: Ep.:.....Compacité :

Date de soumission : 28/01/1997

Demande effectuée par : M. GAHE

Demande reçue par : B. BOYER Date : 28/01/97

Commentaires :

Contrôlée par : B. Boyer

Signature et Date : 28/01/97

Remarques : COTÉ INTERIEUR SEULEMENT.

Approuvée: X

Non Approuvée :

GROUPEMENT FOUGEROLLE/C.S.E.

BARRAGE AL BASSAM DE NIANDOUBA

DEMANDE D'APPROBATION N° DR7

DEFINITION DE L'OUVRAGE : DRAIN entre PK 0+600 et PK 0+650

Déblai d'excavation : Date et heure d'activité : 27/01/1997 Résultat :

Géotextile : Date et heure d'activité : 27/01/1997 Résultat :

Enrochements : Date et heure d'activité : 27/01/1997 Résultat :

Remblai sable pour filtre : Date et heure d'activité : 27/01/1997 Résultat :

Couche N° : Côte: Ep.: Compacité : Couche N° : Côte: Ep.: Compacité :

Couche N° : Côte: Ep.: Compacité : Couche N° : Côte: Ep.: Compacité :

Couche N° : Côte: Ep.: Compacité : Couche N° : Côte: Ep.: Compacité :

Couche N° : Côte: Ep.: Compacité : Couche N° : Côte: Ep.: Compacité :

Couche N° : Côte: Ep.: Compacité : Couche N° : Côte: Ep.: Compacité :

Couche N° : Côte: Ep.: Compacité : Couche N° : Côte: Ep.: Compacité :

Couche N° : Côte: Ep.: Compacité : Couche N° : Côte: Ep.: Compacité :

Couche N° : Côte: Ep.: Compacité : Couche N° : Côte: Ep.: Compacité :

Date de soumission : 27/01/1997

Demande effectuée par : M. GAYE

Demande reçue par : B. BOYER Date : 27/01/97

Commentaires :

Contrôlée par :

Signature et Date :

Remarques :

Approuvée: X

Non Approuvée :

GROUPEMENT FOUGEROLLE/C.S.E.

BARRAGE AL BASSAM DE NIANDOUBA

DEMANDE D'APPROBATION N° DR6

DEFINITION DE L'OUVRAGE : DRAIN entre PK 1+350 et PK 1+460

Déblai d'excavation : Date et heure d'activité : 21/01/1997 Résultat :

Géotextile : Date et heure d'activité : Résultat :

Enrochements : Date et heure d'activité : Résultat :

Remblai sable pour filtre : Date et heure d'activité : Résultat :

Couche N° : Côte: Ep.:.....Compacité : Couche N° : Côte: Ep.:.....Compacité :

Couche N° : Côte: Ep.:.....Compacité : Couche N° : Côte: Ep.:.....Compacité :

Couche N° : Côte: Ep.:.....Compacité : Couche N° : Côte: Ep.:.....Compacité :

Couche N° : Côte: Ep.:.....Compacité : Couche N° : Côte: Ep.:.....Compacité :

Couche N° : Côte: Ep.:.....Compacité : Couche N° : Côte: Ep.:.....Compacité :

Couche N° : Côte: Ep.:.....Compacité : Couche N° : Côte: Ep.:.....Compacité :

Couche N° : Côte: Ep.:.....Compacité : Couche N° : Côte: Ep.:.....Compacité :

Couche N° : Côte: Ep.:.....Compacité : Couche N° : Côte: Ep.:.....Compacité :

Date de soumission : 21/01/1997

Demande effectuée par : M. GAYE

Demande reçue par : B. BOYER Date : 22/01/97

Commentaires :

Contrôlée par : B. BOYER

Signature et Date : Bertrand Boyer 22/01/97

Remarques : VOIR NOTE FEUILLE DE LEVÉS TOPO.
Du 22 JANVIER 1997.
REPRISE 1+440 VERS 1+450 AMONT -

Approuvée:

Non Approuvée :

GROUPEMENT FOUGEROLLE/C.S.E.

BARRAGE AL BASSAM DE NIANDOUBA

DEMANDE D'APPROBATION N° DR5

DEFINITION DE L'OUVRAGE : DRAIN entre PK 1+150 et PK 1+175

Déblai d'excavation : Date et heure d'activité : 08/01/1997 Résultat :

Géotextile : Date et heure d'activité : 08/01/1997 Résultat :

Enrochements : Date et heure d'activité : 10/01/1997 Résultat :

Remblai sable pour filtre : Date et heure d'activité : Résultat :

Couche N° : Côte: Ep.:.....Compacité :Couche N° : Côte: Ep.:.....Compacité :

Couche N° : Côte: Ep.:.....Compacité :Couche N° : Côte: Ep.:.....Compacité :

Couche N° : Côte: Ep.:.....Compacité :Couche N° : Côte: Ep.:.....Compacité :

Couche N° : Côte: Ep.:.....Compacité :Couche N° : Côte: Ep.:.....Compacité :

Couche N° : Côte: Ep.:.....Compacité :Couche N° : Côte: Ep.:.....Compacité :

Couche N° : Côte: Ep.:.....Compacité :Couche N° : Côte: Ep.:.....Compacité :

Couche N° : Côte: Ep.:.....Compacité :Couche N° : Côte: Ep.:.....Compacité :

Couche N° : Côte: Ep.:.....Compacité :Couche N° : Côte: Ep.:.....Compacité :

Date de soumission : 08/01/1997

Demande effectuée par : M. GAYE

Demande reçue par : B. BOYER Date : 10-01-97

Commentaires :

Contrôlée par : B. BOYER

Signature et Date : [Signature] 13-01-97

Remarques :

Approuvée: X

Non Approuvée :

GROUPEMENT FOUGEROLLE/C.S.E.

BARRAGE AL BASSAM DE NIANDOUBA

DEMANDE D'APPROBATION N°...DR4...

DEFINITION DE L'OUVRAGE : DRAIN entre PK 1+125..... et PK 1+150.....

Déblai d'excavation : Date et heure d'activité : 08/01/1997 Résultat :

Géotextile : Date et heure d'activité : 08/01/1997 Résultat :

Enrochements : Date et heure d'activité : 09/01/1997 Résultat :

Remblai sable pour filtre : Date et heure d'activité : Résultat :

Couche N° : Côte: Ep.:.....Compacité : Couche N° : Côte: Ep.:.....Compacité :

Couche N° : Côte: Ep.:.....Compacité : Couche N° : Côte: Ep.:.....Compacité :

Couche N° : Côte: Ep.:.....Compacité : Couche N° : Côte: Ep.:.....Compacité :

Couche N° : Côte: Ep.:.....Compacité : Couche N° : Côte: Ep.:.....Compacité :

Couche N° : Côte: Ep.:.....Compacité : Couche N° : Côte: Ep.:.....Compacité :

Couche N° : Côte: Ep.:.....Compacité : Couche N° : Côte: Ep.:.....Compacité :

Couche N° : Côte: Ep.:.....Compacité : Couche N° : Côte: Ep.:.....Compacité :

Couche N° : Côte: Ep.:.....Compacité : Couche N° : Côte: Ep.:.....Compacité :

Date de soumission : 08/01/1997.....

Demande effectuée par : M. GANE *[Signature]*.....

Demande reçue par : Bertaud Boyer *[Signature]*..... Date : 09-01-97

Commentaires :
.....
.....

Contrôlée par : B. BOYER.....

Signature et Date : Bertaud Boyer 09-01-97.....

Remarques :
.....
.....

Approuvée: X.....

Non Approuvée :

GROUPEMENT FOUGEROLLE/C.S.E.

BARRAGE AL BASSAM DE NIANDOUBA

DEMANDE D'APPROBATION N°... CL1...

DEFINITION DE L'OUVRAGE : CLE DE LA DIGUE entre PK 1+325 et PK 1+425

Déblais d'excavation : Date et heure d'activité : 13/12/1996 - 15^H Résultat :

Traitement fond fouilles : Date et heure d'activité : 13/12/96 - 16^H Résultat :

Remblai alluvionnaire : Date et heure d'activité : 14/12/96 - 8^H Résultat :

Couche N° : Côte: Ep.:.....Compacité : Couche N° : Côte: Ep.:.....Compacité :

Couche N° : Côte: Ep.:.....Compacité : Couche N° : Côte: Ep.:.....Compacité :

Couche N° : Côte: Ep.:.....Compacité : Couche N° : Côte: Ep.:.....Compacité :

Couche N° : Côte: Ep.:.....Compacité : Couche N° : Côte: Ep.:.....Compacité :

Couche N° : Côte: Ep.:.....Compacité : Couche N° : Côte: Ep.:.....Compacité :

Couche N° : Côte: Ep.:.....Compacité : Couche N° : Côte: Ep.:.....Compacité :

Couche N° : Côte: Ep.:.....Compacité : Couche N° : Côte: Ep.:.....Compacité :

Couche N° : Côte: Ep.:.....Compacité : Couche N° : Côte: Ep.:.....Compacité :

Date de soumission :

Demande effectuée par :

Demande reçue par : Date :

Commentaires :

Contrôlée par : Bertrand Boye

Signature et Date : 13/12/96

Remarques : LA CLEF EST ACCEPTÉE DU CHAINAGE
1+345 AU CHAINAGE 1+460.

Approuvée:

Bertrand Boye

Non Approuvée :

GROUPEMENT FOUGEROLLE/C.S.E.

BARRAGE AL BASSAM DE NIANDOUBA

DEMANDE D'APPROBATION N°... DR1...

DEFINITION DE L'OUVRAGE : DRAIN entre PK 0+600 et PK 0+700

Déblai d'excavation : Date et heure d'activité : Résultat :

Géotextile : Date et heure d'activité : Résultat :

Enrochements : Date et heure d'activité : Résultat :

Remblai sable pour filtre : Date et heure d'activité : Résultat :

Couche N° : Côte: Ep.:.....Compacité : Couche N° : Côte: Ep.:.....Compacité :

Couche N° : Côte: Ep.:.....Compacité : Couche N° : Côte: Ep.:.....Compacité :

Couche N° : Côte: Ep.:.....Compacité : Couche N° : Côte: Ep.:.....Compacité :

Couche N° : Côte: Ep.:.....Compacité : Couche N° : Côte: Ep.:.....Compacité :

Couche N° : Côte: Ep.:.....Compacité : Couche N° : Côte: Ep.:.....Compacité :

Couche N° : Côte: Ep.:.....Compacité : Couche N° : Côte: Ep.:.....Compacité :

Couche N° : Côte: Ep.:.....Compacité : Couche N° : Côte: Ep.:.....Compacité :

Couche N° : Côte: Ep.:.....Compacité : Couche N° : Côte: Ep.:.....Compacité :

Date de soumission : 13/12/96

Demande effectuée par : M. GAJE

Demande reçue par : Date :

Remarques :

Contrôlée par : Bertrand Baye
Signature et Date : 13/12/96

Remarques : CONTROLÉ LE 12/12/96 -
ACCEPTÉ 0+625 À 0+700

Approuvée:

Non Approuvée :

Bertrand Baye

GROUPEMENT FOUGEROLLE/C.S.E.

BARRAGE AL BASSAM DE NIANDOUBA

DEMANDE D'APPROBATION N°...31.....

DEFINITION DE L'OUVRAGE : CLE DE LA DIGUE entre PK ..14000..... et PK ..14175.....

Déblais d'excavation : Date et heure d'activité : ..25/11/1996..... Résultat :

Traitement fond fouilles : Date et heure d'activité : ..25/11/1996..... Résultat :

Remblai alluvionnaire : Date et heure d'activité : ..25/11/1996 (debut)..... Résultat :

Couche N° : 1^e Côte: Ep.: 20 Compacité : Couche N° : 9^e Côte: Ep.: Compacité :

Couche N° : 2^e Côte: Ep.: 11 Compacité : Couche N° : 10^e Côte: Ep.: Compacité :

Couche N° : 3^e Côte: Ep.: 11 Compacité : Couche N° : 11^e Côte: Ep.: Compacité :

Couche N° : 4^e Côte: Ep.: 11 Compacité : Couche N° : 12^e Côte: Ep.: Compacité :

Couche N° : 5^e Côte: Ep.: 11 Compacité : Couche N° : 13^e Côte: Ep.: Compacité :

Couche N° : 6^e Côte: Ep.: 11 Compacité : Couche N° : 14^e Côte: Ep.: Compacité :

Couche N° : 7^e Côte: Ep.: 4 Compacité : Couche N° : Côte: Ep.: Compacité :

Couche N° : 8^e Côte: Ep.: 4 Compacité : Couche N° : Côte: Ep.: Compacité :

Date de soumission : ..23/11/1996.....

Demande effectuée par : ..M. BAHE Gf.....

Demande reçue par : ..*Mario*..... Date : ..23/11/96.....

Commentaires :

Contrôlée par :

Signature et Date :

Remarques :

Approuvée:

Non Approuvée :

GROUPEMENT FOUGEROLLE/C.S.E.

BARRAGE AL BASSAM DE NIANDOUBA

DEMANDE D'APPROBATION N° 30

DEFINITION DE L'OUVRAGE : DRAIN entre PK 0+800 et PK 0+950

Déblai d'excavation : Date et heure d'activité : 23/11/1996 Résultat :

Géotextile : Date et heure d'activité : Résultat :

Enrochements : Date et heure d'activité : Résultat :

Remblai sable pour filtre : Date et heure d'activité : 25/11/1996 (debut) Résultat :

Couche N° 1^e Côte: Ep.: 20^e Compacité : Couche N° 9^e Côte: Ep.: 20 Compacité :

Couche N° 2 Côte: Ep.: 11 Compacité : Couche N° 10^e Côte: Ep.: 11 Compacité :

Couche N° 3^e Côte: Ep.: 11 Compacité : Couche N° 11^e Côte: Ep.: 11 Compacité :

Couche N° 4^e Côte: Ep.: 4 Compacité : Couche N° 12^e Côte: Ep.: 4 Compacité :

Couche N° 5^e Côte: Ep.: 4 Compacité : Couche N° 13^e Côte: Ep.: 4 Compacité :

Couche N° 6^e Côte: Ep.: 4 Compacité : Couche N° 14^e Côte: Ep.: 4 Compacité :

Couche N° 7^e Côte: Ep.: 4 Compacité : Couche N° 15^e Côte: Ep.: 4 Compacité :

Couche N° 8^e Côte: Ep.: 4 Compacité : Couche N° 16^e Côte: Ep.: 4 Compacité :

Date de soumission : 23/11/1996

Demande effectuée par : M. GAYE

Demande reçue par : [Signature] Date : 23/11/96

Commentaires :

Contrôlée par : [Signature]

Signature et Date : 30. 11. 96

Remarques : R.A.S



Non Approuvée :

GROUPEMENT FOUGEROLLE/C.S.E.

BARRAGE AL BASSAM DE NIANDOUBA

DEMANDE D'APPROBATION N° 31

DEFINITION DE L'OUVRAGE : CLE DE LA DIGUE entre PK 0+775 et PK 0+800

Déblais d'excavation : Date et heure d'activité : 22/11/1996 Résultat : OK

Traitement fond fouilles : Date et heure d'activité : 23/11/1996 Résultat :

Remblai alluvionnaire : Date et heure d'activité : 25/11/1996 Résultat :

Couche N° : Côte: Ep.: Compacité : Couche N° : Côte: Ep.: Compacité :

Couche N° : Côte: Ep.: Compacité : Couche N° : Côte: Ep.: Compacité :

Couche N° : Côte: Ep.: Compacité : Couche N° : Côte: Ep.: Compacité :

Couche N° : Côte: Ep.: Compacité : Couche N° : Côte: Ep.: Compacité :

Couche N° : Côte: Ep.: Compacité : Couche N° : Côte: Ep.: Compacité :

Couche N° : Côte: Ep.: Compacité : Couche N° : Côte: Ep.: Compacité :

Couche N° : Côte: Ep.: Compacité : Couche N° : Côte: Ep.: Compacité :

Couche N° : Côte: Ep.: Compacité : Couche N° : Côte: Ep.: Compacité :

Date de soumission : 22/11/1996

Demande effectuée par : M. GAYE

Demande reçue par : Bertrand Boyer Date : 22-11-96

Commentaires :

Contrôlée par : B. BOYER

Signature et Date : Bertrand Boyer 22-11-96

Remarques : REPRISE D'EXCAVATION (25CM) A FAIRE AU CHAINAGE 0+775. REPRISE FAITE LE 21-11-96 - OK

Approuvée:

Non Approuvée :

GROUPEMENT FOUGEROLLE/C.S.E.

BARRAGE AL BASSAM DE NIANDOUBA

DEMANDE D'APPROBATION N° 28.....

DEFINITION DE L'OUVRAGE : DRAIN entre PK ..0+400... et PK0+450.....

Déblai d'excavation : Date et heure d'activité : 20/11/1996..... Résultat : OK.....

Géotextile : Date et heure d'activité : 20/11/1996..... Résultat : OK.....

Enrochements : Date et heure d'activité : 20/11/1996..... Résultat : * OK.....

Remblai sable pour filtre : Date et heure d'activité : 20/11/1996..... Résultat : OK.....

Couche N° : 1^e Côte: Ep: 20..... Compacité : Couche N° : Côte: Ep:..... Compacité :

Couche N° : 2^e Côte: Ep: 4..... Compacité : Couche N° : Côte: Ep:..... Compacité :

Couche N° : 3^e Côte: Ep: 11..... Compacité : Couche N° : Côte: Ep:..... Compacité :

Couche N° : 4^e Côte: Ep: 11..... Compacité : Couche N° : Côte: Ep:..... Compacité :

Couche N° : 5^e Côte: Ep: 11..... Compacité : Couche N° : Côte: Ep:..... Compacité :

Couche N° : 6^e Côte: Ep: 11..... Compacité : Couche N° : Côte: Ep:..... Compacité :

Couche N° : 7^e Côte: Ep: 11..... Compacité : Couche N° : Côte: Ep:..... Compacité :

Couche N° : Côte: Ep:..... Compacité : Couche N° : Côte: Ep:..... Compacité :

Date de soumission : 20/11/1996.....

Demande effectuée par : M. GAYE [Signature]

Demande reçue par : [Signature] Date : 20-11-96.....

Commentaires :

Contrôlée par : B. Boyer.....

Signature et Date : [Signature] 20-11-96.....

Remarques : * ENROCHEMENT A COMPLÉTER ENTRE LES PROFILS (400 A 425, 425 A 450).....

Approuvée [Signature] MISSION DE CONTRÔLE [Signature] Tecsult International Limitée 22-12-96

Non Approuvée :

GROUPEMENT FOUGEROLLE/C.S.E.

BARRAGE AL BASSAM DE NIANDOUBA

DEMANDE D'APPROBATION N° 27

DEFINITION DE L'OUVRAGE : CLE DE LA DIGUE entre PK 0+495 et PK 0+480

Déblais d'excavation : Date et heure d'activité : 20/11/1996 Résultat : OK

Traitement fond fouilles : Date et heure d'activité : 20/11/1996 Résultat : OK

Remblai alluvionnaire : Date et heure d'activité : 20/11/1996 Résultat :

Couche N° : 1^e Côte: Ep:..... Compacité : Couche N° : Côte: Ep:..... Compacité :

Couche N° : 2^e Côte: Ep:..... Compacité : Couche N° : Côte: Ep:..... Compacité :

Couche N° : 3^e Côte: Ep:..... Compacité : Couche N° : Côte: Ep:..... Compacité :

Couche N° : 4^e Côte: Ep:..... Compacité : Couche N° : Côte: Ep:..... Compacité :

Couche N° : 5^e Côte: Ep:..... Compacité : Couche N° : Côte: Ep:..... Compacité :

Couche N° : 6^e Côte: Ep:..... Compacité : Couche N° : Côte: Ep:..... Compacité :

Couche N° : 7^e Côte: Ep:..... Compacité : Couche N° : Côte: Ep:..... Compacité :

Couche N° : Côte: Ep:..... Compacité : Couche N° : Côte: Ep:..... Compacité :

Date de soumission : 20/11/1996

Demande effectuée par : M. GAYE

Demande reçue par : B. Boyer Date : 20-11-96

Commentaires :

Contrôlée par : B. Boyer

Signature et Date : B. Boyer 20-11-96

Remarques : SUREXCAVATION LEGERE

Approuvée :

Non Approuvée :

GROUPEMENT FOUGEROLLE/C.S.E.

BARRAGE AL BASSAM DE NIANDOUBA

DEMANDE D'APPROBATION N° 24

DEFINITION DE L'OUVRAGE : REMBLAI DIGUE entre PK ...0+135... et PK ...0+250...

Traitement assiette : Date et heure d'activité : ...19/11/1996... Résultat : ...102%...

Remblai alluvionnaire : Date et heure d'activité : ...19/11/1996... Résultat : ...ok...

Couche N° 1^e Côte: Ep.:.....Compacité : Couche N° : Côte: Ep.:.....Compacité :

Couche N° 2^e Côte: Ep.:.....Compacité : Couche N° : Côte: Ep.:.....Compacité :

Couche N° 3^e Côte: Ep.:.....Compacité : Couche N° : Côte: Ep.:.....Compacité :

Couche N° 4^e Côte: Ep.:.....Compacité : Couche N° : Côte: Ep.:.....Compacité :

Couche N° : Côte: Ep.:.....Compacité : Couche N° : Côte: Ep.:.....Compacité :

Couche N° : Côte: Ep.:.....Compacité : Couche N° : Côte: Ep.:.....Compacité :

Couche N° : Côte: Ep.:.....Compacité : Couche N° : Côte: Ep.:.....Compacité :

Couche N° : Côte: Ep.:.....Compacité : Couche N° : Côte: Ep.:.....Compacité :

Date de soumission : ...19/11/1996.....

Demande effectuée par : ...M. GAYE.....

Demande reçue par : H. Lo Date :

Commentaires :

Contrôlée par : Lo

Signature et Date : 25-11-96

Remarques : R.A.S

Approuvée: 25-11-96
MISSION DE CONTRÔLE
Tecsult International Limitée

Non Approuvée :

GROUPEMENT FOUGEROLLE/C.S.E.

BARRAGE AL BASSAM DE NIANDOUBA

DEMANDE D'APPROBATION N° 23

Date et heure d'activité : 16/11/1996

Item à vérifier : Remblai alluvionnaire de la clé du barrage OK

Localisation : Digue entre channage 0+900 et 1+000

Date de soumission : 16/11/1996

Demande effectuée par : M. GAYE

Demande reçue par : M. Lo

Date :

Commentaires :

Contrôlée par : Lo

Signature et Date : 30-11-96

Remarques :

R.A.S



Non Approuvée :

GROUPEMENT FOUGEROLLE/C.S.E.

BARRAGE AL BASSAM DE NIANDOUBA

DEMANDE D'APPROBATION N° 22

Date et heure d'activité : 16/11/1996 8^h →

Item à vérifier : Remblai sable pour filtre du drain OK

Localisation : Digue entre chainages 0+250 et 0+450

Date de soumission : 16/11/1996

Demande effectuée par : M. J. GAYE

Demande reçue par : HE LO [Signature] Date :

Commentaires :

Contrôlée par : Lo

Signature et Date : 21-11-96

Remarques :

 **TECSULT**
Approuvée : [Signature]
MISSION DE CONTRÔLE
21-11-96
TECSULT International Limitede

Non Approuvée :

GROUPEMENT FOUGEROLLE/C.S.E.

BARRAGE AL BASSAM DE NIANDOUBA

DEMANDE D'APPROBATION N° 21.....

Date et heure d'activité : 15/11/1996
Item à vérifier : traitement fond de fouilles de l'excavation du
filtre

Localisation : Digue entre chaînage 0+250 et 0+450

Date de soumission : 15/11/1996 H

Demande effectuée par : M. GAYE

Demande reçue par : M. Lo H Date :

Commentaires :

Contrôlée par : Lo

Signature et Date : 25. 11. 96

Remarques : R. A S

Approuvée 25. 11. 96
H

Non Approuvée :

GROUPEMENT FOUGEROLLE/C.S.E.

BARRAGE AL BASSAM DE NIANDOUBA

DEMANDE D'APPROBATION N° 25.....

DEFINITION DE L'OUVRAGE : REMBLAI DIGUE entre PK ..0+250.... et PK ..0+450.....

Traitement assiette : Date et heure d'activité : 19/11/1996..... Résultat : 100 %.....

Remblai alluvionnaire : Date et heure d'activité : 19/11/1996..... Résultat : 100 %.....

Couche N° : Côte: Ep.:.....Compacité : Couche N° : Côte: Ep.:.....Compacité :

Couche N° : Côte: Ep.:.....Compacité : Couche N° : Côte: Ep.:.....Compacité :

Couche N° : Côte: Ep.:.....Compacité : Couche N° : Côte: Ep.:.....Compacité :

Couche N° : Côte: Ep.:.....Compacité : Couche N° : Côte: Ep.:.....Compacité :

Couche N° : Côte: Ep.:.....Compacité : Couche N° : Côte: Ep.:.....Compacité :

Couche N° : Côte: Ep.:.....Compacité : Couche N° : Côte: Ep.:.....Compacité :

Couche N° : Côte: Ep.:.....Compacité : Couche N° : Côte: Ep.:.....Compacité :

Couche N° : Côte: Ep.:.....Compacité : Couche N° : Côte: Ep.:.....Compacité :

Date de soumission : 19/11/1996.....

Demande effectuée par : M. GAUCHE [Signature]

Demande reçue par : [Signature] Date : 19.11.96

Commentaires : [Signature] ok

Contrôlée par : H.S. [Signature]

Signature et Date : [Signature] 19.11.96

Remarques :

Approuvée: 19.11.96 [Signature]

Non Approuvée :

GROUPEMENT FOUGEROLLE/C.S.E.

BARRAGE AL BASSAM DE NIANDOUBA

DEMANDE D'APPROBATION N° 26

DEFINITION DE L'OUVRAGE : CLE DE LA DIGUE entre PK 0+800 et PK 0+900

Déblais d'excavation : Date et heure d'activité : 19/11/1996 Résultat :

Traitement fond fouilles : Date et heure d'activité : 19/11/1996 Résultat :

Remblai alluvionnaire : Date et heure d'activité : 19/11/1996

Couche N° : Côte: Ep:..... Compacité : Couche N° : Côte: Ep:..... Compacité :

Couche N° : Côte: Ep:..... Compacité : Couche N° : Côte: Ep:..... Compacité :

Couche N° : Côte: Ep:..... Compacité : Couche N° : Côte: Ep:..... Compacité :

Couche N° : Côte: Ep:..... Compacité : Couche N° : Côte: Ep:..... Compacité :

Couche N° : Côte: Ep:..... Compacité : Couche N° : Côte: Ep:..... Compacité :

Couche N° : Côte: Ep:..... Compacité : Couche N° : Côte: Ep:..... Compacité :

Couche N° : Côte: Ep:..... Compacité : Couche N° : Côte: Ep:..... Compacité :

Couche N° : Côte: Ep:..... Compacité : Couche N° : Côte: Ep:..... Compacité :

Date de soumission : 19/11/1996

Demande effectuée par : M. GAHE 

Demande reçue par : St. Paul Boyer Date : 19-11-96

Commentaires :

Contrôlée par : B. Boyer

Signature et Date : St. Paul Boyer 19-11-96

Remarques : LEVÉ TOPO FAIT. OK

Approuvée :

Non Approuvée :

GROUPEMENT FOUGEROLLE/C.S.E.

BARRAGE AL BASSAM DE NIANDOUBA

DEMANDE D'APPROBATION N° 20

Date et heure d'activité : 15/11/1996 à 17^H-00

Item à vérifier : traitement fonds de fouilles de la clé

Localisation : Digue entre chaîne 0+900 et 1+000

Date de soumission : 15/11/1996

Demande effectuée par :

Demande reçue par H. Lo Date :

Commentaires :

Contrôlée par : Jo

Signature et Date : 18.11.96

Remarques : R.A.S

Approuvée : 18.11.96
MISSION DE CONTRÔLE
Tecsult International Limitée

Non Approuvée :

GROUPEMENT FOUGEROLLE/C.S.E.

BARRAGE AL BASSAM DE NIANDOUBA

DEMANDE D'APPROBATION N° 19 bis

Date et heure d'activité : 16/11/1996

Item à vérifier : Levés topographiques fond de fouilles de la clé

Localisation : Digue : clé entre les chainages 0+900 et 1+000

Date de soumission : 16/11/1996

Demande effectuée par : M. GAYE


Demande reçue par : Bertrand Boyer Date : 16-11-96

Commentaires :

Contrôlée par : BERTRAND BOYER

Signature et Date : Bertrand Boyer

Remarques : REPRISE D'EXCAVATION EFFECTUÉE ENTRE LES CHAINAGES 0+860 ET 0+900 ET ENLÈVEMENT DES ORNIÈRES EN PIEDS DE TALUS.

Approuvée : 
MISSION DE CONTRÔLE
Tecsult International Limitée

Non Approuvée :

GROUPEMENT FOUGEROLLE/C.S.E.

BARRAGE AL BASSAM DE NIANDOUBA

DEMANDE D'APPROBATION N° 19.....

Date et heure d'activité : 15/11/1996 à 15^H-00

Item à vérifier : levés topographiques fond de feuilles clé

Localisation : Digue : clé entre les chainages 0+900 et 1+000

Date de soumission : 15/11/1996

Demande effectuée par : M. GAYE

Demande reçue par : B. Boyer Date : 15/11/96

Commentaires :

Contrôlée par : B. BOYER

Signature et Date : B. Boyer 15/11/96

Remarques : ATTENTE 15:00 - 17:30

TRAVAUX INACHEVÉS

Approuvée

Non Approuvée : X

GROUPEMENT FOUGEROLLE/C.S.E.

BARRAGE AL BASSAM DE NIANDOUBA

DEMANDE D'APPROBATION N° 18.....

Date et heure d'activité : 17/11/1996

Item à vérifier : levés topographiques après familles de filtre

Localisation : chamées entre 0+250 et 0+450

Date de soumission : 13/11/1996

Demande effectuée par : M. GAYE

Demande reçue par : Bertrand Boyer Date : 14/11/96

Commentaires :

Contrôlée par : BERTRAND BOYER

Signature et Date : Bertrand Boyer 18/11/96

Remarques : LEVÉ TOPO. DU DRAIN 0+400 A 0+450
FAIT LE 17-11-96. MISE EN PLACE DU SABLE
GROSSIER CORRECTE.

LEVÉ TOPO. DU DRAIN 0+250 A 0+375
FAIT LE 18-11-96. MISE EN PLACE DU SABLE
GROSSIER CORRECTE

Approuvée:

MISSION DE CONTRÔLE
Tecsult International Limitede
04005123015

Non Approuvée:

GROUPEMENT FOUGEROLLE/C.S.E.

BARRAGE AL BASSAM DE NIANDOUBA

DEMANDE D'APPROBATION N° 17.....

Date et heure d'activité : 13/11/1996 →

Item à vérifier : Déclai d'excavation du filtre

Localisation : Digue entre chaînage 0+800 et 0+900

Date de soumission : 13/11/1996

Demande effectuée par : M. GAYE

Demande reçue par : H. Lo Date : 13.11.96

Commentaires :

Contrôlée par : Lo

Signature et Date : 15.11.96

Remarques :

Approuvée 11.96
TECSULT
MISSION DE CONTROLE
Tecsult International Limitede

Non Approuvée :

GROUPEMENT FOUGEROLLE/C.S.E.

BARRAGE AL BASSAM DE NIANDOUBA

DEMANDE D'APPROBATION N°...16...

Date et heure d'activité : 13/11/1996

Item à vérifier : Déblai d'excavation de la clé du barrage

Localisation : Digue entre chainage 0+900 et chainage +

Date de soumission : 13/11/1996

Demande effectuée par : M. GAYE

Demande reçue par : M. Lo Date :

Commentaires :

Contrôlée par : Lo

Signature et Date : 14. 11. 96

Remarques :



Non Approuvée :

GROUPEMENT FOUGEROLLE/C.S.E.

BARRAGE AL BASSAM DE NIANDOUBA

DEMANDE D'APPROBATION N°...15....

Date et heure d'activité : 13/11/1996

Item à vérifier : Remblai alluvionnaire de la clé du barrage

Localisation : Digue entre chaînage 0+800 et chaînage 0+900

Date de soumission : 13/11/1996

Demande effectuée par : M. GAYE

Demande reçue par : M. So Date : 13. 11. 96

Commentaires :

Contrôlée par : So

Signature et Date : 18. 11. 96

Remarques : R.A.S

Approuvé : 18. 11. 96
MISSION DE CONTRÔLE
T.E.C.S.U.L.T.
T.E.C.S.U.L.T. (Technique de Contrôle des Structures)
Société à responsabilité limitée
Siège social : Niandouba

Non Approuvée :

LEVE IMPLANTATION COFFRAGES DU MUR GAUCHE DE L'EVACUATEUR
FAIT PAR BERTRAND BOYER LE 11 NOVEMBRE 1996.

ECART MESURE ENTRE LE POINT CALCULE ET LE POINT RELEVE SUR LE TERRAIN.

DE	-	A	DIRECTION	DIST-HRZ	DIST-V	DIST-PNT	DESCRIPTION
8085-		8219	48°26'41	0.006	0.000	0.000	OB BO
8086-		8218	29°16'37	0.012	0.000	0.000	OB BO
8087-		8217	115°45'33	0.004	0.000	0.000	OB BO
8088-		8216	357°18'42	0.005	0.000	0.000	OB BO
8089-		8215	346°21'22	0.009	0.000	0.000	OB BO
8090-		8214	266°06'00	0.002	0.000	0.000	OB BO
8091-		8213	22°32'52	0.007	0.000	0.000	OB BO
8092-		8212	196°40'45	0.002	0.000	0.000	OB BO
8093-		8211	4°11'12	0.009	0.000	0.000	OB BO
8094-		8210	320°15'57	0.021	0.000	0.000	OB BO
8095-		8221	151°54'29	0.006	0.000	0.000	OB BO
8096-		8220	273°21'20	0.003	0.000	0.000	OB BO

LE CONTROLE ALTIMETRIQUE A ETE FAIT SEPAREMENT SUR LES REPERES METALLIQUES
SERVANT DE GUIDES POUR LE BETONNAGE DE LA DALLE DE PROPRETE. LES ELEVATIONS
DE CES REPERES SONT GENERALEMENT PLUS BASSES QUE LE NIVEAU REQUIS (ENV 20MM)
ET ELLES SONT CONSIDEREES COMME CORRECTES.



GROUPEMENT FOUGEROLLE/C.S.E.

BARRAGE AL BASSAM DE NIANDOUBA

DEMANDE D'APPROBATION N°...009...

Date et heure d'activité : 13/11/1996

Item à vérifier : Traitement fond de feuilles de la clé du barrage

Localisation : Digue entre chaînage 0+800 et chaînage 0+900

Date de soumission : 11/11/1996

Demande effectuée par : M. GAYE

Demande reçue par : MR. Lo Date : 11. 11. 96

Commentaires :

Contrôlée par : Lo

Signature et Date : 15. 11. 96

Remarques :

Approuvée 15. 11. 96

MISSION DE CONTRÔLE

Jebsult International Limitede

Non Approuvée :

GROUPEMENT FOUGEROLLE/C.S.E.

BARRAGE AL BASSAM DE NIANDOUBA

DEMANDE D'APPROBATION N° 008

Date et heure d'activité : 12/11/1996 après-midi

Item à vérifier : levés topographiques après déblais d'excavation
de la clé du barrage

Localisation : chaînages 0+800 à 0+900

Date de soumission : 11/11/1996

Demande effectuée par : M. GAYE

Demande reçue par : Bertrand Boyer Date : 11-11-96

Commentaires :

Contrôlée par : BERTRAND BOYER

Signature et Date : Bertrand Boyer 12/11/96

Remarques : LE FOND DE LA TRANCHÉE EST GÉNÉ-
RALEMENT À L'ÉLEVATION REQUISE (22.5)
SAUF AU CHAINAGE 0+800 (22.05) -
LE FOND DE LA TRANCHÉE A UNE LARGEUR DE :
6.20M À 0+800, 6.73M À 0+825, 6.52M À 0+850,
6.00M À 0+875. LES PENTES N'ONT PAS ÉTÉ RESPECTÉES.

 TECSULT
Approuvée: <input checked="" type="checkbox"/>
MISSION DE CONTRÔLE
 Tecsult International Limitede 00287-00000000

Non Approuvée:

GROUPEMENT FOUGEROLLE/C.S.E.

BARRAGE AL BASSAM DE NIANDOUBA

DEMANDE D'APPROBATION N°..007..

Date et heure d'activité : 09/11/1996

Item à vérifier : Traitement fond de fouille de la digue (hors clé du barrage)

Localisation : Digue: chainage 0+250 à 0+450

Date de soumission : 09/11/1996

Demande effectuée par : M. GAYE

Demande reçue par : *HP So* Date : 12. 11. 96

Commentaires :

Contrôlée par : *So*

Signature et Date : 15. 11. 96

Remarques :



Non Approuvée :

GROUPEMENT FOUGEROLLE/C.S.E.

BARRAGE AL BASSAM DE NIANDOUBA

DEMANDE D'APPROBATION N° 006.....

Date et heure d'activité : 09/11/1996

Item à vérifier : Deblai d'excavation du filtre

Localisation : Digue : chainage 0+250 à 0+450

Date de soumission : 09/11/1996

Demande effectuée par : M. GAYE 

Demande reçue par : MR. Jo  Date : 12. 11. 96

Commentaires :

Inspecté par : Jo

Signature et Date : 15. 11. 96

Remarques :



Non Approuvée :

GROUPEMENT FOUGEROLLE/C.S.E.

BARRAGE AL BASSAM DE NIANDOUBA

DEMANDE D'APPROBATION N°...005.

Date et heure d'activité : 09/11/1996

Item à vérifier : Remblai alluvionnaire de la clé du barrage.

Localisation : Digue : chaînage 0+250 à 0+450

Date de soumission : 09/11/1996

Demande effectuée par : M. GAYE

Demande reçue par : Mr. Lo Date : 12.11.96

Commentaires :

Contrôlée par : Naiso

Signature et Date : 14.11.96

Remarques :



Non Approuvée :

GROUPEMENT FOUGEROLLE/C.S.E.

BARRAGE AL BASSAM DE NIANDOUBA

DEMANDE D'APPROBATION N°...003

Date et heure d'activité : 09/11/1996

Item à vérifier : Traitement fonds de fouilles de la clé du barrage

Localisation : Digue : entre chaînage 0+250 et 0+450

Date de soumission : 09/11/1996

Demande effectuée par : M. GAYE

Demande reçue par : [Signature] Date : 12. 11. 96

Commentaires :

Contrôlée par : [Signature]

Signature et Date : 15. 11. 96

Remarques :

TECSULT
MISSION DE CONTRÔLE
TECSULT International Limited

Non Approuvée :

GROUPEMENT FOUGEROLLE/C.S.E.

BARRAGE AL BASSAM DE NIANDOUBA

DEMANDE D'APPROBATION N° 002


Date et heure d'activité : 09/11/1996

Item à vérifier : Déblai d'excavation de la clé du barrage

Localisation : Digue : chaînage 0+250 à 0+450

Date de soumission : 09/11/1996

Demande effectuée par : M. GAYE

Demande reçue par : HR So  Date : 12.11.96

Commentaires :

Contrôlée par : So

Signature et Date : 13.11.96

Remarques :



Non Approuvée :

GROUPEMENT FOUGEROLLE/C.S.E.

BARRAGE AL BASSAM DE NIANDOUBA

DEMANDE D'APPROBATION N° 001

Date et heure d'activité : 11/11/96

Item à vérifier : Traitement fonds de familles

Localisation : Digue chaînage 0+135 → 0+250

Date de soumission : 11/11/96

Demande effectuée par : M. GAYE

Demande reçue par : *[Signature]* Date : 12.11.96

Commentaires :

Contrôlée par : *[Signature]*

Signature et Date : 12.11.96

Remarques :

Approuvée : *[Signature]*
TECSULT
MISSION DE CONTRÔLE
TECSULT International Limited

Non Approuvée :

LEVE IMPLANTATION COFFRAGES DU MUR DROIT DE L'EVACUATEUR
FAIT PAR BERTRAND BOYER LE 05 NOVEMBRE 1996.

ECART MESURE ENTRE LE POINT CALCULE ET LE POINT RELEVE SUR LE TERRAIN.

DE	-	A	DIRECTION	DIST-HRZ	DIST-V	DIST-PNT	DESCRIPTION
8080-	8101	196	34'11	0.019	0.000	0.000	OB BO
8079-	8102	191	25'16	0.025	0.000	0.000	OB BO
8081-	8103	298	32'10	0.013	0.000	0.000	OB BO
8078-	8104	221	37'13	0.019	0.000	0.000	OB BO
8077-	8105	185	11'36	0.026	0.000	0.000	OB BO
8076-	8106	230	20'41	0.007	0.000	0.000	OB BO
8075-	8107	248	48'37	0.011	0.000	0.000	OB BO
8074-	8108	208	52'20	0.012	0.000	0.000	OB BO
8073-	8109	191	44'27	0.018	0.000	0.000	OB BO
8082-	8110	184	46'08	0.010	0.000	0.000	OB BO
8071-	8111	129	42'01	0.009	0.000	0.000	OB BO
8072-	8112	176	15'02	0.009	0.000	0.000	OB BO

LE CONTROLE ALTIMETRIQUE A ETE FAIT SEPAREMENT SUR LES REPERES METALLIQUES
SERVANT DE GUIDES POUR LE BETONNAGE DE LA DALLE DE PROPLETE. LES ELEVATIONS
DE CES REPERES SONT CORRECTES.

Bertrand Boyer
05-11-96

GROUPEMENT FOUGEROLLE C.S.E

BARRAGE AL-BASSAM DE NIANDOUBA

FA

CONTRÔLES TOPOMETRIQUES No

DEFINITION DE L'ELEMENT: Mur de droite de l'évacuateur.

RECEPTION TOPO: OK

RECEPTION FOND DE FOUILLE: OK

Croquis topo No: 001
Fiche d'implantation: 001
plan No: 203/0

références utilisées: Axe de versoir
X = 612627,729
Y = 1424826,836
B119 X = 612194,019
Y = 1424527,772

Méthodologies utilisées:

- Triangulation: T2 + distomat
- Nivellement par rayonnement: N.A.2.

NO	COORDONNÉES THEORIQUES			COORDONNÉES OBSERVÉES			ECARTS EN CM		
	X: 612	Y: 1426	Z	X	Y	Z	X	Y	Z
C	627,729	826,836							
A	599,059	780,341							
B	574,075	816,564							
1	595,0814	786,104							
2	593,0726	784,719							
3	585,4481	789,786							
4	584,4603	789,105							
5	582,3972	790,476							
6	577,7426	797,227							
7	577,1340	799,237							
8	578,4514	800,145							
9	575,4092	810,194							
10	577,4834	811,625							
11	583,1602	803,392							
12	590,2561	793,101							
A			25,406						
B			25,431						
C			25,322						
D			25,402						
E			25,419						
F			23,870						
G			23,863						
H			23,882						

CONFORMITE D'EXECUTION

VISA CONTRÔLE EXTERNE

VISA CONTRÔLE INTERNE

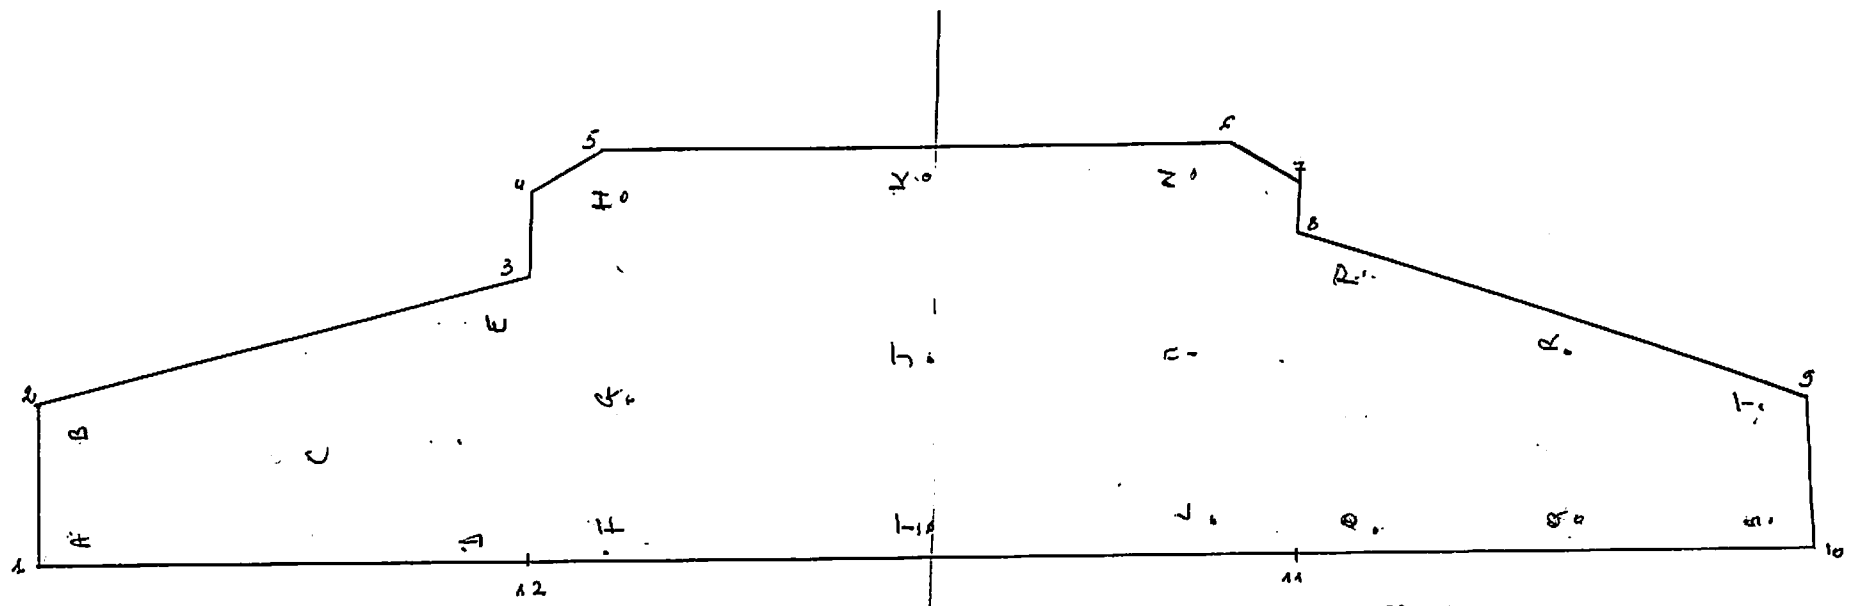
MAÎTRE D'OEUVRE

MR Belfort Boyer
MR L...

MR Mamadou Gaye
MR Abou-bacir Gaye



des Brasseries
SODAC
1922.18.29 - 32.19.23



P 0

C X Barrage A bevers

GROUPEMENT FOUGEROLLE C.S.E

BARRAGE AL-BASSAM DE NIANDOUBA

FICHE D'EXECUTION No: 1

CHANTIER: *Pierrage de Niandouba* No: _____

DEFINITION DE L'OUVRAGE: <i>Ouvrage de Restauration Plot 2</i>								
PLAN D'EXECUTION: <i>015</i>	COFFRAGE No: _____	INDICE: _____						
	ACIER No: _____	INDICE: _____						
POINT CRITIQUE EVENTUEL: _____	OUI: _____	NON: _____						
OBJET: _____								
RECEPTION FERRAILLAGE: _____	DATE: _____	VISA CHEF DE PROJET _____						
COFFRAGES: _____								
ASPECT PAREMENT: _____								
DEMOULANT: _____								
INCORPORATION: _____								
DATE: _____		VISA CHEF DE CHANTIER BON A BETONNER _____						
BETONNAGE	TYPE DE BETON <i>classe 3 - C Beton préparé /</i>							
MOYENS <i>PPM</i>	BENNE: <i>oui</i>	MALAXEUR: _____						
Nbre VIBREURS: _____								
SURFACAGE: _____	REGLE: <i>oui</i>	TALOCHE: <i>oui</i>						
CURE: <i>eau</i>								
DATE: <i>18 Mai 1996</i>	VISA CHEF DE CHANTIER <i>[Signature]</i>							
PRELEVEMENTS: <i>non</i>	ENTREPRISE: _____	MAÎTRE D'OEUVRE: _____						
		Nbre: _____						
RESULTATS: _____								
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 50%;">INFOS</th> <th style="width: 25%;">7 JOURS</th> <th style="width: 25%;">28 JOURS</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table>			INFOS	7 JOURS	28 JOURS			
INFOS	7 JOURS	28 JOURS						
POINT CRITIQUE: _____		OBSERVATIONS: _____						
OBJET: _____								
LIEU DE: _____								
CONTRÔLE EXTERNE	CONTRÔLE INTERNE							
	<i>choix de Ramadan</i>							
	<i>N. Duay 37</i>							
CONFORMITE D'EXECUTION								
VISA CONTRÔLE EXTERNE	FOUGEROLLE C.S.E	MAÎTRE D'OEUVRE						
	<i>10RLET</i> <i>[Signature]</i>							



27 MARS 96 15

LES LEVÉS DE TERRAIN NATUREL
SERONT COMPLÉTÉS AUJOURD'HUI
EN RIVE DROITE DE LA RIVIÈRE.

L'ENTREPRENEUR EST DONC AUTORISÉ
À DÉBUTER CE MATIN LES TRAVAUX
DE DÉCAPAGE DANS L'AXE DU BARRAGE.

LES TRAVAUX DE DÉCAPAGE ET D'EXCAVATION
POURRONT DÉBUTER DEMAIN MATIN.
DANS L'AXE DU DÉVERSOIR.

LES LEVÉS ONT ÉTÉ EFFECTUÉS CONJOINTEMENT
PAR L'ENTREPRENEUR ET LE SURVEILLANT.
LES RÉSULTATS DE CES LEVÉS
SERONT TRANSMIS À L'ENTREPRENEUR
LORSQUE LES CALLULS SERONT COMPLÉTÉS.

UNE VÉRIFICATION DES IMPLANTATIONS DE
L'AXE DU BARRAGE ET DU DÉVERSOIR A
ÉTÉ EFFECTUÉE ET ELLES SONT CONFORMES
AUX DONNÉES MONTRÉES AU PLAN.

POUR TECSUBT: *Seth / Boyer*

POUR FOUGERELLE / CSE *Mamadou* GAYE
