

Formulaire de pré-qualification

Projet : AMÉNAGEMENT HYDROAGRICOLE DU BASSIN DE L'ANAMBE - PHASE II

Entreprise : CO.GE.I. COSTRUZIONI GENERALI ITALIANE S.p.A.

EXPÉRIENCE : AU NIVEAU GÉOGRAPHIQUE

Veillez compléter la grille ci-dessous en y inscrivant les données relatives aux projets pertinents menés à bonne fin au cours des cinq dernières années :

Voir Annexe: "Liste des travaux exécutés dans les cinq dernières années"  
"Attestations des Maitres d'Ouvrage"

Nom du client	Nom, lieu et type de projets	Nom de la firme d'ingénieur conseil responsable de la supervision	Montant du contrat et date	Valeur du contrat achevé, incluant les avenants homologués	taux de participation de l'entreprise dans le projet	Le contrat a-t-il été mené à terme de façon satisfaisante compte tenu des délais prévus. Joindre certificat de bonne exécution

CO. GE. I.  
Costruzioni Generali Italiane S.p.A.  
Ing. FABRIZIO PERRINI

TRAVAUX EXECUTES

TRAVAUX DE PROTECTION ET D'AMENAGEMENT HYDRAULIQUE

Travaux d'aménagement hydraulique du fleuve Gela - projet de l'achèvement du tronçon compris entre l'amenée du torrent Maroglio et la région de Tilaro, province de Caltanissetta.

- Organisme concessionnaire:  
GENIE CIVIL DE CALTANISSETTA
  
- Date du contrat: 21-05-1985
- : rép n. 3600
- Date consignation travaux: 01-10-1985
- Montant net travaux: 1.352.231.360
- Date avancement: 24.05.1988
- Montant Lires: 1.407.032.590
- Date achèvement travaux: 24-05-1988

Le montant des travaux exécutés au 24-05-1988 comprend la révision des prix.



Travaux d'aménagement hydraulique du fleuve Maroglio, entre la confluence du Fleuve Gela et le torrent Cimia.

- Organisme Concessionnaire : MINISTERO DEI LL.PP.  
PROVVEDITORATO ALLE OO.PP.  
PALERMO
- Date consignation travaux : 18/10/1988
- Date du contrat : 21/12/1988, Rép. n° 3739, enr. à  
Palermo le 26/02/1991
- Montant net des travaux : Lit. 6.750.289.927=
- Acte additionnel : Du 17/10/1990 n° 3829, enrg. à  
Palermo le 26/02/1991
- Date avancement : 30/04/1992
- Montant lires : 6.019.682.000=
- Date révision : 30/04/1992
- Montant lires : 612.776.000=
- Quote part % : 50,00

Les travaux ont été pris en adjudication par un Groupement d'Entreprises dont la CO.GE.I. S.p.A. participe à 50,00%.

DIGUES

Travaux de construction du Stockage de LENTINI, 1° Lot.  
Projet Spécial 30/3032/A.

- Organisme Concessionnaire : CONSORZIO DI BONIFICA DEL LAGO DI LENTINI
- Date consignation travaux : 26.07.1983
- Date du contrat : 13.10.1983, Rép. n° 6465, enr. à Rome le 28.10.1983 sous le numéro 8348
- Date échéance : 31.10.1991
- Montant net des travaux : Lit. 261.980.090.106=
- Acte additionnel : Du 05/06/1987 rép. n° 741 du montant de Lit. 164.510.821.936 et act de soumission du 26/09/1990 de Lit. 578.056.170=
- Date avancement : 31/10/1991
- Montant lires : 266.137.376.025=
- Date révision : 31/10/1991
- Montant lires : 36.681.598.291=
- Quote part % : 26,66

Les travaux ont été pris en adjudication par un Groupement d'Entreprises dont la CO.GE.I. S.p.A. participe à 26,66%.  
Le montant net contractuel comprend l'acte complémentaire.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES:

- Remblais : 1.550.000 m<sup>3</sup>
- Déblais : 98.000 m<sup>3</sup>
- 6 (six) Ponts : 54 ml. de longueur
- Viaducs : n° 1 travée de 28 ml. et n° 8 poutres  
préfléchies
- Ouvrages mineurs : n° 55 dalots
- Détours : 25 m.
- Ouvrages divers : n° 28 dalots  
n° 55 buses métalliques  
n° 18 ouvrages mineurs
- Stabilisation en terre : 68.000 m<sup>3</sup>
- Ouvrages de drainage
- Détour et nouveau réglage du réseau d'irrigation
- Ouvrages de béton bitumineus

Travaux de restructuration de l'installation d'irrigation en aval de la Digue "POZZILLO" - 1° Lot.

- Organisme Concessionnaire:

CONSORZIO DI BONIFICA GAGLIANO CASTELFERRATO -Troina (En)-

- Date du contrat: 09.12.1986

: enrg. sous le n° 1100 de rep.

- Date consignation travaux: 09.01.1987

- Montant net travaux: Lit. 2.387.182.441

- Acte complémentaire:

en date du 29.04.1988

- Date avancement: 30.09.1988

- Montant Lires: 2.386.895.710

- Date achèvement travaux: 30.09.1988

- Quote-part %: 50.00

Les travaux ont été engagés par le Regroupement des Sociétés CO. GE.I. S.p.A. (Mandataire), IMPRESITAL S.p.A. (Mandante) avec quotes paritaires. La Société Consortiale "GAGLIANO CASTELFERRATO" a r.l. a succédé au Regroupement aux termes de l'art23/bis loi 584/1977

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES:

- Capacité totale du Réservoir	:	135.000.000 m3
- Capacité utile du Réservoir	:	127.000.000 m3
- Digue principale	{	
	Longueur totale	: 5.357 m.l.
	Hauteur totale	: 33 m.
- Digue nord	{	
	Longueur totale	: 1.906 m.l.
	Hauteur max.	: 17 m.
- Digue sud	{	
	Longueur totale	: 1.550 m.l.
	Hauteur max.	: 20 m.
- Béton bitumineux	:	385.000 m2
- Capacité superficielle de debit de decharge	:	160 m3/sec.
- Capacité de debit de decharge de fond	:	200 m3/sec.
- 1ère conduit de dérivation - Ø 1600 acier	:	330 m.
- 2ème conduit de dérivation - Ø 1400 P.R.F.V.	:	3.500 m.
- Capacité Max. de debit de adduction	:	3,5 m3/sec.

TRAVAUX ROUTIERS

Junction entre Bardonecchia et Rivoli.  
Tronçon III Deveys-Susa (autos-port), Tronçon Ramat Est-Susa  
(autos-port).  
Lot. n° 16 "VIADUC DEVEYS 1°"

- MAITRE D'OUVRAGE : SITAF - SOCIETA ITALIANA TRAFORO  
AUTOSTRADALE DEL FREJUS

- Date de demarrage : 18/04/1988

- Date du contrat : 18/06/1988, Rép. n° 9111, enr. à  
Torino le 28/06/1988

- Date achèvement : 17/02/1992

- Montant du marché : Lit. 23.527.415.481=

- Avenant : n° 1 du 26/06/1990

- Date avancement : 22/11/1991

- Montant lires : 20.694.667.015=

- Date révision : 22/11/1991

- Montant lires : 3.286.735.705=



S.G.C. PONTEDERA-PISA-LIVORNO, Tronçon FIRENZE-PONTEDERA.  
Projet exécutif, lot terminal FIRENZE (Lotto O).  
Part B: de la section 41 à la section 82.

- MAITRE D'OUVRAGE : A.N.A.S. - AZIENDA NAZIONALE  
AUTONOMA DELLE STRADE.

- Date du contrat : 07/06/1989, Rép. n° 19721

- Date de démarrage : 13/04/1989

- Date achèvement : 30/04/1990

- Montant du marché : Lit. 12.738.533.600=

- Acte additionnel : daté 30/09/1989 n° 19910

- Date avancement : 30/05/1990

- Montant lires : 12.734.373.000=

- Date révision : - Montant lires : 326.033.461=

S.G.C. PONTEDERA-PISA-LIVORNO, Tronçon FIRENZE-PONTEDERA.  
Projet exécutif, lot terminal FIRENZE (Lotto 0).  
Part A: de la section 1 à la section 41.

- MAITRE D'OUVRAGE	: A.N.A.S. - AZIENDA NAZIONALE AUTONOMA DELLE STRADE.
- Date du contrat	: 15/02/1990, Rép. n° 20007
- Date de démarrage	: 20/07/1989
- Date achèvement	: 09/06/1990
- Montant du marché	: Lit. 13.095.522.000=
- Date avancement	: 09/06/1990
- Montant lires	: 14.958.410.348=
- Quote part %	31,50

S.G.C. PONTEDERA-PISA-LIVORNO, Tronçon FIRENZE-PONTEDERA.  
Projet exécutif, lot terminal FIRENZE (Lotto 0).  
Part A: de la section 1 à la section 41.

- MAITRE D'OUVRAGE : A.N.A.S. - AZIENDA NAZIONALE AUTONOMA DELLE STRADE.
- Date du contrat : 15/02/1990, Rép. n° 20007
- Date de démarrage : 20/07/1989
- Date achèvement : 09/06/1990
- Montant du marché : Lit. 13.095.522.000=
- Date avancement : 09/06/1990
- Montant lires : 14.958.410.348=
- Quote part % 31,50

R.N. N° 321 "DEL POLACCO", Travaux pour le renforcement de la route entre le Km. 23+500 et le Km 36+200.

- MAITRE D'OUVRAGE	: A.N.A.S. - AZIENDA NAZIONALE AUTONOMA DELLE STRADE.
- Date du contrat	: 03/04/1991, Rép. n° 20551
- Date de demarrage	: 19/12/1990
- Montant du marché	: Lit. 10.772.050.000=
- Date avancement	: 31/12/1992
- Montant lires	: 8.588.000.000=
- Quote part %	80,00

Autoroute MILANO - NAPOLI.

Raccordement entre les Autoroutes A1 et A11, et ouvrages annexés.  
Lot 3 (Prato).

- MAITRE D'OUVRAGE : AUTOSTRADE - CONCESSIONE E  
COSTRUZIONI AUTOSTRADE S.p.A.
- Date du contrat : 24/10/1990, numero 012503
- Date de demarrage : 12/11/1990
- Montant du marché : Lit. 7.978.393.944=
- Date achèvement : Lit. 15/07/1993
- Acte additionnel : n° 1 du 12/03/1992 de Lit.  
2.418.363.303=  
n° 2 en cours d'approbation de  
Lit. 1.580.962.230=
- Date avancement : 15/07/1993
- Montant liras : 5.970.921.500=
- Quote part % : 50,00

Les travaux ont été pris en adjudication par un Groupement  
d'Entreprises: CO.GE.I. S.p.A. (chef de file) et COSTRUZIONI  
MAMBRINI S.p.A.

Le montant des travaux exécutés se rapporte à la seule part  
COGEI.

Nouvel itinéraire Melfi-Potenza - V° Lot. - 2° Tronçon.

- Organisme Concessionnaire:  
A.N.A.S. - AZIENDA NAZIONALE AUTONOMA DELLE STRADE  
Compartiment de Potenza (Italie)
- Date du contrat: 01.03.1984
- Date consignation travaux: 12.04.1984
- Montant net travaux: Lit. 17.870.166.000
- Acte additionnel:  
du 18.03.1986 rep. N. 18550 - Lit. 7.922.827.600
- Date avancement: 18.08.1989
- Montant Lires: 27.740.190.429
- Date achèvement travaux: 18.08.1989
- Le montant des travaux exécutés au 18.08.1989 comprend la révision des prix.

Autoroute ROME-NAPLES élargissement à trois voies du tronçon  
S. Cesareo-Frosinone - Lot n. 2 du km. 33+500 au km. 45+000.

- Organisme concessionnaire:

AUTOSTRAD E CONCESSIONI E COSTRUZIONI AUTOSTRAD S.p.A

- Date du contrat: 19-02-1987

: n. 9065 du rép.

- Date consignation travaux: 23-07-1986

- Montant net travaux: 43.540.209.970

- Date avancement: 31-05-1990

- Montant Lires: 39.036.611.000

- Date révision: 31-05-1990

- Montant Lires: 1.942.996.000

Les travaux ont été pris en adjudication par un  
Regroupement de Sociétés.

Les travaux exécutés par CO.GE.I S.p.A. au 14-11-1989  
égalent à £. 34.549.443.000= y compris la Révision des Prix.

- Déblais	m3	798.290
- Remblais d'emprunt	m3	406.400
- Préparation de l'emprise	m3	757.640
- Pieux différents 0	ml	2.567
- Béton pour B.A.	m3	34.570
- Coffrage	m2	47.100
- Acier	Kg	2.338.640
- Stabilité au ciment	m3	100.000
- Béton bitumineux	m2	774.070

Travaux de construction du Lot 22/bis "INGANNO" de l'Autoroute  
MESSINA-PALERMO.

- Maître d'Ouvrage:  
CONSORZIO AUTOSTRADE MESSINA - PALERMO
- Date du contrat: 07/03/1988
- Numéro du contrat: n° 1612 du rép. enrg. à Messina le  
28/03/1988
- Date de démarrage: 08/03/1988
- Montant du marché: LIT. 44.449.816.002
- Avenant: du 16/03/1990, enrg. à Messina le 04/04/1990 sous  
le n° 1868
- Date avancement: 15/02/1992
- Montant lires: 43.963.041.753

Le montant des travaux exécutés dans la cat. 6: Lit. 40.549.000.000= dont  
Lit. 21.000.000.000= en viaducs.



Assignation en concession du Projet exécutif des travaux de construction du raccord entre la S.S. n° 280/reacc. et la Tangentielle Est de Catanzaro.

- MAITRE D'OUVRAGE : A.N.A.S. - AZIEMDA NAZIONALE AUTONOMA STRADE, ROME
- Date de démarrage : 08/06/1989
- Date du contrat : 05/01/1990, Rép. n° 19965
- Montant du marché : Lit. 62.937.000.000=
- Date avancement : 15/10/1992
- Montant liras : 59.876.993.764=
- Date révision : 15/10/1992
- Montant liras : 11.543.610.000=
- Quote part % : 25,00

Les travaux ont été pris en adjudication par un Groupement d'Entreprises dont la CO.GE.I. S.p.A., participe à 25,00%

Autoroute MILANO - NAPOLI.

Echangeur direct entre les Autoroutes A1 et A11 et des ouvrages annexes, Lot 2 (Firenze)

- MAITRE D'OUVRAGE : AUTOSTRADA - CONCESSIONE E COSTRUZIONI AUTOSTRADA S.p.A.
- Date de démarrage : 12/11/1990
- Date du contrat : 24/10/1990, 05/01/1990, enrg. Rome, sous le numero 012503
- Montant du marché : Lit. 14.340.799.800=
- Date achèvement : Lit. 30/08/199
- Acte additionnel : n° 1 du 12/03/1992 de Lit. 609.900.338= en cours d'approbation de Lit. 1.559.182.122=
- Date avancement : 30/08/1992
- Montant liras : 8.272.879.378=
- Quote part % : 50,00

Les travaux ont été pris en adjudication par un Groupement d'Entreprises: CO.GE.I. S.p.A. (chef de file) et COSTRUZIONI MAMBRINI S.p.A.

Le montant des travaux exécutés se rapporte à la seule part COGEI.

Travaux de construction du raccord entre la S.S. n° 280/reacc.  
et la Tangentielle Est de Catanzaro.

- MAITRE D'OUVRAGE	: A.N.A.S. - AZIENDA NAZIONALE AUTONOMA STRADE, ROME
- Date du contrat	: 02/08/1991, Rép. n° 20764
- Date de démarrage	: 14/12/1990
- Montant du marché	: Lit. 36.790.550.000=
- Date avancement	: 31/12/1992
- Montant lires	: 18.562.877.176=
- Quote part %	: 25,00

Travaux de construction du Lot 22 /bis "INGANNO" de l'Autoroute  
MESSINA-PALERMO, lot d'achèvement.

- MAITRE D'OUVRAGE : CONSORZIO AUTOSTRADA MESSINA  
PALERMO
- Date du contrat : 10/10/1991, enrg. à Messina le  
23/10/1991 sous le n° 4844  
Serie III
- Date de démarrage : 30/07/1991
- Montant du marché : Lit. 16.835.380.016=
- Date avancement : 10/05/1992
- Montant lires : 15.342.103.772=

Le montant des travaux exécutés pour la cat. 6 est de Lit.  
13.165.000.000=

R.N. N° 106 "JONICA"  
Travaux d'élargissement à quatre voies, Lot 5 du Km 7+148 au Km  
12+138.  
(Policoro-Prov. Matera)

- MAITRE D'OUVRAGE : A.N.A.S. - AZIENDA NAZIONALE  
AUTONOMA DELLE STRADE.  
- Date du contrat : 12/03/1991, Rép. 20527, enrg. à  
Rome  
- Date de démarrage : 19/12/1990  
- Date achèvement prévue : 07/12/1992  
- Montant du marché : Lit. 23.692.757.077=  
- Date avancement : 10/12/1992  
- Montant lires : 10.084.684.573=  
- Date révision : 10/12/1992  
- Montant lires : 326.033.461=  
- Date achèvement : /10/12/1992  
- Quote part % : 70,00

Travaux exécutés en Groupement d'entreprises: COGEI S.P.A. (chef  
de file) et FERRARA OTTAVIO S.p.A.

Le montant des travaux exécutés se rapporte à la seule part  
COGEI.

AQUEDUCS, EGOUTS ET INSTALL. D'IRRIGATION

Travaux pour la complète exploitation des ressources hydriques  
du complex d'irrigation SALSO-SIMETO.  
Schéma d'irrigation "GERBINI III".

- Maître d'Ouvrage:

CONSORZIO DI BONIFICA DELLA PIANA DI CATANIA

- Date du contrat: 16/07/1990

- Numéro du contrat: rép. n° 32982

- Date de demarrage: 20/04/1990

- Montant du marché: Lit. 16.215 .039 .308

- Date avancement: 10/12/1990

- Montant liras: 5. 513.113 .421

- Quote part (%): 40,00

Les travaux ont été adjudés par le Groupement d'Entreprises  
S.A.F.A.B. S.p.A. et CO.GE.I. S.p.A.

Le montant des travaux exécutés se rapporte à la seule part COGEI SPA

Travaux pour la complète exploitation des ressources hydriques  
du complex d'irrigation SALSO-SIMETO.  
Schéma d'irrigation CAVAZZINI III, 2 ° Tronçon, Lot A.

- MAITRE D'OUVRAGE : CONSORZIO DI BONIFICA DELLA PIANA  
DI CATANIA
- Date du contrat : 12/02/1990, Rép. n° 18178
- Date de demarrage : 10/11/1989
- Montant du marché : Lit. 11.707.410.000
- Date achèvement : Lit. 21/08/1992
- Acte additionnel : du 26/06/1991 de Lit.  
189.585.019= et du 21/04/1992 de  
Lit. 1.580.962.230=
- Date avancement : 13/11/1992
- Montant lires : 12.736.679.916=

La date d'achèvement a été prorogée de trois mois.



Travaux de modernisation de l'installation de l'irrigation du  
Metapontino.  
Projet 14/177.

- MAITRE D'OUVRAGE : CONSORZIO DI BONIFICA  
BRADANO-METAPONTO
- Date du contrat : 04/06/1986, Rép. n° 6694, enrg.  
à Rome le 11/04/1986 sous le n°  
7758.
- Date de démarrage : 28/02/1986
- Montant du marché : Lit. 85.088.200.000
- Avenants : du 20/04/1988 n° 1901, enrg. à  
Matera le 28/04/1988 sous le n°  
698 et du 13/03/1991 n° 1977,  
enrg. à Matera le 27/04/1991 sous  
le n° 658.
- Date avancement : 31/07/1991
- Montant lires : 43.212.267.392=
- Date révision prix : 31/07/1991
- Montant lires : 2.799.091.386
- Quote part % : 50,00%

Les travaux ont été adjugés par un Groupement d'Entreprises dont  
la CO.GE.I. S.p.A., participe à 50%.

Le montant de travaux exécutés, se rapporte à la seule part  
CO.GE.I. S.p.A.

Travaux de modernisation de l'installation d'irrigation du  
Metapontino.  
Projet 60/2582.

- Maître d'Ouvrage:

CONSORZIO DI BONIFICA BRADANO - METAPONTO

- Date du contrat: 08/06/1988

- Numéro du contrat: rèp. n. 183496, enrg. à Matera le  
16/06/1988

- Date de démarrage: 08/06/1988

- Montant du marché: Lit. 128.111.000.000

- Date avancement: 30/04/1991

- Montant lires: 42.093.151.796

- Quote part (%): 34,00

Travaux pris en adjudication par un Groupement d'Entreprises  
dont la CO.GE.I. S.p.A., participe à 34%.  
Le montant des travaux exécutés se rapporte à la seule part  
CO.GE.I. S.p.A.

Travaux de restructuration de l'installation d'irrigation en  
aval de la Digue "Pozzillo" - 2° lot.

Organisme Concessionnaire:  
CONSORZIO DI BONIFICA GAGLIANO CASTELFERRATO - Troina

- Date du contrat: 07-11-1987
- : Rep. n.1123
- Date consignation travaux: 25-11-1987
- Montant net travaux: 2.700.250.000
- Date écheance: 22-04-1990
- Acte additionnel:  
1° Acte Additionnel L.250.693.744=.
- Date avancement: 30-04-1989
- Montant Lire: 1.794.917.000
- Date achevement travaux: 16-11-1989

Travaux de construction du système d'acqueduc ANCIPA.  
Lot. 1.

- Maître d'Ouvrage:

AGENZIA PER LA PROMOZIONE DELLO SVILUPPO NEL MEZZOGIORNO  
Contrat cédé à l'E.A.S. - ENTE ACQUEDOTTI SICILIANI (PA)

- Date du contrat: 07/10/1987
- Numéro du contrat: Rèp. n° 6759
- Date de démarrage: 09/11/1987
- Montant du marché: Lit. 90.611.355.442
- Avenant: du 24/06/1989, enrg. à Catania le 29/06/1989 sous le  
n° 1178/E.
- Date avancement: 19/10/1992
- Montant lires: 70.157.695.144
- Date révision prix: 28/02/1992
- Montant lires: 4.169.280.024
- Quote part (%): 50,00

Travaux pris en adjudication par le Groupement d'Entreprises  
LODIGIANI S.p.A. et CO.GE.I. S.p.A, dont la CO.GE.I. S.p.A.,  
participe à 50%.

Travaux de réorganisation du réseau d'irrigation de la zone de bonification, Lot 1  
Projet n° 1/f/85.

- MAITRE D'OUVRAGE : CONSORZIO DI BONIFICA DELLA BASSA VALLE DEL COGHINAS
- Date du contrat : 29/06/1986, Rép. n° 8398, enrg. le 01/10/1986
- Date de démarrage : 29/07/1986
- Montant du marché : Lit. 18.735.847.894=
- Date avancement : 26/10/1992
- Montant lires : 19.268.098.817=
- Date révision prix : 15/05/1992
- Montant lires : 4.086.975.377=

Travaux d'exploitation à but d'irrigation des eaux stockées dans la réserve di Garcia sir le fleuve Belice gauche adduction et distribution zone 1/A.

- Maître d'Ouvrage:

CONSORZIO DI BONIFICA BASSO BELICE CARBOJ

- Date du contrat: 21/04/1988

- Numéro du contrat: rép. n° 430, enrg. à Sciacca (AG) le  
27/04/1988

- Date de démarrage: 24/02/1988

- Montant du marché: Lit. 36.506.656.000

- Date avancement: 30/11/1991

- Montant liras: 10.852.980.070=

- Date révision prix: 30/11/1991

- Montant liras: 440.119.400=

- Quote part (%): 30,00

Les travaux ont été pris en adjudication par un Groupement d'Entreprises dont la CO.GE.I. S.p.A., participe à 30%.  
Le montant des travaux exécutés est relatif à la seule part CO.GE.I. S.p.A.

Travaux de construction de l'acqueduc LISCIA - Renforcement  
réseau Est.

- Organisme Concessionnaire:  
ENTE SARDO ACQUEDOTTI E FOGNATURE - Cagliari
  
- Date du contrat: 29.11.1988  
: enrg. à Cagliari (Italie) sous le n° 11164 du  
rép.
  
- Date remise travaux: 19.10.1988
  
- Montant net travaux: Lit. 5.291.623.500
  
- Date avancement: 29/10/1990
  
- Montant Lires: 5.290.181.210
  
- Date achèvement travaux: 29.10.1990

Travaux de restructuration et d'adaptation fonctionnelle des réseaux d'irrigation dépendants du Canal de cote 100 - LOT B - 1° tronçon.

- Organisme Concessionnaire:

CONSORZIO DI BONIFICA LAGO DI LENTINI - Lentini (SR)

- Date du contrat: 16.11.1988

Rép. 79143

- Date remise travaux: 22.11.1988

- Montant net travaux: Lit. 11.841.488.942

- Acte additionnel:

du 14.05.1990, enrg. le 11.06.1990 sous le n° 264

- Date avancement: 24.09.1990

- Montant lires: 10.065.265.601



Travaux de somme urgence pour la révision et le renforcement de la conduite de l'ANCIPA TROINA-GAGLIANO, pour l'approvisionnement hydrique de Caltanissetta.

- MAITRE D'OUVRAGE	: E.A.S. - ENTE ACQUEDOTTI SICILIANI, (PA)
- Date du contrat	: 20/02/1989, Rép. n° 7787
- Date de demarrage	: 21/07/1989
- Montant du marché	: Lit. 3.860.873.625=
- Date avancement	: 30/09/1989
- Montant lires	: 3.840.914.757=
- Date achèvement	: 30/09/1989
- Quote part (%)	. 50,00

Les travaux ont été pris en adjudication par le Groupement des Entreprises LODIGIANI S.p.A. et CO.GE.I. S.p.A., dont la COGEI participe à 50%.

Travaux de construction du système d'acqueduc ANCIPA, Lot 2.  
Projet Spécial 30/B0505.

- MAITRE D'OUVRAGE : E.A.S. - ENTE ACQUEDOTTI  
SICILIANI, (PA)
- Date du contrat : 28/07/1989, enrg. à Palermo le 1<sup>o</sup>  
Sep 1989 sous le n° 1152 Mod 1E
- Date de démarrage : 04/08/1989
- Montant du marché : Lit. 85.889.134.993=
- Acte additionnel : du 18/05/1991, rép. n° 230, enrg.  
à Palermo le 23/05/1991 sous le  
n° 2637
- Date avancement : 31/05/1992
- Montant lires : 25.707.518.056
- Quote part (%) : 50,00

Les travaux ont été pris en adjudication par le Groupement des  
Entreprises LODIGIANI S.p.A. et CO.GE.I. S.p.A., dont la COGEI  
participe à 50%.

Travaux de construction du système d'acqueduc ANCIPA, Lot 3.  
1er tronçon

- MAITRE D'OUVRAGE : E.A.S. - ENTE ACQUEDOTTI  
SICILIANI, (PA)
- Date du contrat : 07/09/1989, enrg. à Palermo le  
03/01/1990, rép. n° 6834
- Date de démarrage : 12/09/1989
- Montant du marché : Lit. 77.737.481.709=
- Acte additionnel : du 28/06/1991, rép. n° 241,  
enrg. le 04/07/1991 sous le n°  
780
- Date avancement : 11/03/1992
- Montant lires : 71.085.941.138
- Date révision prix : 28/02/1992
- Montant lires : 3.698.177.173
- Quote part (%) : 50,00

Les travaux ont été pris en adjudication par le Groupement des  
Entreprises LODIGIANI S.p.A. et CO.GE.I. S.p.A., dont la COGEI  
participe à 50%.

Travaux d'achèvement du Réservoir CASTELLO et laçage du torrent  
Gebbia en territoire de Bivona (AG).

- Maître d'Ouvrage:

E.S.A. - ENTE SVILUPPO AGRICOLO

- Date du contrat: 05/07/1989

- Numéro du contrat: Rép. n° 5689/B, enrg. à Catania le  
07/07/1989

- Date de démarrage: 11/07/1989

- Montant du marché: Lit. 26.956.826.950

- Date d'achèvement: 10/11/1992

- Date avancement: 30/06/1992

- Montant lires: 25.701.243.927

- Date révision prix: 30/06/1992

- Montant lires: 2.777.322.039=

Travaux de construction de la station de pompage du fleuve BASENTO, du adducteur et des ouvrages d'adaptation du canal d'irrigation existant de "RECOLETA" pour la région de "San Basilio" - Scansano Jonico, Policoro.  
Projet d'urgence hydrique 1988/1989.

- Maître d'Ouvrage:

CONSORZIO DI BONIFICA DI BRADANO E METAPONTO

- Date du contrat: 01.09.1989
- Numéro du contrat: 2185, enrg. à Matera le 13.09.1989
- Montant du marché: 25.497.567.000
- Date avancement travaux: 06.03.1990
- Montant lire: 8.254.559.427
- Date achèvement travaux: 06.03.1990
- Quote part (%): 34.00

Les travaux ont été pris en adjudication par un Groupement de Sociétés.  
Le montant des travaux exécutés se rapporte à la seule part CO.GE.I. S.p.A.

TRAVAUX DE BATIMENTS

Construction de la Nouvelle Maison d'Arrêt de la Commune de Giarre.

- Maître d'Ouvrage:

COMUNE DI GIARRE

- Date du contrat: 09.10.1987

- Numéro du contrat: rép. n° 121

- Date de démarrage: 15.12.1986

- Montant du marché: Lit: 5.034.123.717

- Date avancement travaux: 30.06.1989

- Montant liras: 5.557.663.000

- Date d'achèvement: 30.06.1990

TRAVAUX MARITIMES



Travaux de construction du bassin pour le stockage des bateaux appartenant au Port Industriel de Augusta.

- MAITRE D'OUVRAGE : CONSORZIO A.S.I. DI SIRACUSA
- Date du contrat : 08/11/1988, Rép. n° 18909, enrg. à Siracusa le 02/12/1988
- Date de démarrage : 16/02/1989
- Montant du marché : Lit. 18.047.974.000=
- Date d'achèvement : 05/11/1991
- Date avancement : 31/12/1991
- Montant lires : 18.022.630.000=
- Date révision : 31/12/1991
- Montant lires : 1.386.231.000=
- Quote part (%) : 30,00

Travaux de construction des nouvelles structures interieures et  
amenagement de la sortie du Port de Ortona.

- MAITRE D'OUVRAGE : CONSORZIO PER L'AREA DI SVILUPPO  
INDUSTRIALE DELLA VALLE DEL  
PESCARA
- Date du contrat : 04/08/1986, Rép. n° 24732, enrg.  
à Chieti le 25/08/1986
- Date de demarrage : 23/07/1986
- Montant du marché : Lit. 26.163.109.035=
- Date d'achèvement prevuée : 02/11/1991
- Date avancement : 02/09/1991
- Montant lires : 26.142.855.345=
- Date révision : 02/09/1991
- Montant lires : 595.571.000=
- Date achèvement travaux : 02/09/1991
- Quote part (%) : 31,59

Les travaux ont été pris en adjudication par un Groupement  
d'Entreprises dont la COGEI S.p.A. participe au 22,41%.

L'exécution des travaux a été suspendue pendant les années  
1987/1990 pour un total de 511 jours.

A partir de 03/08/1990 la CO.GE.I. participe au 31,59%.

Port de Augusta.

Travaux de soulèvement du barrage à niveau +4mt. tout le  
langueur en correspondance des bras NN. 1/2 et 3.

- MAITRE D'OUVRAGE : MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI -  
GENIO CIVILE OO.MM.
- Date du contrat : 23/10/1989, Rép. n° 1714
- Date de démarrage : 27/09/1989
- Montant du marché : Lit. 2.875.470.347
- Date d'achèvement prévue : 26/09/1990
- Date avancement : 27/07/1990
- Montant lires : 2.873.394.197=
- Date achèvement travaux : 27/07/1990
- Quote part (%) : 30,00

MARINA DI RAGUSA.

Travaux de prolongation du quai entre la distance 141,50 et 268.

- MAITRE D'OUVRAGE : MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI -  
GENIO CIVILE OO.MM.
- Date du contrat : 30/03/1988, Rép. n° 10705
- Date de démarrage : 24/05/1988
- Montant du marché : Lit. 3.535.116.000
- Date avancement : 30/09/1990
- Montant lires : 3.533.819.584=
- Date révision prix : 30/09/1990
- Montant lires : 204.750.000
- Date achèvement travaux : 30/09/1990

Travaux de dragage des obstacles sous-marines empêchant la navigation dans le Port de Augusta.

- MAITRE D'OUVRAGE	: A.S.I.-AREA SVILUPPO INDUSTRIALE, Siracusa
- Date du contrat	: 22/02/1989
- Date de démarrage	: 22/02/1989
- Montant du marché	: Lit. 46.165.803.906
- Date avancement	: 20/02/1990
- Montant liras	: 46.165.800.000=
- Date achèvement travaux	: 20/02/1990
- Quote part (%)	: 40,00

Les travaux ont été pris en adjudication par le Groupement des Entreprises: CONDOTTE S.p.A., DRAGOMAR S.p.A. et CO.GE.I. S.p.A.

REGIONE SICILIANA

UFFICIO DEL GENIO CIVILE DI CALTANISSETTA

CALTANISSETTA



=====

OGGETTO: Albo Nazionale dei Costruttori

Certificazione attestante la esecuzione dei lavori, rilasciata ai sensi dello  
art. 14 della Legge 10 Febbraio 1962 n°57 e dell'art.18 lettera b) della  
LEGGE 8 Agosto 1977 N°584

=====

Il sottoscritto Dott. Ing. Antonio CASTIGLIONE nato a CALTANISSETTA il  
01.01.1955 legittimato a rilasciare la documentazione in oggetto nella sua  
qualità di INGEGNERE CAPO F.F. dell'Ufficio del Genio Civile di CALTANISSETTA:

C E R T I F I C A

che i lavori di sistemazione idraulica del fiume Maroglio, dalla confluenza  
con il fiume GELA alla confluenza con il torrente Cimia in località Conca  
D'Oro - Gela (CL), finanziati con progetto d'investimento immediatamente ese-  
guibili per interventi di rilevante interesse economico ai sensi dell'art. 14  
della Legge 28.02.1986 n° 41, ed assunti con contratto d'appalto del  
21.12.1988 n° 3739 di REP. e registrato a Palermo in data 26.02.91 al  
n° 28331-2/1A, per i quali nel bando di gara è stata richiesta la categoria  
10 B di cui al D.M. 25 Febbraio 1982 n° 770, sono stati assunti dal R.T.I  
IMPRESITAL S.p.A. oggi CO.GE.I. S.p.A. con sede in Roma Via di Villa Patrizi  
n.7 iscritta all' A.N.C. con matricola n° 3637210 e Ing. Pietro Di Vincenzo  
& C. S.p.A. oggi DI VINCENZO S.p.A. con sede in Caltanissetta, Via Napoleone  
Colajanni n. 314/E iscritta all'A.N.C. con matricola n° 5230704 -capogruppo

IMPRESITAL S.p.A oggi CO.GE.I. S.p.A.

L'importo dei lavori al netto è il seguente:

- Importo contrattuale	£. 9.353.140.847=
- Importo per perizie di variante	£. =====
- Importo totale dei lavori	£. 9.353.140.847=

I lavori sopra descritti:

- hanno avuto inizio in data 18.10.1988

- sono stati ultimati in data 27.07.1992 ed eseguiti per un importo netto di £. 6.841.593.000= così suddiviso:

A) LAVORI DI DIFESA E SISTEMAZIONE IDRAULICA	£. 5.872.432.922=
B) LAVORI DI SISTEMAZIONE FORESTALE	£. 637.333.683=
C) LAVORI DI OPERE DI FONDAZIONE	£. 331.826.395=

S O M M A N O

£. 6.841.593.000=

I lavori sono diretti, per conto del R.T.I. assuntore sopra individuato dallo Ing. Giuseppe PINTAGRO GALLERIZZI nato a Tortorici (ME) il 09/01/36.

I lavori, sono stati eseguiti dal R.T.I. IMPRESITAL S.p.A oggi CO.GE.I. S.p.A con sede in Roma VIA Di Villa Patrizi n.7 iscritta all'A.N.C. con matricola n° 3637210 e Ing. Pietro Di Vincenzo & C. S.p.A oggi DI VINCENZO S.p.A con sede in Caltanissetta, Via Napoleone Colajanni n. 314/E iscritta all'A.N.C. con matricola n° 5230704.

Inoltre sono intervenute le seguenti Imprese per subappalti previsti dal D.M. 25.02.82 n° 770 ed art. 12 del Regolamento di attuazione di cui alla Legge 15.11.86 n° 768:

A) Impresa GEO DRILLING di Fangano Emiddio Francesco con sede in Lentini (SR) C.da Burrione S.P. 16, iscritta all'A.N.C. con matricola n° 9341269, per

i lavori di esecuzione di palificazione di grande diametro.

Subappalto autorizzato dal Ministero dei Lavori Pubblici - Provveditorato

Regionale alle Opere Pubbliche per la Sicilia con provvedimento n.14676/1399

del 04.02.1991 per l'importo di £. 250.000.000=.

I suddetti lavori iniziati nell'aprile 1991, sono stati interamente ultimati

nel Dicembre 1991, ed eseguiti per l'importo di £. 151.356.300=.

(diconsi lire CENTOCINQUANTUNOMILIONITRECENTOCINQUANTASEIMILATRECENTO).

B) Impresa MASSAROTTI GIULIO con sede in Caltagirone, Via M. Milazzo N° 71;

iscritta all' A.N.C. con matricola n.4708800, per i lavori di bonifica da

ordigni bellici.

Subappalto autorizzato dal Ministero dei Lavori Pubblici - Provveditorato Re-

gionale alle Opere Pubbliche per la Sicilia con provvedimento n.11728/13870

del 14.11.90 per l'importo di £. 230.000.000=.

I suddetti lavori iniziati nel Novembre 1990, sono stati interamente ultimati

nel Febbraio 1991 ed eseguiti per l'importo di £. 151.900.000=.

(diconsi lire CENTOCINQUANTUNOMILIONINOVECENTOMILA).

C) Impresa SOCIETA' GEOLOGICA MEDITERRANEA di G. MARCINNO' & C. S.a.S con sede

in Catania, C.SO Sicilia N. 105, iscritta alla C.C.I.A.A. di Catania al

n. 166312, per i lavori di sondaggi geognostici.

Subappalto autorizzato dal Ministero dei Lavori Pubblici - Provveditorato

Regionale alle Opere Pubbliche per la Sicilia con provvedimento n.7650

del 24.05.1989 per l'importo di £. 30.000.000=.

I suddetti lavori sono stati interamente ultimati ed eseguiti per l'importo

di £. 15.000.000=.

(diconsi lire QUINDICIMILIONI ).



D) Impresa SAEM S.p.A oggi IT.IN S.p.A con sede in Roma, Via S. Pistoiese n.57,  
iscritta all'A.N.C. con matricola n. 8734410 per i lavori di impianti elettrici, e idrici.

Subappalto autorizzato dal Ministero dei Lavori Pubblici - Provveditorato  
Regionale alle Opere Pubbliche per la Sicilia con provvedimento n.6257/8963  
del 26.06.89 per l'importo di £. 150.000.000=.

I suddetti lavori sono stati interamente ultimati ed eseguiti per l'importo  
di £. 30.000.000=.


(diconsi lire TRENTAMILIONI).

I lavori sono stati eseguiti regolarmente e con buon esito e non hanno dato  
luogo a vertenze.

CALTANISSETTA, li 02 FEB. 1994


IL DIRETTORE DEI LAVORI

(GEOM. CALOGERO FALZONE)



INGEGNERE CAPO F.F.

ING. ANTONIO CASTIGLIONE




Il presente certificato è stato rilasciato all'Impresa CO.GE.I. S.p.A iscritta  
all'A.N.C. con matricola n° 3637210, con sede in Roma, Via di Villa Patrizi  
N.7 .

Si dichiara sotto responsabilità, che quanto indicato nel presente certificato  
trova riscontro nella documentazione in atti.

CALTANISSETTA, li 02 FEB. 1994



IL DIRETTORE DEI LAVORI

(GEOM. CALOGERO FALZONE)



INGEGNERE CAPO F.F.

ING. ANTONIO CASTIGLIONE



Dott. FRANCESCO COLISTRA  
NOTAIO  
00195 ROMA - Via F. Corridoni, 14  
Tel. 3724347

La presente copia fotostatica che si compone di  
n. 11 fogli è conforme al documento esibitomi  
e previa collazione restituito.

Roma li 20 GIU. 1994

*Francesco Colistra*



(Un timbre fiscal de 5000 liras)

REGION SICILIENNE

(Bureau du Génie Civil de Caltanissetta)

CALTANISSETTA

Objet: Tableau National des Constructeurs:  
certificat concernant l'exécution des  
travaux délivré aux termes de l'article 14  
de la loi du 10/02/1962 n. 57 et de  
l'article 18 lettre b) de la loi du 8 août  
1977 n. 584.

Je soussigné Doct. Ing. Antonio CASTIGLIONE, né à  
Caltanissetta le 01.01.1955 légitimé à délivrer la  
documentation en question en qualité de Ingénieur  
Chef du Bureau du Génie Civil de Caltanissetta

CERTIFIE

- que les travaux d'assainissement hydraulique du  
fleuve Maroglio, de la confluence avec le fleuve  
GELA à la confluence avec le torrent Cimia en  
localité Conca D'Oro - Gela (CL), financés par  
projet d'investissement, immédiatement exécutables  
pour interventions de considérable intérêt  
économique aux termes de l'article 14 de la Loi  
28.02.1986 n. 41 et pris par contrat  
d'adjudication du 21.12.1988 n. 3739 et enregistré

à Palerme le 26.02.91 au n. 28331-2/1A pour  
lesquels dans l'avis de concours a été demandée  
la catégorie 10 b dont au D.M. du 28 février 1982  
n. 770, ont été pris par le R.T.I. IMPRESITAL  
S.p.A

aujourd'hui CO.GE.I. S.p.A. ayant son siège  
social à Rome au n.7, Via di Villa Patrizi T.N.C.  
au n. 3637210 et Ing. Pietro Di Vincenzo & Co.  
S.p.A. aujourd'hui DI VINCENZO S.p.A. ayant son  
siège social à Caltanissetta au n. 314/E, Via  
Napoleone Colajanni inscrite au T.N.C. au n.  
5230704 - Conducteur du groupe IMPRESITAL S.p.A.  
aujourd'hui CO.GE.I. S.p.A.

Le montant des travaux est le suivant:

- montant contractuel	L. 9.353.140.847
- montant pour expertises de variation	
	L. =====
- montant total des travaux	L. 9.353.140.847

Les travaux que nous venons de décrire:

- ont commencé le 18.10.1988
- ont été achevés le 27.07.1992 et exécutés pour  
un montant net de L. 6.841.593.000 ainsi divisé:

A) TRAVAUX DE PROTECTION ET ASSAINISSEMENT DES EAUX	L. 5.872.432.922
B) TRAVAUX D'ASSAINISSEMENT DES FORETS	

	L. 637.333.683
C) TRAVAUX DE FONDATIONS	L. <u>331.826.395</u>
TOTALISENT	L. 6.841.593.000

L'Ing. Giuseppe PINTAGRO GALLARIZZO né à Tortorici (ME) le 09.01.1936 a dirigé les travaux pour le compte du R.T.I. (Regroupement Temporaire d'Entreprises) adjudicataire sus-mentionné.

Les travaux ont été exécutés par le R.T.I. (Regroupement Temporaire d'Entreprises) IMPRESITAL S.p.A aujourd'hui CO.GE.I. S.p.A. ayant son siège social à Rome au n.7, Via di Villa Patrizi inscrite au T.N.C. au n.3637210 et Ing. Pietro Di Vincenzo & C. S.p.A. aujourd'hui DI VINCENZO S.p.A. ayant son siège social à Caltanissetta au n. 314/E, Via Napoleone Colajanni inscrite au T.N.C. au n. 5230704.

Sont intervenues, en outre, les entreprises suivantes pour Sous-adjudications prévues par le D.M. n. 770 du 25.02.82 et art. 12 de la Réglementation de réalisation dont à la Loi n. 768 du 15.11.86:

A) Entreprise GEO DRILLING de Fangano Emiddio Francesco ayant son siège social à Lentini (SR) au n. 16, C.da Burrione S.P., inscrite au T.N.C. n.

9341269 pour travaux d'exécution de pilotage de grand diamètre.

Sous-adjudication autorisée par le Ministère des Travaux Publics pour la Sicile par disposition n. 14676/1399 du 04.02.1991 pour le montant de L. 250.000.000.

Les sus-dits travaux commencés en Avril 1991, ont été entièrement achevés en Décembre 1991, et exécutés pour le montant de L. 151.356.300

(à savoir cent cinquante et un million, trois cent cinquante six mille, trois cent)

B) Entreprise MASSAROTTI GIULIO ayant son siège social à Caltagirone au n. 71, Via M. Milazzo, inscrite au T.N.C. n.4708800, pour travaux de déminage.

Sous-adjudication autorisée par le Ministère des Travaux Publics pour la Sicile par disposition n. 11728/13870 du 14.11.1990 pour le montant de L. 230.000.000.

Les sus-dits travaux commencés en Novembre 1990, ont été entièrement achevés en Février 1991, et exécutés pour le montant de L. 151.900.000

(à savoir cent cinquante et un million, neuf cent mille)

C) Entreprise SOCIETA GEOLOGICA MEDITERRANEA de G.

MARCINNO' & C. S.a.S, ayant son siège social à Catania au n. 105, C.so Sicilia, inscrite à la C.C.I.A.A. de Catane au n. 166312 pour travaux de sondages géognostiques.


Sous-adjudication autorisée par le Ministère des Travaux Publics pour la Sicile par disposition n. 7650 du 24.05.1989 pour le montant de L. 30.000.000.

Les sus-dits travaux ont été entièrement achevés et exécutés pour le montant de L. 15.000.000 (à savoir quinze millions)

Timbre du Dott. Francesco Colistra - Notaire  
C'est une copie conforme à l'original qui m'a été présentée et rendue en 1 feuille.

Rome le 20 juin 1994

Timbre du Notaire Colistra Francesco Via F. Corridoni 14, Rome - Signature illisible



MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Provveditorato Regionale alle OO.PP. per la Basilicata


P O T E N Z A

Oggetto: Albo Nazionale dei Costruttori: certificazione attestante la esecuzione di lavori, rilasciata ai sensi dell'art.14 della legge 10 febbraio 1962 n.57 e dell'art.10 lett.b) della legge 8 agosto 1977, n.584.

Il sottoscritto Ing. IANNIELLO Giuseppe, legittimato a rilasciare la documentazione in oggetto nella sua qualita' di Ingegnere Capo del Provveditorato Regionale alle OO.PP. per la Basilicata,

C E R T I F I C A

che i lavori di: "Sistemazione idraulica del torrente Sarmento tra il ponte della SS.92 e la traversa di S.Giorgio Lucano", assunti con contratto di appalto in data 16.06.89 n.4833 di rep., registrato a Potenza il 19.06.90 al n.1505, e successivi atti aggiuntivi, per i quali nel bando di gara e' stata richiesta la categoria 10 b di cui al D.M. 28 febbraio 1982 n.770, sono stati assunti dall'impresa: "COS.NA-Costruzioni Nazionali S.p.A." con sede in Tremestieri Etneo (CT) alla via Novaluce n.67, iscritta all'Albo Nazionale dei Costruttori con matricola n. 3637311, successivamente incorporata, con atto di fusione, nella Societa' per Azioni CO.GE.I. Costruzioni Generali Italiane iscritta all'Albo Nazionale dei Costruttori con matricola n.3637210.





L'importo dei lavori e' il seguente:

-importo contrattuale netto	L. 15.685.632.000
-importo suppletivo netto	<u>L. 4.727.808.000</u>
Importo totale netto dei lavori	L. 20.413.440.000

I lavori sopra descritti hanno avuto inizio in data 18.10.1988, sono in corso di esecuzione alla data odierna, ed eseguiti alla data del 30.04.1994 per l'importo complessivo netto di L.12.988.039.850 cosi' suddiviso:


1) Lavori a misura al netto	L. 10.425.686.317
2) Revisione prezzi	<u>L. 2.562.353.533</u>
Totale importo eseguito al 30.04.1994	L. 12.988.039.850

Ha diretto i lavori per conto dell'impresa assuntrice sopra individuata fino alla data del 31.12.1991, il Signor AIELLO Ing. Bernardo nato a Patti il 12.12.1952, in qualita' di Direttore Tecnico della COS.NA S.p.A., oggi CO.GE.I. S.p.A..

Alla predetta data del 31.12.1991 sono stati eseguiti lavori per complessive nette f. 3.287.206.682 cosi' distinte:

1) Lavori a misura al netto	f. 2.894.696.141
2) Revisione prezzi	<u>f. 392.510.541</u>
Totale importo eseguito al 31.12.1991	f. 3.287.206.682

Ha diretto i lavori per conto dell'impresa assuntrice sopra individuata dalla data dell'1.1.1992, a tutt'oggi il Sig. PINTAGRO GALLARIZZO Ing. Giuseppe nato a Tortorici (ME) il 09.01.1936, in qualita' di Direttore Tecnico della CO.GE.I. S.p.A..



Inoltre sono intervenute le seguenti imprese per sub-appalti:

1) Impresa TRIVELPALI MOLISE S.p.A. con sede in Campobasso ora  
T.P.M. Fondazioni Speciali S.p.A. con sede in Roma matricola  
A.N.C. n.6510703 per esecuzione di colonne consolidate  
(Jet-grouting).

Subappalto autorizzato con note n.2322 del 25.3.91 per  
£.600.000.000, n.796 del 3.3.92 per £.1.600.000.000, n.6616  
del 12.7.93 per £. 1.600.000.000. I lavori in subappalto hanno  
avuto inizio in data 25.3.91 e sono in corso di esecuzione.

Alla data del 30.4.94 sono stati eseguiti lavori per  
£.1.837.500.000.

2) Associazione temporanea di imprese: Olivieri  
Costruttori-SAS Costruzioni e Montaggi e Capalbo Rocco con  
sede in Valsinni matricola A.N.C. n.7617811 (riferita  
all'impresa Olivieri Costruttori) per esecuzione di gabbioni e  
mantellate.

Subappalto autorizzato con nota n.9048 del 13.10.93 per  
£.750.000.000. I lavori in subappalto hanno avuto inizio in  
data 13.10.93 e sono in corso di esecuzione.

Alla data del 30.4.94 sono stati eseguiti lavori per £.  
71.375.400.

3) Ditta Rubolino Anna Mario con sede in Cersosimo iscritta  
alla C.C.I.A.A. al n.4059509, per esecuzione di movimenti di  
terra.

Subappalto autorizzato con nota n.346 del 14.3.94 per



£.150.000.000. I lavori in subappalto hanno avuto inizio in data 14.3.94 e sono in corso di esecuzione.

Alla data del 30.4.94 sono stati eseguiti lavori per £. 7.200.000.

4) Ditta Ventimiglia Giovanni con sede in Cersosimo iscritta alla C.C.I.A.A. al n.43935, per esecuzione di movimenti di terra.

Subappalto autorizzato con nota n.347 del 14.3.94 per

£. 75.000.000. I lavori in subappalto hanno avuto inizio in data 14.3.94 e sono in corso di esecuzione.

Alla data del 30.4.94 sono stati eseguiti lavori per

£. 8.404.000.

5) Ditta Di Sanzo Domenico con sede in S.Costantino Albanese iscritta alla C.C.I.A.A. al n.48587, per esecuzione di movimenti di terra.

Subappalto autorizzato con nota n.348 del 14.3.94 per

£. 75.000.000. I lavori in subappalto hanno avuto inizio in data 14.3.94 e sono in corso di esecuzione.

Alla data del 30.4.94 sono stati eseguiti lavori per


£. 8.283.000.

6) Ditta Valicenti Italo Lucio con sede in Cersosimo iscritta alla C.C.I.A.A. al n.39693, per esecuzione di movimenti di terra.

Subappalto autorizzato con nota n.349 del 14.3.94 per

£. 75.000.000. I lavori in subappalto hanno avuto inizio in





data 14.3.94 e sono in corso di esecuzione.

Alla data del 30.4.94 sono stati eseguiti lavori per  
£. 9.353.000.

7) Ditta Calà Luigi con sede in Cersosimo iscritta alla  
C.C.I.A.A. al n.39395, per esecuzione di movimenti di terra.

Subappalto autorizzato con nota n.350 del 14.3.94 per  
£.75.000.000. I lavori in subappalto hanno avuto inizio in  
data 14.3.94 e sono in corso di esecuzione.

Alla data del 30.4.94 sono stati eseguiti lavori per  
£. 7.544.900.

I lavori sono stati eseguiti, a tutt'oggi, regolarmente e con  
buon esito e non hanno dato luogo a vertenze.

Il presente certificato e' rilasciato, su richiesta,  
all'impresa CO,GE.I. S.p.A. con sede in Roma via Di Villa  
Patrizi n.7, iscritta all'A.N.C. con il n. 3637210 di  
matricola.


Si dichiara sotto responsabilita' che quanto indicato nel  
presente certificato trova riscontro nella documentazione in  
atti.

Prot.n. 4881

Potenza, li' 07.06.94

L'INGEGNERE CAPO

Ing. Giuseppe Ianniello)



Dott. FRANCESCO COLISTRA  
NOTAIO  
00195 ROMA - Via F. Corridoni, 14  
Tel. 3724847

La presente copia fotostatica che si compone di  
n. cinque fogli, è conforme al documento esibitomi  
e previa collazione restituito.

Roma li 20 GIU. 1994

*Francesco Colistra*



(Trois timbres fiscaux de 5000 lires)

MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS

(Inspection Régionale des Travaux Publics pour la Basilicata)

POTENZA

Objet: Tableau National des Constructeurs: certificat concernant l'exécution des travaux délivré aux termes de l'article 14 de la loi du 10/02/1962 n. 57 et de l'article 10 lettre b) de la loi du 8 août 1977 n. 584.

Je soussigné Doct. Ing. IANNIELLO Giuseppe, légitimé à délivrer la documentation en question en qualité de Ingénieur Chef de l'Inspection Régionale des Travaux Publics pour la Basilicata.

CERTIFIE

- que les travaux de: "Assainissement hydraulique du torrent Sarmento entre le pont de la R.N. 92 et la rue transversale de S. Giorgio Lucano", pris par contrat d'adjudication n. 4833 le 16.06.89, enregistré à Potenza le 19.06.90 au n. 1505, et actes additionnels suivants, pour lesquels dans l'avis de concours a été demandée la catégorie 10

adjudicataire sus-mentionnée.

A la date du 31.12.1991 le montant net des travaux exécutés s'élevant à L. 3.287.206.682 se divise ainsi:

1) Travaux à mesure au net	L. 2.894.696.141
2) Révision prix	L. <u>392.510.541</u>

Total montant exécuté au

31.12.1991

L. 1.287.206.682

L'Ing. PINTAGRO GALLARIZZO Giuseppe né à Tortorici (ME) le 09.01.1936 en qualité de Directeur Technique de la CO.GE.I. S.p.A. a dirigé les travaux pour le compte de l'entreprise adjudicataire.

Sont intervenues , en plus, les entreprises suivantes pour Sous-adjudications:

1) Entreprise TRIVELPALI MOLISE S.p.A. ayant son siège social à Campobasso maintenant T.P.M. Fondazioni Speciali S.p.A. ayant son siège social à Rome, matricule T.N.C. n. 6510703 pour exécution de colonnes consolidées (jet-grouting);

Sous-adjudication autorisée par notes n. 2322 du 25.03.91 pour L. 6.000.000.000, n. 796 du 03.03.92 pour L. 1.600.000.000, n. 6616 du 12.07.93 pour L. 1.600.000.000. Les travaux en sous-adjudication ont été commencés le 25.03.91 et sont actuellement

en cours d'exécution.

A la date du 30.04.94 le montant des travaux exécutés s'élève à L. 1.837.500.000.

2) Association Temporaire d'Entreprises: Olivieri Costruttori SAS Costruzioni e Montaggi et Capalbo Rocco ayant son siège social à Valsinni, matricule T.N.C. n. 7617811 (se référant à l'entreprise Olivieri Costruttori) pour exécution de gabions et revêtements.

Sous-adjudication autorisée par note n. 9048 du 13.10.93 pour L. 750.000.000. Les travaux en sous-adjudication ont été commencés le 13.10.93 et sont actuellement en cours d'exécution.

A la date du 30.04.94 le montant des travaux exécutés s'élève à L. 71.375.400.

3) Entreprise Rubolino Anna Mario ayant son siège social à Cersosimo, inscrite à la C.C.I.A.A. au n. 4059509 pour exécution de terrassements. Sous-adjudication autorisée par note n. 346 du 14.03.94 pour L. 150.000.000. Les travaux en sous-adjudication ont été commencés le 14.03.94 et sont actuellement en cours d'exécution.

A la date du 30.04.94 le montant des travaux exécutés s'élève à L. 7.200.000.

4) Entreprise Ventimiglia Giovanni ayant son siège



social à Cersosimo, inscrite à la C.C.I.A.A. au n. 43935 pour exécution de terrassements. Sous-adjudication autorisée par note n. 347 du 14.03.94 pour L. 75.000.000. Les travaux en sous-adjudication ont été commencés le 14.03.94 et sont actuellement en cours d'exécution.

A la date du 30.04.94 le montant des travaux exécutés s'élève à L. 8.404.000.

5) Entreprise Di Sanzo Domenico ayant son siège social à S. Costantino Albanese , inscrite à la C.C.I.A.A. au n. 48587 pour exécution de terrassements.

Sous-adjudication autorisée par note n. 348 du 14.03.94 pour L. 75.000.000. Les travaux en sous-adjudication ont été commencés le 14.03.94 et sont actuellement en cours d'exécution.

A la date du 30.04.94 le montant des travaux exécutés s'élève à L. 8.283.000.

6) Entreprise Valicenti Italo Lucio ayant son siège social à Cersosimo, inscrite à la C.C.I.A.A. au n. 39693 pour exécution de terrassements. Sous-adjudication autorisée par note n. 349 du 14.03.94 pour L. 75.000.000. Les travaux en sous-adjudication ont été commencés le 14.03.94 et sont actuellement en cours d'exécution.

A la date du 30.04.94 le montant des travaux exécutés s'élève à L. 9.353.000.

7) Entreprise Calà Luigi ayant son siège social à Cersosimo, inscrite à la C.C.I.A.A. au n. 39395 pour exécution de terrassements.

Sous-adjudication autorisée par note n. 350 du 14.03.94 pour L. 75.000.000. Les travaux en sous-adjudication ont été commencés le 14.03.94 et sont actuellement en cours d'exécution.

A la date du 30.04.94 le montant des travaux exécutés s'élève à L. 7.544.900

Les travaux ont été exécutés régulièrement avec de bons résultats et n'ont donné lieu à aucun différend.

Le présent certificat a été délivré à l'Entreprise CO.GE.I Costruzioni Generali Italiane S.p.A ayant son siège social à Rome au n. 7 de Via Villa Patrizi entrée au T.N.C. au n. 3637210.

On déclare sous responsabilité que tout ce qui est indiqué dans ce certificat est conforme aux documents originaux.

L'INGENIEUR CHEF

(Doct. Ing. Giuseppe Ianniello  
illisible)

- signature

Timbre rond de l'Inspection Régionale des Travaux Publics pour la Basilicate)

CONSORZIO DI BONIFICA DELLA PIANA DI CATANIA

CATANIA

OGGETTO : Albo Nazionale dei Costruttori - Certificazione attestante la esecuzione di lavori, rilasciata ai sensi dell'art. 14 della Legge 10 febbraio 1962 n. 57 e dell'art. 18 lett. b) della legge 8 agosto 1977, n. 584.

Il sottoscritto Ing. Pasquale Schillaci legittimato a rilasciare la documentazione in oggetto nella sua qualità di Ingegnere Capo del Consorzio di Bonifica della Piana di Catania

C E R T I F I C A

che i lavori di costruzione dell'Adduttore dalla Traversa di Ponte Barca all'Invaso di Lentini (P.S. 30/3104), finanziati con fondi della Agenzia per la promozione dello Sviluppo nel Mezzogiorno giusta delibera del comitato di gestione della stessa Agenzia n. 3924 del 21-06-1988, assunti con contratto di appalto n. 32926 di repertorio dell'11-07-1990 registrato a Catania in data 20-07-1990 al n. 5802, per i quali nel bando di gara sono state richieste le categorie 10a - 14 e 15 per importo illimitato e categorie 19c per importi di f. 9 miliardi di cui al D.M. 25 Febbraio 1982 n. 770 sono stati assunti dal Raggruppamento Temporaneo di Imprese CO.GE.I. S.p.A. (Capogruppo mandataria) con sede in Roma - Via di



Villa Patrizi n. 7, iscritta all'ANC con matricola n. 3637210  
 con una quota pari al 38,34% - ASTALDI S.p.A. (Mandante) con  
 sede in Roma - Via Po n. 11 iscritta all'ANC con matricola n.  
 4773811 con quota pari al 15% - LODIGIANI S.p.A. (Mandante)  
 con sede in Milano - Via Senato n. 8, iscritta all'ANC con  
 matricola n. 0047305 con quota pari al 15% - SOCIETA'  
 ITALIANA PER CONDOTTE D'ACQUA P.A. (Mandante) con sede in  
 Roma, Viale Liegi n. 26 iscritta all'ANC con matricola n.  
 429606 con quota pari al 16,66% - VIANINI LAVORI S.p.A.  
 (Mandante) con sede in Roma, Via Montello n. 10, iscritta  
 all'ANC con matricola n. 5161509 con quota pari al 15%.

L'importo dei lavori è il seguente :

- Condotta in c.a.p. e blocchi ancoraggio	f. 67.815.143.629
- Opere immissione, passerella e presa ind."	4.662.887.096
- Galleria naturale e artificiale	" 13.430.276.248
- Manufatto raccordo, torri piezometriche	
e manufatto scarico	" 4.692.142.431
- Attraversamenti in briglia	" 11.747.351.921
- Attraversamenti strade e ferrovie	" 6.487.594.968
- Attraversamenti fossi e strade campestri	" 3.108.348.500
- Compensi espropriazioni -- manutenzioni	
- protezione catodica e vari	" 8.722.609.920

TOTALE

f. 120.666.354.713

A detrarre il ribasso contrattuale

del 7,90%

" 9.532.642.022

Resta l'importo netto contrattuale            £.111.133.612.791  
(lire centoundicimiliardicentotrentatremilioniseicentododici-  
mila 791).

I lavori sopra descritti hanno avuto inizio '8 maggio 1990 e  
a tutt'oggi sono in avanzata fase di esecuzione.

Sono stati contabilizzati lavori al 31 ottobre 1993  
(11° S.A.L.) per un importo netto di            £. 82.147.310.261  
e per revisione prezzi                            "            425.682.283

Al 31 ottobre totale per lavori e rev.pr.    £. 82.572.992.544  
(lire ottantaduemiliardicinquecentosettantaduemilioninovecen-  
tonovantaduemila 544).

Ha diretto i lavori, per conto del Raggruppamento Temporaneo  
di Imprese aggiudicatario, il Dott. Ing. Giuseppe Pintagro  
Gallarizzo - Direttore Tecnico dello stesso Raggruppamento.

Inoltre sono intervenute le seguenti Imprese per subappalti e  
forniture (lavorazioni e forniture previste dal D.M.  
25-02-1982 n. 770 ed art. 12 del Regolamento di attuazione di  
cui alla Legge 15-11-1986 n. 768) :

- SOC. GEOLOGICA MERIDIONALE con sede in Catania Corso  
Sicilia 105 - giusta autorizzazione n. 2869 del 23-07-1990  
Indagini geognostiche - Importo £. 80.000.000.

- Ditta MASSEROTTI CAV. GIULIO con sede in Caltagirone Viale  
M. Milazzo n. 71 giusta autorizzazioone n. 3733  
dell'8-10-1990.

Lavori di bonifica da ordigni bellici - Importo £. 95.000.000

- Ditta Cocuccio Marcello con sede in Gravina di Catania Via Gramsci 53, giusta autorizzazione n. 3734 dell'8-10-1990.

Lavori di scavo - posa condotta e noleggi a caldo - Importo  
£.70.000.000.

- Ditta Marletta Carmelo con sede in Catania Corso dei Mille 13 giusta autorizzazione n. 3536 del 25-07-1991.

Lavori di carpenteria e getto calcestruzzo - Importo  
£.90.000.000.

Estensioni al subappalto giusta :

autorizzazione n. 1854 del 15-04-1992 Importo £. 150.000.000

autorizzazione n. 2306 del 7-06-1993 Importo £. 100.000.000

- Raggruppamento Temporaneo Imprese : FURNO'-COCUCCIO con sede in Regalbuto (EN) Contrada Spito - giusta autorizzazione n. 2228 del 15-05-1991.

Lavori di scavo, posa e rinterro condotta - Importo  
£.3.500.000.000.

- Ditta GEO DRILLING con sede in Carlentini Via Etnea Pal.IM.SUD giusta autorizzazione n. 3537 del 25-07-1991.

Lavori di trivellazione pali - Importo £. 95.000.000.

Estensione al subappalto giusta autorizzazione n. 1853 del 15-04-1992 - Importo £. 150.000.000.

- Ditta GEOSUD con sede in Roma Via G. de Ruggero, 71 giusta autorizzazione n. 3535 del 25-07-1991.

Lavori di trivellazione paratie e pali - Importo  
£.1.600.000.000.

Estensione al subappalto giusta

autorizzazione n. 5327 del 27-10-1993.

Lavori di infilaggi in galleria Importo f. 350.000.000

- Ditta LAFER CHIOGGIA con sede in Valli di Chioggia (VE)

S.S. Romea Km. 96 giusta autorizzazione n. 5789 del

21-11-1991.

Lavori di fornitura e posa acciaio per pali e paratie.

Importo f. 1.200.000.000.

- Ditta Conima S.r.l. con sede in Belpasso (CT) Contrada

Pantano Casazze S.P. 229 - Piano Tavola - giusta

autorizzazione n. 1852 del 15-04-1992. Noleggio mezzi

d'opera. Importo f. 150.000.000.

- Ditta PROFETTO VINCENZO con sede in Modica (RG) Corso

Umberto 36 giusta autorizzazione n. 1031 del 02-03-1992.

Fornitura di esplosivi e noleggi in galleria. Importo

f. 150.000.000.

- Ditta SVEPO S.r.l. con sede in Arcugnano (VC) Viale

dell'Industria giusta autorizzazione n. 1032 del 02-03-1992.

Lavori di attraversamento mediante infissione tubo con guaina

in acciaio (spingitubo) Importo f. 1.310.000.000.

- Ditta F.lli STRANO di STRANO ROSARIO con sede in Catania -

Zona Industriale V^ Strada n. 23 giusta autorizzazione n. 705

del 26-02-1993. Lavori di fornitura in opera di strutture in

ferro. Importo f. 150.000.000.


- Ditta Marletta Maurizio Domenico con sede in Catania Corso

dei Mille 13 giusta autorizzazione n. 1332 del 06-04-1993.

Lavori di carpenteria e getto calcestruzzo - Importo  
£.150.000.000.

I lavori sono stati eseguiti regolarmente e con buon esito e  
non hanno dato luogo a vertenze.


Catania, 20 GEN. 1994



Il presente certificato è stato rilasciato all'Impresa  
CO.GE.I. S.p.A. - Costruzioni Generali Italiane S.p.A. con  
sede in Roma - Via di Villa Patrizi n. 7 A.N.C. matr.  
n.3637210.

Si dichiara sotto responsabilità che quanto indicato nel  
presente certificato trova riscontro nella documentazione in  
atti.

Catania, 20 GEN. 1994





CONSORTIUM D'ASSAINISSEMENT DE CATANIA

CATANIA

Objet: Tableau National des Constructeurs:  
certificat concernant l'exécution des  
travaux délivré aux termes de l'article 14  
de la loi du 10/02/1962 n. 57 et de  
l'article 18 lettre b) de la loi du 8 août  
1977 n. 584.

Je soussigné Ing. Pasquale Schillaci, légitimé à  
délivrer la documentation en question en qualité  
de Ingénieur Chef du Bureau de Projet et Exécution  
des travaux du " Consortium d'Assainissement de la  
plaine de Catane "

CERTIFIE

- que les travaux de construction de l'Adducteur  
de la Route Transversale de Ponte Barca à le Caves  
de Lentini (P.S. 30/3104), financés par l'Agence  
pour la promotion du Développement dans l'Italie  
du Sud après délibération du Comité de gestion de  
la même agence n. 3924 du 21.06.1988, pris par  
contrat d'adjudication n. 32926 de répertoire du  
11.07.1990 enregistré à Catane le 20.07.1990 au n.  
5802, pour lesquels dans l'avis de concours ont  
été demandées les catégories 10a - 14 et 15 pour

un montant illimité et catégories 19c pour montants de L. 9 milliards dont au D.M. 25 février 1982 n. 770 ont été pris par le Regroupement Temporaire d'Entreprises CO.GE.I. S.p.A. (Conducteur Mandataire) ayant son siège social à Rome au n. 7, Via di Villa Patrizi inscrite au T.N.C. au n. 3637210 avec un quote-part de 38,34% - ASTALDI S.p.A. (Mandante) ayant son siège social à Rome au n.11, Via Po inscrite au T.N.C. au n. 4773811 avec quote-part de 15% - LODIGIANI S.p.A. (Mandante) ayant son siège social à Milan au n. 8, Via Senato inscrite au T.N.C. au n. 0047305 avec quote-part de 15% - SOCIETA ITALIANA PER CONDOTTE D'ACQUA S.p.A. (Mandante) ayant son siège social à Rome au n. 29, Viale Liegi inscrite au T.n.C. au n. 429606 avec quote-part de 16,66% - VIANINI LAVORI S.p.A. (Mandante) ayant son siège social à Rome au n. 10, Via Montello inscrite au T.N.C. n. 5161509 avec quote-part de 15%.

Le montant des travaux est le suivant:

- Conduite en c.a.p et blocs d'ancrage

L. 67.815.143.629

- Oeuvres amenée, passerelle et prise ind.

L. 4.662.887.096

- Galerie naturelle et artificielle	
	L. 13.430.276.248
-manufacturé de raccordement, tours piézométriques et manufacturé de décharge	L. 4.962.142.431
- Franchissements en déversoir	
	L. 11.747.351.921
- Carrefours routiers et de chemins de fer	
	L. 6.487.594.968
- Franchissements fossés et routes champêtres	
	L. 3.108.348.500
- Rémunérations expropriations - entretien	
- Protection cathodique et divers	
	L. <u>8.722.609.920</u>
TOTAL	120.666.354.713
A déduire la baisse contractuelle de 7,90%	L. <u>9.532.642.022</u>
Reste le montant net contrac.	L.111.133.612.791

(cent onze milliards, cent trente trois millions,  
six cent douze mille, sept cent quatre-vingt onze)  
Les travaux sus-décrits ont été commencés le 8 mai  
1990 et sont actuellement en cours d'exécution.  
A la date du 31 Octobre 1993 ont été comptabilisés  
travaux (11° S.A.L.) pour un montant net de:

L. 82.147.310.261

et pour révision prix L. 425.682.283

A la date du 31 octobre le montant total pour

travaux et révision prix L. 82.572.992.544

(quatre-vingt-deux milliards, cinq cent soixante douze millions, neuf cent quatre vingt douze mille, cinq cent quarante quatre)

Le Doct. Ing. Giuseppe Pintagro Gallarizzo -  
Directeur Technique du Regroupement a dirigé les  
travaux pour le compte du Regroupement Temporaire  
d'Entreprises adjudicataire.

Les Entreprises suivantes sont intervenues pour  
sous-adjudications et fournitures (travaux et  
fournitures prévues par le D.M. n. 770 du  
25.02.1982 et art. 12 de la Réglementation de  
réalisation dont à la loi n. 768 du 15.11.1986):

- SOC. GEOLOGICA MERIDIONALE ayant son siège  
social à Catania au n. 105, Corso Sicilia - après  
autorisation n. 2869 du 23.07.1990. Enquêtes  
géognostiques - Montant L. 80.000.000

- Entreprise MASSEROTTI CAV. GIULIO ayant son  
siège social à Caltagirone au n. 71, Viale  
Milazzo - après autorisation n. 3733 du  
08.10.1990.

Travaux de déminage - Montant L. 95.000.000

- Entreprise Cocuccio Marcello ayant son siège social à Gravina di Catania au n. 53, Via Gramsci - après autorisation n. 3734 du 08.10.1990. Travaux d'excavation - mouillage et locations directe - Montant L. 70.000.000.

- Entreprise Marletta Carmelo ayant son siège social à Catania au n. 13, Corso dei Mille - après autorisation n. 3536 du 25.07.1991.

Travaux de charpenterie et jet de béton - Montant L. 90.000.000.

Extension à la sous-adjudication après:

autorisation n. 1854 du 15.04.1992. Montant L. 150.000.000;

autorisation n. 2306 du 07.06.1993. Montant L. 100.000.000

- Regroupement Temporaire d'Entreprises: FURNO - COCUCCIO ayant son siège social à Regalbuto (EN) Contrada Spito - après autorisation n. 2228 du 15.05.1991.

Travaux d'excavation, mouillage et remblai conduite - Montant L. 3.500.000.000.

- Entreprise GEO DRILLING ayant son siège social à Carlentini, Via Etnea - Pal. IM.SUD après autorisation n. 3537 du 25.07.1991.

Travaux de pilotage - Montant L. 95.000.000.

Extension à la sous-adjudication après autorisation n. 1853 du 15.04.1992. Montant L. 150.000.000;

- Entreprise GEOSUD ayant son siège social à Rome au n.71, Via G. de Ruggero, après autorisation n. 3535 du 25.07.1991.

Travaux de forage parois et pilots - Montant L. 1.600.000.000.

Extension à la sous-adjudication après autorisation n. 5327 du 27.10.1993.

Travaux de montage en galerie L. 350.000.000

- Entreprise LAFER CHIOGGIA ayant son siège social à Valli di Chioggia (VE), au km 26 de la R.N. Romea - après autorisation n. 5789 du 21.11.1991.

Travaux de fourniture et mise en acier pour pilots et parois - Montant L. 1.200.000.000.

- Entreprise Conima S.r.l. ayant son siège social à Belpasso (CT) au n. 229, Contrada Pantano Casazze - Piano Tavola - après autorisation n. 1852 du 15.04.1992. Location moyens d'oeuvre. Montant L. 150.000.000.

- Entreprise PROFETTO VINCENZO ayant son siège social à Modica (RG) au n. 36, Corso Umberto - après autorisation n. 1031 du 02.03.1992.

Fourniture d'explosifs et locations en galerie.  
Montant L. 150.000.000.

- Entreprise SVEPO S.r.l. ayant son siège social à Arcugnano (VC), Viale dell'Industria - après autorisation n. 1032 du 02.03.1992.

Travaux de traversée par fixation tube avec gaine en acier (pousse-tubes) Montant L. 1.310.000.000.

- Entreprise F.lli STRANO di STRANO ROSARIO ayant son siège social à Catania - V° Zone Industrielle Route n. 23 - après autorisation n. 705 du 26.02.1993.

Travaux de fourniture en oeuvres de structures en fer. Montant L. 150.000.000.

- Entreprise Marletta Maurizio Domenico ayant son siège social à Catania au n.13, Corso dei Mille - après autorisation n. 1332 du 06.04.1993.

Travaux de charpenterie et coulée de béton - Montant L. 150.000.000.

Les travaux ont été exécutés régulièrement avec de bons résultats et n'ont donné lieu à aucun différend.

Catania, le 20 janvier 1994

L'INGENIEUR CHEF

(Doct. Ing. Pasquale Schillaci - signature illisible)

Timbre rond du Consortium d'Assainissement de la  
Plaine de Catane.

Le présent certificat a été délivré à l'Entreprise  
CO.GE.I Costruzioni Generali Italiane S.p.A ayant  
son siège social à Rome au n. 7 de Via Villa  
Patrizi entrée au T.N.C. au n. 3637210.

On déclare sous responsabilité que tout ce qui est  
indiqué dans ce certificat est conforme aux  
documents originaux.

Catania, le 20 janvier 1994

L'INGENIEUR CHEF

(Doct. Ing. Pasquale Schillaci)

(signature illisible)

Timbre rond du Consortium d'Assainissement de la  
Plaine de Catania.






CONSORZIO DI BONIFICA DI CALTAGIRONE

C A L T A G I R O N E

(Ente giuridicamente riconosciuto con R.D. 14/11/29)

OGGETTO: Albo Nazionale dei Costruttori- Certificazione attestante la esecuzione dei lavori, rilasciata ai sensi dell' art. 14 della Legge 10/02/1962 n° 57, e dell'art. 18, lett. b) della Legge. 08/08/1977 n° 584 e successive modifiche e/o integrazioni.

Il sottoscritto Dott. Ing. Alberto ALPARONE, nato a Caltagirone (CT) il 29/03/37 ed ivi domiciliato per la carica in Via Arcoleo, 172, legittimato a rilasciare la documentazione in oggetto, nella sua qualità di Ingegnere Capo dell'Ufficio Progettazioni ed Esecuzione Lavori del "Consorzio di Bonifica di Caltagirone" avente sede in Caltagirone (CT).



C E R T I F I C A

- che il Cipe con delibera in data 08/04/1987 ha statuito criteri per il trasferimento delle opere della cessata " Cassa per il Mezzogiorno ", delle successive gestioni commissariali e della subentrata " Agenzia " in attuazione dell' art. 5 della Legge n° 64/1986;

- che nella predetta delibera rientra l'opera di costruzione dell'Invaso " Pietrarossa " pubblicata

nella G.U. n° 83/bis del 06/04/85;

- che la Regione Siciliana ha indicato con nota n° 3640 del 07/11/87, come Ente esecutore dei Lavori di costruzione dell'opera, il Consorzio di Bonifica di Caltagirone;

- che con voto n° 12 del 05/02/69 il Con. Sup. dei L.P.P. - delegaz. Spec. per la Cassa per il Mezzogiorno ha approvato il progetto generale dello schema Dittaino-Ogliastro comprendente la realizzazione dello sbarramento "Pietrarossa" sul fiume Margherito;

- che i lavori di sbarramento per la costruzione dell'Invaso "Pietrarossa" sul fiume Margherito "assegnati con contratto di appalto n° 6504 del 12/12/1988, per i quali nel bando di gara è stata richiesta la Cat. 14 ai sensi del D.M. 25/02/1982 n° 770, sono stati assunti dal Raggruppamento di Imprese LODIGIANI S.p.A. (Mandataria) quota 50% e CO.GE.I. S.p.A. (Mandante) quota 50%, con sede in Milano Via Senato, 8.

L'importo netto dei lavori è il seguente:

- Importo contrattuale	£. 75.958.194.230
(lire Settantacinquemiliardinovecentocinquantotto- milionicientonovantaquattromiladuecentotrenta).	
- Importo perizia	£. 8.930.161.181



(lire Ottomiliardinovecentotrentamilionicentosesantunomilacentoottantuno).

I lavori sopra descritti hanno avuto inizio data 16/02/1989 e sono stati sospesi a far data 19/05/93.

Ha diretto i lavori per conto delle Imprese contraentrici sopra individuate il Sig. Dott. Ing. Tiberio BRACALETTI nella sua qualità di Direttore Tecnico.

Le Imprese raggruppate hanno eseguito i seguenti lavori:

1)- LODIGIANI S.p.A., con sede in Milano Via Senato, 8, matricola A.N.C. n°0047305, ha eseguito i lavori per un importo pro quota di £. 44.539.474.498.- (lire Quarantaquattromiliardicinquecentotrentanovemilioniquattrocentosettantaquattromilaquattrocentonovantotto).

2)- CO.GE.I. S.p.A., con sede in Roma Via di Villa Patrizi, 7, matricola A.N.C. n° 3637210, ha eseguito i lavori per un importo pro quota di £. 44.539.474.498.-

(lire Quarantaquattromiliardicinquecentotrentanovemilioniquattrocentosettantaquattromilaquattrocentonovantotto).

Alla data del 18/05/93; sono stati eseguiti lavori



per un importo di £. 79.676.211.328

(lire Settantanovemiliardiseicentoseptantaseimilioneiduecentoundicimilatrecentoventotto).

revisione prezzi £. 9.402.737.669

Novemiliardiquattrocentoduemilionisettecenotrentasettemilaseicentosessantanne).

in totale £. 89.078.948.997

Ottantanovemiliardisettantottomilioninovecentoquarantottomilanovecentonovantasette).

Nell' ambito dei predetti lavori sono intervenute le seguenti ditte per subappalti:

1)- Ditta MASSAROTTI Giulio, autorizzato con delibera del Consorzio di Bonifica di Caltagirone n° 202 del 02/10/89, per i lavori di bonifica da ordigni bellici.

2)- Ditte GEOSUD s.r.l. e S.G.F. Società Generale Fondazioni, autorizzato con delibera del Consorzio di Bonifica di Caltagirone n° 202 del 02/10/89, per i lavori di esecuzione di pali e paratie.

3)- Ditta TENSACCIAI S.p.A., autorizzato con delibera del Consorzio di Bonifica di Caltagirone n° 202 del 02/10/89, per i lavori di posa e tesatura cavi di acciaio.

4)- Ditta E.M.T. Catania s.r.l., autorizzato con





delibera del Consorzio di Bonifica di Caltagirone n° 202 del 02/10/89, per i lavori di estrazione e trasporto di materiali lapidei e sabbiosi.

5)- Ditta DI CATALDO Filippo, autorizzato con delibera del Consorzio di Bonifica di Caltagirone n° 202 del 02/10/89, per i lavori di estrazione e trasporto di materiali lapidei e sabbiosi.

Ditta FERRO SUD di Villari Giuseppa & C., autorizzato con delibera del Consorzio di Bonifica di Caltagirone n° 202 del 02/10/89, per lavorazione e montaggio ferro per c.a. .

7)- Ditta SNAMI s.n.c. dei F.lli Pulvirenti, autorizzato con delibera del Consorzio di Bonifica di Caltagirone n°202 del 02/10/89, per i lavori di varo e noleggio a caldo di autogrù.



8)- Ditta CONTI PASQUARELLO Paolo, autorizzato con delibera del Consorzio di Bonifica di Caltagirone n° 117 del 21/05/90, per i lavori di pavimentazioni stradali.

9)- Ditta FURNO' Rosario, autorizzato con delibera del Consorzio di Bonifica di Caltagirone n° 117 del 21/05/90, per i lavori di scarico e posa in opera di tubazioni.

10)-Ditta PROFETTO Vincenzo, autorizzato con delibera del Consorzio di Bonifica di Caltagirone n° 117



del 21/05/90, per i lavori di coltivazione della cava di Poggio Russotto.

11) - Ditta SANTORO Giovanni, autorizzato con delibera del Consorzio di Bonifica di Caltagirone n° 204 del 07/09/90, per i lavori edili di costruzione della casa di guardia e sistemazioni esterne.

12) - Ditta EDIL BETA COSTRUZIONI, autorizzato con delibera del Consorzio di Bonifica di Caltagirone n° 41 del 19/02/90, per i lavori di realizzazione di acquedotti e posa condotte idriche, comprese le forniture di tubazione in P.V.C. .

13) - Ditta DIMINUCCI Arcangelo, autorizzato con delibera del Consorzio di Bonifica di Caltagirone n° 37 del 13/04/93, per i lavori di esecuzione della recinzione delle sponde del lago e del relativo rimboschimento.

I lavori sono stati eseguiti regolarmente e con buon esito e non hanno dato luogo a vertenze.

Caltagirone, li 9 MAR. 1994 L'INGEGNERE CAPO

(Dott. Ing. Alberto ALPARON)

Prot. N. 458  
Posiz. N. 0-9



Il presente certificato è stato rilasciato all' Impresa CO.GE.I. S.p.A. con sede in Roma Via di Villa Patrizi, 7 , matricola A.N.C. n° 3637210.



Si dichiara sotto responsabilità che quanto



indicato nel presente certificato trova riscontro  
nella documentazione in atti.

Caltagirone, li : 9 MAR. 1994 L'INGEGNERE CAPO

(Dott. Ing. Alberto ALPARONE)



Dott. FRANCESCO COLISTRA  
NOTAIO  
00195 ROMA - Via F. Corridoni, 14  
Tel. 3724847

La presente copia fotostatica che si compone di  
n. . . . . fogli è conforme al documento esibitomi  
e previa collazione restituito.

Roma li 17 MAR. 1994

*Francesco Colistra*





**CONSORTIUM D'ASSAINISSEMENT DE CALTAGIRONE**

**CALTAGIRONE**

(Organisme juridiquement reconnu par R.D 14/11/29)

Objet: Tableau National des Constructeurs:  
certificat concernant l'exécution des  
travaux délivré aux termes de l'article 14  
de la loi du 10/02/1962 n. 57 et de  
l'article 18 lettre b) de la loi du 8 août  
1977 n. 584 et modifications et/ou  
intégrations suivantes.

Je soussigné Doct. Ing. Alberto ALPARONE né à  
Caltagirone (CT) le 29/03/1937 et résident ici au  
n. 172, Via Arcoleo, légitimé à délivrer la  
documentation en question en qualité d'Ingénieur  
Chef du Bureau de Projet et Exécution des travaux  
du " Consortium d'Assainissement de Caltagirone"  
ayant son siège social à Caltagirone (CT)

**CERTIFIE**

- que le Cipe par délibération datée le 08/04/1987  
a décrété les critères pour le transfert des  
oeuvre de la ex "Caisse pour l'Italie du Sud", des  
gestions commissariales successives et de la  
nouvelle "Agence" en application de l'art. 5 de la  
Loi n. 64/1986;

- que la sus-dite délibération inclue l'oeuvre de construction du caves "Pietrarossa" publiée dans le J.O n. 83 bis du 06/04/85;

- que la Région Sicilienne a indiqué par note n. 3640 du 07/11/87, en tant qu'Organisme exécuteur des travaux de construction de l'oeuvre, le Consortium d'assainissement de Caltagirone;

- que par voix n. 12 du 05/02/69, le Conseil Supérieur des Travaux Publics - délégation spéciale pour la Caisse de l'Italie du Sud a approuvé le projet général du schéma Dittaino-Ogliastro comprenant la réalisation du barrage "Pietrarossa" sur le fleuve Margherito;

- que les travaux de barrage pour la construction du caves "Pietrarossa sur le fleuve Margherito" assignés par contrat d'adjudication n. 6504 du 12/12/1988, pour lesquels dans l'avis de concours a été demandée la Cat. 14 aux termes du D.M. 25/02/1982 n. 770, ont été pris par le Regroupement d'Entreprises LODIGIANI S.p.A. (Mandataire) quote-part 50% et CO.GE.I. S.p.A. (Mandant) quote-part 50% ayant son siège à Milan au n.8, Via Senato;

Le montant net des travaux est le suivant:

- Montant contractuel L. 75.958.194.230

(soixante-quinze milliards, neuf cent cinquante-huit millions, cent quatre-vingt-quatorze mille, deux cent trente lire)

- Montant de l'expertise L. 8.930.161.181

(huit milliards, neuf cent trente million, cent soixante et un mille, cent quatre-vingt un lire).

Les travaux que nous venons de décrire ont commencé le 16/02/1989 et ont été suspendus à partir du 19/05/93.

Le Doct. Ing. Tiberio BRACALETTI en sa qualité de Directeur Technique a dirigé les travaux pour le compte des Entreprises adjudicataires susmentionnées.

Les Entreprises regroupées ont exécuté les travaux suivants:

1) LODIGIANI S.p.A, ayant son siège social à Milan au n. 8, Via Senato, matricule T.N.C. n. 0047305, a exécuté les travaux pour un montant pro quote-part de L. 44.539.474.498

(quarante quatre milliards, cinq cent trente neuf millions, quatre cent soixante quatorze mille, quatre cent quatre-vingt-dix huit lires)

2) CO.GE.I. S.p.A. ayant son siège social à Rome au n.7, Via di Villa Patrizi, matricule T.N.C. n.

3637210, a exécuté les travaux pour un montant pro  
quote-part de L. 44.539.474.498

(quarante quatre milliards, cinq cent trente neuf  
millions, quatre cent soixante quatorze mille,  
quatre cent quatre-vingt-dix huit lires)

A la date de 18/05/93 le montant des travaux  
exécutés s'élève à L. 79.676.211.328

(soixante-dix-neuf milliards, six cent soixante-  
seize millions, deux cent onze mille, trois cent  
vingt huit lires)

Révision prix L. 9.402.737.669

(neuf milliards, quatre cent deux millions, sept  
cent trente sept mille, six cent soixante neuf  
lires)

totalisent L. 89.078.948.997

(quatre-vingt neuf milliards, soixante-dix huit  
millions, neuf cent quarante huit mille, neuf cent  
quatre-vingt dix-neuf lires)

Dans le cadre des travaux sus-mentionnés sont  
intervenues les entreprises suivantes pour sous-  
adjudications:

- 1) Entreprise MASSAROTTI Giulio, autorisé par  
délibération du Consortium d'Assainissement de  
Caltagirone n. 202 du 02/10/89, pour les travaux  
de déminage.

- 2) Entreprises GEOSUD S.r.l. et S.G.F. Società Generale Fondazioni, autorisés par délibération du Consortium d'Assainissement de Caltagirone n. 202 du 02/10/89, pour travaux d'exécution de pilots et parois.
- 3) Entreprise TENSACCIAI S.p.A., autorisé par délibération du Consortium d'Assainissement de Caltagirone n. 202 du 02/10/89, pour travaux de pose et tendage de câbles en acier.
- 4) Entreprise E.M.T. Catania S.r.l., autorisé par délibération du Consortium d'Assainissement de Caltagirone n. 202 du 02/10/89, pour travaux d'extraction et transport de matériaux pierreux et sableux.
- 5) Entreprise DI CATALDO Filippo, autorisé par délibération du Consortium d'Assainissement de Caltagirone n. 202 du 02/10/89, pour travaux d'extraction et transport de matériaux pierreux et sableux.
- 6) Entreprise FERRO SUD di Villari Giuseppa & C., autorisé par délibération du Consortium d'Assainissement de Caltagirone n. 202 du 02/10/89, pour travaux et montage de fer pour béton.

- 7) Entreprise SNAMI s.n.c. dei Fratelli Pulvirenti, autorisé par délibération du Consortium d'Assainissement de Caltagirone n. 202 du 02/10/89, pour travaux de lancement et location de autogrues.
- 8) Entreprise CONTI PASQUARELLO Paolo, autorisé par délibération du Consortium d'Assainissement de Caltagirone n. 117 du 21/05/90, pour travaux de pavage routier.
- 9) Entreprise FURNO' Rosario, autorisé par délibération du Consortium d'Assainissement de Caltagirone n. 117 du 21/05/90, pour travaux de décharge et mise en oeuvre de conduites.
- 10) Entreprise PROFETTO Vincenzo , autorisé par délibération du Consortium d'Assainissement de Caltagirone n. 117 du 21/05/90, pour travaux de culture de la carrière de Poggio Russotto.
- 11) Entreprise SANTORO Giovanni , autorisé par délibération du Consortium d'Assainissement de Caltagirone n. 204 du 07/09/90, pour travaux de construction de la maison de Garde et aménagements extérieurs.
- 12) Entreprise EDIL BETA COSTRUZIONI, autorisé par délibération du Consortium d'Assainissement de Caltagirone n. 41 du 19/02/90, pour travaux de

réalisations de réseaux hydriques et mise en oeuvre de conduites d'eau, y compris les fournitures de conduites en P.V.C.

13) Entreprise DIMINUOCO Arcangelo , autorisé par délibération du Consortium d'Assainissement de Caltagirone n. 37 du 13/04/93, pour travaux d'exécution de la clôture des bords du lac et du relatif reboisement.

Les travaux ont été exécutés régulièrement avec de bons résultats et n'ont donné lieu à aucun différend.

Caltagirone, le 9 mars 1994

L'INGENIEUR CHEF

(Doct. Ing. Alberto Alparone - signature illisible)

Timbre rond du Consortium d'Assainissement de Caltagirone.

Prot. n. 1759

Posit. n. 9-9

Le présent certificat a été délivré à l'Entreprise CO.GE.I Costruzioni Generali Italiane S.p.A ayant son siège social à Rome au n. 7 de Via Villa Patrizi entrée au T.N.C. au n. 3637210.

On certifie sous responsabilité que tout ce qui est indiqué dans ce certificat est conforme aux

documents originaux.

Caltagirone, le 9 mars 1994

L'INGENIEUR CHEF

(Doct. Ing. Alberto Alparone - signature  
illisible)

Timbre rond du Consortium d'Assainissement de  
Caltagirone.

Timbre du Dott. Francesco Colistra - Notaire

C'est une copie conforme à l'original qui m'a été  
présentée et rendue en feuilles.

Rome le 17 mars 1994

Timbre du Notaire Colistra Francesco Via F.  
Corridoni 14, Rome - Signature illisible



ENTE DI SVILUPPO AGRICOLO

SERVIZIO BONIFICA

SEZIONE GESTIONE E CONTROLLO FORNITURE TUBI


OGGETTO : Albo Nazionale dei Costruttori.

Certificazione attestante la esecuzione dei lavori, rilasciata ai sensi dell'art. 14 della Legge 10 febbraio 1962 n. 57 e dell'art.18 lett. b) della Legge 8 Agosto 1977 n. 584.

Il sottoscritto Dr. Ing. Giuseppe Passarello nato a Palermo il 15-08-1932 ed ivi residente in Via Franz Lstzt n.4 legittimato a rilasciare la documentazione in oggetto nella sua qualità di Ingegnere Capo

C E R T I F I C A

che i lavori per la realizzazione del I° Lotto di opere relativo alla realizzazione dell'adduttore principale alle zone irrigue dipendenti dal serbatoio "Castello", dalla diga Castello alla diramazione Tavernola, assunti con la convenzione in data 24-5-1991 al n. 763 di rep. e registrata a Palermo il 13-06-1991 al n. 8695/A, per i quali nel bando di gara per l'affidamento in concessione delle opere relative è stata richiesta la categoria 10/a e 10/c, di cui al D.M. 25 febbraio 1982 n. 770, sono stati assunti dal R.T.I. : CO.GE.I. S.p.A. Capogruppo Mandataria con sede in Roma, Via di Villa Patrizi n. 7, iscritta all'A.N.C. con matricola n. 363210 in data 22-02-1974; COMIL S.p.A. mandante con sede in Catania, Viale Andrea Doria n. 55 iscritta all'A.N.C., con



*[Handwritten signature]*  
*[Handwritten initials]*

matricola n. 0860209 in data 1-4-1965, Impresa Ing. Matteo Santagati & Co. S.p.A. mandante con sede in Catania Via Galermo n.156 iscritta all'A.N.C. al n. 4260111 in data 23-02-1977.


L'importo del corrispettivo della concessione al netto è il seguente f.46.472.000.000

L'importo della concessione al netto distribuito per le varie categorie di lavori :

1) Gallerie

A) Prezzo base delle opere

1a) Galleria Calamonaci	f.	1.710.880.000
1b) Galleria Maida	"	1.191.802.744
2) Vasche	"	3.506.800.000
3) Scavi e rinterri	"	5.506.800.000
3a) Scavi e rinterri condotta 300 mm.	"	102.870.000
3b) Scavi e rinterri condotte 300 mm.	"	2.973.620.375
4) Trasporto, accatastamento e posa condotte in trincea		
4a) Condotta in P.V.C. 125 mm.	"	74.930.000
4b) Condotta in PRFV 400 mm.	"	126.129.600
4c) " " CAP 700 mm.	"	579.855.000
4d) " " CAP e Acc. 800 mm.	"	317.275.000
4e) " in acciaio 1300 mm.	"	482.092.000
4f) " in acciaio 1400 mm.	"	435.638.000
4g) " " " 1600 mm.	f.	3.940.090.800



4i) Trasporto, accatastamento e posa condotte in galleria		
4/1a) Condotta in CAP 700 mm.	"	60.680.000
4/1b) " in acciaio 1600 mm.	"	349.890.000
5) Opere in ferro per condotte		
5a) Pezzi speciali in acciaio	"	992.642.360
5b) Ferro lavorato per centine, selle, passerelle e cancelli	"	768.500.000
6) Opere d'arte condotte		
6a) Pozzetti per installazione apparecchiature idrauliche	£.	1.315.710.000
6b) Opere d'arte per attrav. stradali e fossi	"	366.600.000
6c) Attraversamenti condotta 1600 mm. e sist. idraulica	"	843.316.410
6d) Carpenteria metallica	"	25.000.000
7) Manufatti per la regolarizzazione e stabilizzazione del carico		
7a) Torre stabilizzatrice del carico	"	1.756.472.000
7b) Manufatti regolazione vasche	"	638.000.000
8) Strade di servizio	"	4.176.000.000
9) Fornitura e trasporto apparecchiature idrauliche	"	1.603.017.711
10) Sistema di centr. telecontrollo e telecomando	£.	1.136.800.000



*[Handwritten signature]*

11) Opere di protezione in calcestruzzo		
o blocchi di ancoraggio	"	1.658.388.000
12) Protezione catodica	"	<u>464.000.000</u>
	SOMMANO	£. 40.597.000.000
B) Oneri del Concessionario	£.	4.060.000.000
C) Accantonamento per indennità di esproprio, servitù d'acquedotto e occupazione temporanea	£.	165.000.000
D) Accantonamento per la gestione degli impianti nei primi tre anni	"	<u>1.650.000.000</u>
SOMMA IL CORRISPETTIVO DELLA CONCESSIONE	£.	46.472.000.000



I lavori sopra descritti hanno avuto inizio in data 7-9-1992 e sono in corso di esecuzione alla data del 31-03-1994 ed eseguiti per l'importo al netto di £. 26.989.659.224 e così suddivisi per categorie di lavori :

1) GALLERIE		
1a) Galleria Calamonaci	£.	1.710.880.000
1b) Galleria Maida	"	8.191.802.744
2) Vasche	"	3.684.435.655
3) Scavi e rinterrì		
3b) Scavi e rinterrì per condotte 300 mm."		1.418.776.481
4) Trasporto, accatastamento e posa condotte in trincea		
4a) Condotta in PVC 125 mm.	"	18.880.000
4b) " " PRFV 400 mm.	"	97.743.745

4c)	"	"	CAP 700 mm.	£.	259.892.068
4d)	"	"	CAP e acciaio 800 mm.	"	240.500.000
4e)	"	"	in Acciaio 1300 mm.	"	391.280.000
4f)	"	"	" 1400 mm.	"	406.000.000
4g)	"	"	" 1600 mm.	"	1.716.394.000
4/1) Trasporto, accatastamento e posa					
condotte in galleria					
4/1a)			Condotta in CAP 700/mm.	"	49.200.000
4/1b)			Condotta in acciaio 1600 mm.	"	81.750.000
5) Opere in ferro per condotte					
5a)			Pezzi speciali in acciaio	"	389.598.929
5b)			Ferro lavorato	"	174.000.000
6) Opere d'arte condotte					
6a) Pozzetti per installazione apparecchiature idrauliche					
				"	172.845.821
6c) Attraversamenti condotta 1600 mm. e					
			sist. idraulica	"	225.888.324
7) Manufatti per la regolarizzazione e stabilizzazione del carico					
7a)			Torre stabilizzatrice del carico	"	305.006.926
7b)			Manufatti regolazione vasche	"	217.978.398
8)			Strade di servizio	"	3.702.129.927
9) Fornitura e trasporto apparecchiature idrauliche					
				"	641.207.084
10) Sistema di centr. telecontrollo e					



*[Handwritten signature]*

*[Handwritten initials]*

telecomando	f.	213.766.814
11) Opere di protezione in calcestruzzo		
e blocchi di ancoraggio	"	<u>73.184.942</u>
Sommano	f.	24.383.141.859
- Oneri del concessionario	"	<u>2.606.517.375</u>
Sommano i lavori	f.	26.989.659.234

(ventiseimiliardinovecentoottantanovemilioneiseicentocinquanta-  
tanovemiladuecentotrentaquattro)

Ha diretto i lavori per conto dell'Impresa Concessionaria sopra individuata l'Ing. Francesco Dolcimascolo nato a Lercara Friddi il 2-4-1928 e residente a Enna in Via Michelangelo 64, fino alla data del 23-12-1993 ed in seguito l'Ing. Concetto Montaudo nato a Catania il 3-10-1956 e residente a Catania in Via Bronte n.76, con nomina formalizzata in data 03-01-1994 coadiuvati dal Geom. Rosario Lo Fermo quale Direttore di Cantiere, nato a Cuspini (Cagliari) il 12-11-1944 e residente a Piazza Armerina in Via Nino Bixio n. 68.

I lavori sono eseguiti dalle seguenti Imprese titolari :

- 1) Impresa CO.GE.I. S.p.A. - Costruzioni Generali Italiane con sede in Roma in Via di Villa Patrizi n. 7, iscritta all'A.N.C. matr. 3637210 in data 22-02-1974, per un importo di f. 18.865.771.805 pari al 69,9% dell'importo contabilizzato al 31-03-1994;
- 2) Impresa COMIL S.p.A. per un importo di f. 8.096.897.770 pari al 30% dell'importo contabilizzato al 31-03-1994;

3) Imprese Ing. Matteo Santagati & Co. S.p.A. per un importo di f. 26.989.659 pari allo 0,01% dell'importo contabilizzato al 31-03-1994.

#### DESCRIZIONE DEI LAVORI

I lavori consistono nella realizzazione della condotta adduttrice e delle opere connesse, che rendono funzionale lo schema idraulico progettuale che prevede l'esecuzione delle seguenti opere :

Torre stabilizzatrice con quota piezometrica di 268 m.s.l.m., in derivazione della condotta metallica posta sull'arco rovescio dello scarico di fondo della diga. Esso consente di abbattere la variazione di carico conseguente dalla valutazione di livello nel serbatoio Castello, oscillante tra le quote 287,50 e 268,00 di massimo svaso normale.

La struttura è realizzata mediante elementi metallici utilizzando come colonne portanti la condotta afferente, la condotta adduttrice principale derivata e la condotta dello scarico di troppo pieno, tutte del DN 1500, opportunamente tralicciate; sono previste altresì tutte le apparecchiature di controllo e di blocco mediante monitoraggio e telecomando.

- una condotta principale formata da tubazioni in acciaio di diametro variabile da DN 1600 a 1300 mm. posata in sponda sinistra, dello sviluppo complessivo di m. 10.093, fino al punto terminale del lotto. La condotta corre interrata con un tratto in galleria dello sviluppo di m. 644 tra le

progressive 3043 e 3687.

- una condotta di alimentazione delle vasche Calamonaci e Gebbia, derivata al nodo B dello schema, con tubazioni in c.a.p. e acciaio DN 1000 mm.

Un'attraversamento del fiume Magazzolo, previsto in struttura subalvea, in acciaio DN 1000;

- una condotta di alimentazione della vasca Gebbia in PRFV DN

una condotta di alimentazione della vasca Tavernola in PRFV del DN 400;

- tre vasche Calamonaci, Gebbia e Tavernola, della capacità rispettivamente di mc. 17000, 4000 e 5000, realizzabili per lo più in scavo e muratura di c.a. con fondazioni indirette su pali; le portate in arrivo saranno controllate individualmente da una valvola di regolazione, per non alterare il programma volumetrico, asservita ad un misuratore di portata e servita da otturatore a galleggiante per la stabilizzazione del livello massimo in vasca.

Tutte le apparecchiature di manovra e di controllo sono motorizzate e telecomandate. E' prevista una linea elettrica di alimentazione.

Sono previsti inoltre alcuni piccoli impianti di distribuzione irrigua in fondovalle nel tratto tra la diga e la confluenza del torrente Gebbia.

Inoltre sono intervenute le seguenti Imprese per subappalti



previsti dal D.M. 25-02-1982 n. 770 art. 12 del regolamento di attuazione di cui alla Legge 15-11-1986 n. 768.

A) Impresa GEO DRILLING di Fangano Emiddio Francesco con sede in Lentini (SR) C.da Burrione S.P. 16, iscritta all'A.N.C. con matricola n. 9341269, per lavori di palificazione di grande diametro e consolidamento.

Subappalto autorizzato dall'ESA (Ente di Sviluppo Agricolo) Palermo con deliberazione n. 446 del 18-06-1993, resa esecutiva il 17-07-1993 e comunicata all'Impresa con nota n.21751/1008/195bis del 6-8-1993 per l'importo di £.100.000.000.

B) Ditta Profetto Vincenzo con sede in Modica - Corso Umberto 1° n. 36, iscritta alla C.C.I.A.A. di Ragusa al n. 451001 del 31-07-1973, per lavori di abbattaggio in galleria con uso di esplosivo e noleggio a caldo di mezzi d'opera.

Subappalto autorizzato dall'ESA (Ente di Sviluppo Agricolo) Palermo con deliberazione n. 1190/C.E. dell'11-12-1992, resa esecutiva il 15-02-1993 e comunicata all'Impresa con nota n.7412-363-195 del 15-03-1993 per l'importo di £.100.000.000.

I lavori sono stati eseguiti regolarmente e con buon esito e non hanno dato luogo a vertenza.

Palermo li, **27 MAG. 1994**

IL DIRETTORE DEI LAVORI

L'INGEGNERE CAPO

(Dott.Ing.Concetto Montaudò)

(Dott.Ing. Giuseppe Passarello)

*Concetto Montaudò*

*Giuseppe Passarello*

Il presente certificato è stato rilasciato all'Impresa  
CO.GE.I. S.p.A. iscritta all'A.N.C. con matricola n.3637210,  
con sede in Roma Via di Villa Patrizi n. 7.

Si dichiara sotto responsabilità, che quanto indicato nel  
presente certificato trova riscontro nella documentazione in  
atti.

Palermo, li 27 MAG. 1994

IL DIRETTORE DEI LAVORI

L'INGEGNERE CAPO

(Dott. Ing. Concetto Montaudò) (Dott. Ing. Giuseppe Passarello)

*Concetto Montaudò*

*Giuseppe Passarello*

Dott. FRANCESCO COLISTRA  
NOTAIO  
00195 ROMA - Via F. Corridoni, 14  
Tel. 3724847

La presente copia fotostatica che si compone di  
n. tre fogli. è conforme al documento esibitomi  
e previa collazione restituito.

Roma li 20 GIU. 1994

*Francesco Colistra*



(trois timbres fiscaux de 5000 lire)

**ORGANISME DE DEVELOPPEMENT AGRICOLE**

**SERVICE ASSAINISSEMENT**

**DEPARTEMENT GESTION ET CONTROLE FOURNITURE DE  
TUBES**

**Objet: Tableau National des Constructeurs:**  
certificat concernant l'exécution des  
travaux délivré aux termes de l'article 14  
de la loi du 10/02/1962 n. 57 et de  
l'article 18 lettre b) de la loi du 8 août  
1977 n. 584.

Je soussigné Doct. Ing. Giuseppe Passarello  
né à Palerme le 15/08/1932 et résident ici  
au n. 4, Via Franz Liszt, légitimé à  
délivrer la documentation en question en  
qualité de Ingénieur Chef

**CERTIFIE**

- que les travaux pour la réalisation du I° Lot  
d'ouvrages relatifs à la réalisation de  
l'adducteur principal aux zones irrigables  
desservies par le réservoir "Castello", du barrage  
Castello à la ramification Tavernola, pris par  
convention n. 763 de répertoire du 24.05.1991 et

enregistrée à Palerme le 13.06.1991 au n. 8695/A pour lesquels dans l'avis de concours pour la concession des ouvrages relatifs a été demandée la catégorie 10/a et 10/c dont au D.M. 25 février 1982 n. 770, ont été pris par le R.T.I (Regroupement Temporaire d'Entreprises): CO.GE.I. S.p.A. Conducteur Mandataire ayant son siège social à Rome au n.7, Via di Villa Patrizi, inscrite au T.N.C. au n. 3637210 le 22.02.1974; COMIL S.p.A. mandant ayant son siège social à Catania au n. 55, Via Andrea Doria inscrite au T.N.C. avec matr. n. 0860209 en date du 01.04.1965, Entreprise Matteo Santagati & Co. S.p.A. mandant, ayant son siège social à Catania au n. 156, Via Galermo inscrite au T.N.C. matr. n. 4260111 en date du 23.02.1977.

Le montant du correspéctif de la concession au net s'élève à L. 46.472.000.000.

Le montant de la concession au net distribué pour les diverses catégories de travaux:

1) Galeries

A) Prix base des ouvrages

1a) Galerie Calamonaci	L. 1.710.880.000
1b) Galerie Maida	" 1.191.802.744
2) Cuves	" 3.506.800.000

3)	Excavations et remblais	"	5.506.800.000
3a)	Excavations et remblais pour conduite 300 mm		102.870.000
3b)	Excavations et remblais pour conduites 300 mm		2.973.620.375
4)	Transport, empilement et mise en tranchée de conduites		
4a)	Conduite en PVC 125 mm		74.930.000
4b)	Conduite en PRVF 400 mm		126.129.600
4c)	" en CAP 700 mm		579.855.000
4d)	" en CAP et acier 800 mm		317.275.000
4e)	" en acier 1300 mm		482.092.000
4f)	" " " 1400 mm		435.538.000
4g)	" " " 1600 mm		3.940.090.800
	(trois timbres fiscaux de 5000 liras)		
4i)	Transport, empilement et mise de conduites en galerie		
4/1a)	Conduite en CAP 700 mm		60.680.000
4/1b)	Conduite en acier 1600 mm		349.890.000
5)	Ouvrages en fer pour conduites		
5a)	Pièces spéciales en acier		992.642.360
5b)	Fer travaillé pour cintres, selles passerelles et grilles		768.500.000

6)	Oeuvres d'art conduites	
6a)	Puisards pour installation appareils hydrauliques	1.315.710.000
6b)	Oeuvres d'art pour traversée routières et fossés	366.600.000
6c)	Franchissement conduite 1600 mm et aménagement hydraulique	843.316.410
6d)	Charpenterie métallique	25.000.000
7)	Produits manufacturés pour la régularisation et stabilisation de la charge	
7a)	Tour de stabilisation de la charge	1.756.472.000
7b)	Produits manufacturés pour l'entretien des cuves	638.000.000
8)	Routes de service	4.176.000.000
9)	Fournitures et transport d'appareils hydrauliques	1.603.017.711
10)	Système de télécontrôle et télécommande	1.136.800.000
11)	Ouvrages de protection en béton ou blocs d'ancrage	1.658.388.000
12)	Protection cathodique	<u>464.000.000</u>
	TOTALISENT	40.597.000.000
B)	Charges du Concessionnaire	4.060.000.000

C) Réserve pour indemnité d'expropriation, servitude d'aqueduc et occupation temporaire	165.000.000
D) Réserve pour la gestion des équipements au cours des 3 premières années	<u>1.650.000.000</u>

TOTAL DE L'EQUIVALENT

DE LA CONCESSION 46.472.000.000

Les travaux sus-décrits ont été commencés le 07.09.1992 et à la date du 31.03.1994 sont en cours d'exécution et exécutés pour un montant net de L. 26.989.659.224 et divisés pour catégories de travaux dans la façon suivante:

1) GALERIES

1a) Galerie Calamonaci L. 1.710.880.000

1b) Galerie Maida 8.191.902.744

2) Cuves 3.684.435.655

3) Excavations et remblais

3b) Excavations et remblais pour conduites 300 mm 1.418.776.481

4) Transport, empilement et mise en tranchée de conduites

4a) Conduite en PVC 125 mm 18.880.000

(Trois timbres fiscaux de 5000 lire)

4b)	Conduite en PRVF 400 mm	97.743.745
4c)	" en CAP 700 mm	259.892.068
4d)	" en CAP et acier 800 mm	240.500.000
4e)	" en acier 1300 mm	391.280.000
4f)	" " " 1400 mm	406.000.000
4g)	" " " 1600 mm	1.716.394.000
4i)	Transport, empilement et mise de conduites en galerie	
4/1a)	Conduite en CAP 700 mm	49.200.000
4/1b)	Conduite en acier 1600 mm	81.750.000
5)	Ouvrages en fer pour conduites	
5a)	Pièces spéciales en acier	389.598.929
5b)	Fer travaillé	174.000.000
6)	Oeuvres d'art conduites	
6a)	Puisards pour installation appareils hydrauliques	172.845.821
6c)	Traversées conduites 1600 mm et aménagement des eaux	225.888.324
7)	Produits manufacturés pour la régularisation et stabilisation de la charge	
7a)	Tour de stabilisation de la charge	305.006.926
7b)	Produits manufacturés pour	



l'entretien des cuves	217.978.398
8) Routes de service	3.702.129.927
9) Fournitures et transport d'appareils hydrauliques	641.129.927
10) Système de télécontrôle et télécommande	213.766.814
11) Ouvrages de protection en béton ou blocs d'ancrage	<u>73.184.942</u>
TOTALISENT	24.383.141.859
- Charges du Concessionnaire	<u>2.606.517.375</u>
Total des travaux	26.898.659.234

(vingt-six milliards huit cent quatre-vingt-dix-huit millions, six cent cinquante-neuf mille, deux cent trente-quatre)

L'Ingénieur Francesco Dolcimascolo né à Lercara Friddi le 02.04.1928 et résident à Enna au n. 64, Via Michelangelo, a dirigé les travaux pour le compte de l'Entreprise Concessionnaire sus-indiquée jusqu'à la date du 23.12.1993, ensuite dirigée par l'Ingénieur Concetto Montaudò né à Catania le 03.10.1956 et résident à Catania au n. 76, Via Bronte, par nomination formalisée le 03.01.1994 et assistés par Geom. Rosario Lo Fermo en qualité de Directeur de Chantier, né à Cuspini (Cagliari) le

12.11.1944 et résident à Piazza Armerina au n.68,  
Via Nino Bixio.

Les travaux sont exécutés par les Entreprises  
titulaires suivantes:

1) Entreprise CO.GE.I. S.p.A - Costruzioni  
Generali Italiane ayant son siège social à Rome au  
n. 7, Via di Villa Patrizi, inscrite au T.N.C.  
matr. n. 3637210 le 22.02.1974 pour un montant de  
L. 18.865.771.805 égal à 69,9% du montant  
comptabilisé jusqu'au 31.03.1994;

2) Entreprise COMIL S.p.A. pour un montant de L.  
8.096.897.770 égal à 30% du montant comptabilisé  
jusqu'au 31.03.1994;

3) Entreprises Ing. Matteo Santagati & Co. S.p.A.  
pour un montant de L. 26.989.659 égal à 0,01% du  
montant comptabilisé au 31.03.1994.

#### DESCRIPTION DES TRAVAUX

Les travaux consistent dans la réalisation de la  
conduite d'adduction et des ouvrages liés qui  
permettent la fonctionnalité du schéma hydraulique  
du projet qui prévoit l'exécution des ouvrages  
suivants:

Tour de stabilisation avec niveau piézométrique de  
268 m.s.l.m en dérivation de la conduite  
métallique située sur l'arc revers du décharge de

fond su barrage. Il permet d'abattre la variation de charge dérivant de l'évaluation de niveau à l'intérieur du réservoir Castello, qui oscille entre les niveaux de 287,50 et 268,00 d'embrasure normale maximum.

La structure est réalisée à l'aide d'éléments métalliques utilisant comme colonnes portantes la conduite afférente, la conduite d'adduction principale dérivée et la conduite de la charge de trop plein, toutes du DN 1500, opportunément mises en pylônes; sont prévues toutes les instruments de contrôle et de bloc par monitoring et télécommande.

- une conduite principale constituée de tubes en acier d'un diamètre variable de DN 1600 à 1300 mm. mise au bord gauche, de l'extension totale de m. 10.093 jusqu'au point terminal du lot. La conduite traverse enterrée une tranche de galerie de l'extension de m. 644 entre les progressives 3043 et 3687.

- une conduite d'alimentation des cuves Calamonaci et Gebbia, dérivée au noeud B du schéma, avec tubes en c.a.p. et acier DN 1000 mm.

Un franchissement du fleuve Magazzolo, prévu en structure située au dessous du lit, en acier DN

1000;

- une conduite d'alimentation de la cuve Gebbia en PRFV du DN 400;

- une conduite d'alimentation de la cuve Tavernola en PRFV du DN 400;

- trois cuves Calamonaci, Gebbia et Tavernola, d'une capacité respectivement de 17000 mc, 4000 et 5000 mc, réalisables en majorité en excavation et maçonnerie de béton avec fondations indirectes sur pieux. Les portées en arrivée seront contrôlées hydrauliquement par une valve de régulation, pour ne pas altérer le programme volumétrique, asservie à un mesureur de portée et dotée d'un obturateur à flotteur pour la stabilisation du niveau maximum en cuve.

Tous les instruments de manoeuvre et de contrôle sont monitorisés et télécommandés. Une ligne électrique d'alimentation est prévue.

Quelques petites installations de distribution d'eau au fond de la vallée dans le tronçon entre le barrage et la confluence du torrent Gebbia sont aussi prévues.

En outre les Entreprises suivantes ont participé pour sous-adjudications prévues par le D.M. n. 770 du 25.02.1982 art. 12 de la réglementation de

réalisation dont à la loi n. 768 du 15.11.1986.

A) Entreprise GEO DRILLING de Fangano Emiddio Francesco ayant son siège social à Lentini (SR) au n. 16, C.da Burrione S.P., inscrite au T.N.C. matr. 9341269 pour travaux de pilotage de grand diamètre et consolidation.

Sous-adjudication autorisée par l'ESA (Organisme pour le Développement Agricole) Palerme par délibération n. 446 du 18.06.1993, rendue exécutive le 17.07.1993 et communiquée à l'entreprise par note n. 21751 1008/195 bis du 6.8.1993 pour le montant de L. 100.000.000.

B) Entreprise Profetto Vincenzo ayant son siège social à Modica au n. 36, Corso Umberto 1°, inscrite à la C.C.I.A.A. de Ragusa matr. 451001 le 31.07.1973 pour travaux de plate-forme en galerie utilisant explosifs et location de moyennes de ouvrages.

Sous-adjudication autorisée par l'ESA (Organisme pour le Développement Agricole) Palerme par délibération n. 1190/C.E du 11.12.1992, rendue exécutive le 15.02.1993 et communiquée à l'entreprise par note n. 7412 du 15.03.1993 pour le montant de L. 100.000.000.

Les travaux ont été exécutés régulièrement avec de

bons résultats et n'ont donné lieu à aucun différend.

Palerme, le 27 mai 1994

LE DIRECTEUR DES TRAVAUX

(Dott. Ing. Concetto Montaudò)

signature illisible

L'INGENIEUR CHEF

(Dott. Ing. Giuseppe Passarello)

Signature illisible

Le présent certificat a été délivré à l'Entreprise CO.GE.I Costruzioni Generali Italiane S.p.A ayant son siège social à Rome au n. 7 de Via Villa Patrizi entrée au T.N.C. au n. 3637210.

On déclare sous responsabilité que tout ce qui est indiqué dans ce certificat est conforme aux documents originaux.

Palerme, le 27 mai 1994

LE DIRECTEUR DES TRAVAUX

(Dott. Ing. Concetto Montaudò)

signature illisible

L'INGENIEUR CHEF

(Dott. Ing. Giuseppe Passarello)

Signature illisible

Timbre du Dott. Francesco Colistra - Notaire de Rome - 00195 Rome - Via F. Corridoni 14.

C'est une copie conforme à l'original qui m'a été  
présentée et rendue en 3 feuilles.

Rome le 20 juin 1994

Timbre du Notaire Colistra Francesco di Antonio -

Signature illisible


C'est une copie conforme à l'original qui m'a été  
présentée et rendue en 3 feuilles.

Rome le 20 juin 1994

Timbre du Notaire Colistra Francesco di Antonio -

Signature illisible





## CONSORZIO DI BONIFICA DEL LAGO DI LENTINI

Albo Nazionale dei Costruttori: Certificazione attestante l'esecuzione di lavori, rilasciata ai sensi dell'art.14 della legge 10 febbraio 1962 n.57 e dell'art.18 lett.b) della legge 8 agosto 1977 n.584.


Il sottoscritto Dott. Ing. Antonio LOMBARDO, nato a Catania il 16-8-1944, legittimato a rilasciare la documentazione in oggetto nella sua qualità di Capo dell'Ufficio Tecnico del Consorzio di Bonifica del Lago di Lentini,

### C E R T I F I C A

- Che i lavori di costruzione dell'invaso di Lentini -1 lotto- Opere di invaso e allacciamento Trigona e Cave - (P.S. 30/3032/A) finanziati con legge n.132 del 30-4-1983 sono stati assunti con contratto di appalto n.6465 di repertorio e n.8 di raccolta del 13 ottobre 1983, registrato a Roma il 28 ottobre 1983 al n.8348, dalla Riunione Temporanea di Imprese avente come Capogruppo-mandataria la CO.GE.I. - Costruzioni Generali Italiane S.p.A. e quali mandanti la F.lli COSTANZO S.p.A., la I.R.A. Costruzioni S.p.A., e la Società Italiana CONDOITE D'ACQUA S.p.A.;

- Che nel bando di gara per l'affidamento dei predetti lavori è stata richiesta la categoria 14 (ex 13) di cui al D.M. 25 febbraio 1982 n.770;

- Che le Imprese facenti parte della menzionata Riunione Temporanea di Imprese risultano iscritte all'A.N.C. con i



numeri di matricola appresso indicati:

CO.GE.I. S.p.A. (Capogruppo) matr. A.N.C. n.3637210;

F.lli COSTANZO S.p.A. matr. A.N.C. n.1081411;

I.R.A. Costruzioni S.p.A. matr. A.N.C. n.3207404;


Soc. Italiana CONDOTTE D'ACQUA S.p.A. matr. A.N.C. n.429606.

- Che l'importo dei lavori, depurato del ribasso contrattuale del 3%, ascende a £.96.891.212.000=;

- Che la Riunione Temporanea di Imprese predetta con atto di sottomissione del 5-6-1987, n.741 di repertorio, si è obbligata ad eseguire i lavori previsti nella perizia di variante e suppletiva datata Aprile 1986 per il maggior importo di £.164.510.821.936= di cui £.18.647.539.766= per lavori entro i 6/5 dell'importo contrattuale, e £.145.863.282.170= per lavori eccedenti i 6/5;

- Che con atto di sottomissione in data 26-9-1990 n.781 di repertorio la medesima Riunione Temporanea di Imprese si è obbligata ad eseguire i lavori previsti nella perizia di assestamento e danni di forza maggiore datata luglio 1990 per il maggiore importo di £.578.056.170 per lavori eccedenti i 6/5 dell'importo contrattuale;

- Che con contratto di appalto in data 26-6-1991 n.87733 di repertorio Notar Salvatore Saraceno la medesima Riunione Temporanea di Imprese ha assunto a trattativa privata, in attuazione del II° comma lett. "b" dell'art.36 della L.R. n.21/85, l'esecuzione di lavori integrativi a completamento





dell'Invaso per il maggiore importo di £.4.311.713.575;

- Che con atto di sottomissione in data 26-7-1991 n.786 di repertorio la medesima Riunione Temporanea di Imprese si è

obbligata ad eseguire i lavori previsti nella perizia danni di forza maggiore datata Luglio 1991 per il maggiore importo di £.600.259.500= per lavori eccedenti i 6/5 dell'importo contrattuale;

- Che pertanto l'importo netto complessivo dei lavori ascende a £.266.892.063.181=;


- Che i lavori, consegnati il 26 luglio 1983 e sospesi per giorni 162 dal 29 settembre 1986 al 9 marzo 1987, sono stati ultimati il 27 settembre 1991, entro il termine contrattuale, escluso quelli del contratto 26-6-1991 e dell'atto di sottomissione 26-7-1991, ultimati il 31 ottobre 1991, sempre entro il termine contrattuale;

- Che sono stati contabilizzati al 10-10-1991 lavori per un importo netto di £.263.880.805.049=, oltre £.36.681.598.291= per revisione prezzi per un totale complessivo di lire £.300.562.403.340=;

- Che i lavori eseguiti comprendono le seguenti categorie di lavoro:

A) lavori per arginatura e costituzione del corpo diga ctg.14 £.118.935.000.000=;

Nell'ambito della categoria sono stati eseguiti movimenti di materiali e rilevati diga per complessivi mc.16.900.000=;





B) impermeabilizzazioni del corpo diga con materiali bituminosi in vari strati (manto di tenuta diga) ctg.19/e £.48.405.000.000 e per una superficie di mq.380.000=;

C) opere acquedottistiche ctg.10/a per £.52.950.000.000= con tubazioni in acciaio del diametro di mm.1600 e mm.1000 per ml.624 e ml.1250, con tubazioni in c.a.p. del diametro di mm.1000 e per ml.7420 e con tubazioni in P.R.F.V. del diametro di mm.1400 e per ml.7455;

D) opere di difesa e sistemazione idraulica ctg.10/b lire £.47.415.000.000=;

E) fondazioni speciali ctg.19/c £.26.705.000.000=;


F) varie £.9.163.000.000=;

- Che le opere eseguite dal 10 marzo 1987 (ripresa lavori) al 10 ottobre 1991 ascendono a £.178.041.712.788 oltre a lire £.19.270.721.096= per revisione prezzi per complessive lire £.197.312.433.884= così suddivise nelle suddette categorie di lavoro, e precisamente:

A) Cat. 14	£. 62.940.000.000=
B) Cat. 19/e	£. 44.300.000.000=
C) Cat. 10/a	£. 30.540.000.000=
D) Cat. 10/b	£. 43.540.000.000=
E) Cat. 19/c	£. 9.100.000.000=
F) Varie	£. 6.892.000.000=


Totale in c.t. £.197.312.000.000=

- Che i lavori sono stati diretti per conto della Riunione





Temporanea assuntrice dal Dott. Ing. Francesco Dolcimascolo.  
 I lavori sono stati eseguiti regolarmente e con buon esito e  
 con una attrezzatura ed una organizzazione tecnico-amministra-  
 tiva adeguata alla natura dei lavori stessi.



Si dichiara sotto responsabilità che quanto indicato nel  
 presente certificato trova riscontro nella documentazione in  
 atti.

Si rilascia il presente certificato in quattro copie in bollo  
 per gli usi consentiti dalla legge.

Lentini, li **25 MAG. 1992**

IL DIRETTORE DEI LAVORI

(Dott. Ing. *Ugo Amorelli*)

IL CAPO DELL'UFFICIO TECNICO

DEL CONSORZIO DI BONIFICA DEL LAGO DI LENTINI


(Dott. Ing. *Antonio Lombardo*)



*B.S. n. 2021*

Attesto io Francesco SCALDAFERRI. Notaio in Roma, con studio  
in Lungotevere Flaminio 76, che questa copia su cinque fogli  
è conforme al documento esibitomi dalla Società "CO.GE.I. -  
Costruzioni Generali Italiane S.p.A.", con sede in Roma, Via  
di Villa Patrizi n. 7, ed alla stessa restituito.  
Roma, cinque settembre millenovecentonovantaquattro.

*Francesco Scaldaferrì*

A circular notary seal stamp is located to the right of the signature. The seal features a central five-pointed star surrounded by a decorative border. The text around the perimeter of the seal is partially legible and includes the name "FRANCESCO SCALDAFERRI" and the word "NOTAIO".

(Deux timbres fiscaux de L. 5000)

**CONSORTIUM D'ASSAINISSEMENT DU LAC DE LENTINI**

**Objet: Tableau National des Constructeurs:**  
certificat concernant l'exécution des  
travaux délivré aux termes de l'article 14  
de la loi du 10/02/1962 n. 57 et de  
l'article 18 lettre b) de la loi du 8 août  
1977 n. 584.

Je soussigné Doct. Ing. Antonio LOMBARDO né  
à Catania le 16/08/1944, légitimé à  
délivrer la documentation en question en  
qualité de Chef du Bureau Technique du  
Consortium d'Assainissement du Lac de  
Lentini.

**CERTIFIE**

- que les travaux de construction de le caves de  
Lentini - 1° Lot - Travaux de mise en pot et  
bouclage Trigona et Cave - (P.S. 30/3032/A)  
financés par loi n. 132 du 30.04.1983 ont été pris  
par contrat d'adjudication n. 6465 de répertoire  
et n. 8 de recueil du 13 octobre 1983, enregistré  
à Rome le 28 octobre 1983 au n. 8348 par le  
Regroupement Temporaire d'Entreprises ayant comme

Conducteur des travaux et Mandataire la CO.GE.I. -  
Costruzioni Generali S.p.A. et en tant que  
mandants la F.lli COSTANZO S.p.A, la I.R.A.  
Costruzioni S.p.A. et la Società Italiana CONDOTTE  
D'ACQUA;

- que dans l'avis de concours pour la concession  
des sus-dits travaux a été demandée la catégorie  
14 (ex 13) dont au D.M.n. 770 25 février 1982;

- que les Entreprises qui font partie du sus-  
mentionné Regroupement Temporaire d'Entreprises  
sont inscrites au T.N.C. avec les matricules  
indiquées ci-après:

CO.GE.I. S.p.A. (Conducteur de travaux) matr.  
T.N.C. 3637210;

F.lli COSTANZO S.p.A matr. T.N.C. n. 1081411;

I.R.A. Costruzioni S.p.A. matr. T.N.C. n. 3207404;

Soc. Italiana CONDOTTE D'ACQUA S.P.A. matr. T.N.C.  
n.429606.

- que le montant des travaux, dépuré de la baisse  
contractuelle de 3% s'élève à L. 96.891.212.000;

- que le Regroupement Temporaire d'Entreprises  
sus-mentionné par acte de soumission n. 741 de  
répertoire du 05.06.1987, s'est engagé à exécuter  
les travaux prévues dans l'expertise de variation  
et supplétive datés Avril 1986 pour le montant de



L. 164.510.821.936 dont L. 18.647.539.766 pour travaux dans les 6/5 du montant contractuel, et L. 145.863.282.170 pour travaux surmontant les 6/5;

- que par acte de soumission en date du 26.09.1990 n. 781 de répertoire le même Regroupement Temporaire d'Entreprises s'est engagé à exécuter les travaux prévus dans l'expertise d'aménagement et dommages de force majeure datée juillet 1990 pour le montant de L. 578.056.170 pour travaux surmontant les 6/5 du montant contractuel;

- que par contrat d'adjudication n. 87733 du 26.06.1991 par le Notaire Salvatore Saraceno, le même Regroupement Temporaire d'Entreprise a pris, par négociation privée, aux termes du II° alinéa lettre "b" de l'article 36 de la L.R. n. 21/85, l'exécution de travaux d'intégration pour l'achèvement de l' "Invaso" pour le montant de L. 4.311.713.575;

- que par acte de soumission n. 786 de répertoire du 26.07.1991, le même Regroupement Temporaire d'Entreprises s'est engagé à exécuter les travaux prévus dans l'expertise dommage de force majeure datée juillet 1991 pour le montant de L. 600.259.500 pour les travaux surmontant les 6/5 du montant contractuel;

- que pourtant le montant net total des travaux s'élève à L. 266.892.063.181;
- que les travaux, délivrés le 26 juillet 1983 et suspendus pendant 162 jours du 29 septembre 1986 au 9 mars 1987, ont été achevés le 27 septembre 1991, dans les termes contractuels, exception faite pour les termes du contrat du 26.06.1991 et de l'acte de soumission 26.07.1991, achevés le 31 octobre 1991, toujours dans les termes contractuels;
- qu'à la date du 10.10.1991 ont été comptabilisés travaux pour un montant net de L. 263.880.805.049, s'ajoutant à L. 36.681.598.291 pour révision prix pour un montant total de L. 300.562.403.340;
- que les travaux exécutés comprennent les catégories de travail suivantes:
  - A) travaux pour endiguement et constitution du corps de barrage ctg. 14. L. 118.935.000.000;  
Dans le cadre de la catégorie ont été exécutés mouvements de matériaux et remblais barrage pour un total de 16.900.000 mc;
  - B) imperméabilisation du corps de barrage utilisant des matériaux bitumineux en plusieurs couches (protection de tenue du barrage) ctg. 19/e

L. 48.405.000.000 et une surface de 380.000 mc;

C) oeuvres de réalisation d'acqueducs cat. 10/a pour L. 52.950.000.000 avec conduites en acier du diamètre de 1600 mm et 1000 mm pour 624 ml et 1250 ml, avec conduites en c.a.p du diamètre de 1000 mm et pour 7420 mm et avec conduites en P.R.F.V. du diamètre de 1400 mm et pour 7455 ml;

D) oeuvres de protection et aménagement des eaux ctg. 10/b L. 47.415.000.000;

E) fondations spéciales ctg. 19/c L. 26.705.000.000;

F) diverses L. 9.163.000.000;

- que les oeuvres exécutées du 10 mars 1987 (reprise des travaux) au 10 octobre 1991 s'élèvent à L. 178.041.712.788 s'ajoutant à L. 19.270.721.096 pour révision prix pour un total de L. 197.312.433.884 ainsi divisé dans les catégories de travail suivantes et notamment:

A) Cat. 14	L. 62.940.000.000
B) Cat. 19/e	L. 44.300.000.000
C) Cat. 10/a	L. 30.540.000.000
D) Cat. 10/b	L. 43.540.000.000
E) Cat. 19/c	L. 9.100.000.000
F) Diverses	<u>L. 6.892.000.000</u>
Total en c.t.	<u>L.197.312.000.000</u>

- que les travaux ont été dirigés par l'Ing. Francesco Dolcimascolo pour le compte du Regroupement Temporaire d'Entreprises.

Les travaux ont été exécutés régulièrement avec de bons résultats et avec un équipement et une organisation techno-administrative adéquate à la nature des travaux.

(Deux timbres fiscaux de L. 5000)

On déclare sous responsabilité que tout ce qui est indiqué dans ce certificat est conforme aux documents originaux.

Ce certificat est délivré en 4 copies en papier timbré pour les usages prévus de la loi.

Lentini, le 25 mai 1992

LE DIRECTEUR DES TRAVAUX

(Dott. Ing. Onofrio Amorelli)

(Signature illisible)

LE CHEF DU BUREAU TECHNIQUE DU CONSORTIUM  
D'ASSAINISSEMENT DU LAC DE LENTINI

(Dott. Ing. Antonio Lombardo - signature  
illisible)

Timbre rond du Consortium d'Assainissement du Lac  
de Lentini.

Je soussigné Francesco SCALDAFERRI, Notaire à Rome au n. 76, Lungotevere Flaminio que cette copie est conforme au document qui m'a été présenté en 5 feuilles par la CO.GE.I. Costruzioni Generali Italiane S.p.A. ayant son siège social au n.7, Via di Villa Patrizi et à elle rendu.

Timbre rond du Notaire Francesco SCALDAFERRI et signature illisible.

**Formulaire de pré-qualification**

---

**Projet : AMÉNAGEMENT HYDROAGRICOLE DU BASSIN DE L'ANAMBE - PHASE II**

**Entreprise : CO.GE.I. COSTRUZIONI GENERALI ITALIANE S.p.A.**


**EXPÉRIENCE : TOTALITÉ DES PROJETS EN COURS**

Voir Annexe: "Liste des travaux en cours de réalisation"

---

Client	Nom de la firme d'ingénieur Conseil responsable de la supervision	Lieu des travaux et description	Taux de participation de l'entreprise dans le projet	Valeur du contrat	Taux réel d'achèvement	Date d'achèvement prévue

**CO. GE. I.**  
Costruzioni Generali Italiane S.p.A.  
Ing. FABRIZIO PERRINI



TRAVAUX EN COURS D'EXECUTION

TRAVAUX DE PROTECTION ET D'AMENAGEMENT HYDRAULIQUE



Travaux d'amélioration et intégration de l'aqueduc PERTUSILLO.  
Projet n° 1768/SCOE, Lot. 1.

- Maître d'Ouvrage : ENTE AUTONOMO DELL'ACQUEDOTTO  
PUGLIESE
- Date du contrat : 05/06/1992, enrg. à Bari le  
30/06/1992 sous le n° 5159/A,  
rép. 24128
- Date de démarrage : 20/03/1992
- Montant net des travaux : Lit. 16.623.868.000=
- Date avancement : 30/06/1993
- Montant Lires : 9.034.000.000=
- Quote part (%) : 80,00

Les travaux ont été pris en adjudication par le Groupement  
d'Entreprises: CO.GE.I. S.p.A. (Chef de File), SIELP et PERILLI.

Travaux d'aménagement hydraulique du Torrent Sarmento, localité Noepoli, Cersosimo e S. Giorgio Lucano.

- Maître d'Ouvrage : PROVVEDITORATO ALLE OO.PP. DELLA BASILICATA, Potenza
- Date du contrat : 16/06/1989, enrg. à Potenza le 19/06/1990, rép. 4833
- Date de démarrage : 18/10/1988
- Date achèvement : 25/06/1995
- Montant net des travaux : Lit. 20.413.440.000=
- Actes additionnels:
  - du 18/04/1990, Rép. N° 1505, enrg. à Potenza le 19/06/1990
  - du 23/11/1990, rép. n° 5156, enrg. à Potenza le 07/10/1991
- Date avancement : 16/09/1993
- Montant Lires : 8.547.696.000=

Les travaux ont été suspendus le 12/01/1989 et repris le 23/01/1991.

DIGUES

Travaux de construction de l'Oeuvre dénommée "INVASO PIETRAROSSA", sur le fleuve MARGHERITO.

- MAITRE D'OUVRAGE : CONSORZIO DIBONIFICA CALTAGIRONE
- Date du contrat : 12/12/1988, Rép. N° 51825, enrg. le 27/12/1988 sous le N° 279
- Date de démarrage : 16/02/1989
- Montant du marché : Lit. 84.888.356.411=
- Date d'achèvement : 31/05/1993
- Acte additionnel : du 12/06/1991, enrg. à Caltagirone le 25/06/1991 sous le n° 522
- Date avancement : 19/05/1993
- Montant liras : 39.839.000.000
- Date révision prix : 19/05/1993
- Montant liras : 4.524.000.000
- Quote part (%) : 50,00

Les travaux ont été pris en adjudication par le Groupement des Entreprises LODIGIANI S.p.A. et CO.GE.I. S.p.A., dont la COGEI participe à 50%.

Le montant des travaux exécutés se rapport à la seule part COGEI.

Travaux pour le rétablissement du stockage de la "DIGA ANCIPA".

- MAITRE D'OUVRAGE	: ENEL-ENTE NAZIONALE ENERGIA ELETTRICA
- Date du contrat	: 15/05/1990, n° A.AP.L.A. 0441
- Date de démarrage	: 26/06/1990
- Montant du marché	: Lit. 32.424.000.000=
- Date avancement	: 30/06/1993
- Montant lires	: 2.757.875.620=
- Quote part (%)	: 50,00

Les travaux ont été pris en adjudication par le Groupement des Entreprises CO.GE.I. S.p.A. et LODIGIANI S.p.A., dont la COGEI participe à 50%.

Le montant des travaux exécutés comprend aussi les sommes dues au titre de la révision des prix.

TRAVAUX ROUTIERS

R.N. N° 2, CASSIA (ITALIE)  
Travaux de construction de la route "Monteroni d'Arbia".  
Tronçon Monteroni d'Arbia nord et Monteroni d'Arbia Sud.  
Tronçon Siena-Buonconvento.

- MAITRE D'OUVRAGE : A.N.A.S. - AZIENDA AUTONOMA DELLE STRADE
- Date du contrat : 19/09/1991, Rép. n° 20794, enrg. le 05/11/1991
- Date de démarrage : 26/06/1991
- Montant du marché : Lit. 39.056.000.000=
- Date avancement : 31/12/1993
- Montant liras : 21.258.706.976=
- Quote part (%) : 76,10

Les travaux ont été pris en adjudication par le Groupement des Entreprises CO.GE.I. S.p.A., FAGOTTI S.r.l. et DONA' S.a.s.

Le montant des travaux exécutés comprend aussi les sommes dues au titre de la révision des prix et se rapport à la seule part COGEI.

R.N. N° 106 "JONICA"  
Lot. 5, Travaux d'achèvement

- MAITRE D'OUVRAGE : A.N.A.S. - AZIENDA NAZIONALE  
AUTONOMA DELLE STRADE.  
- Date du contrat : 15/06/1993, Rép. n° 21499  
- Date de démarrage : 24/02/1993  
- Montant du marché : Lit. 22.763.954.717=  
- Date avancement : 15/12/1993  
- Montant lires : 9.820.132.196=

Les ont été exécutés par le Groupement d'entreprises: COGEI  
S.P.A. (chef de file) et FERRARA S.n.c.

Le montant des travaux exécutés se rapporte à la seule part  
COGEI.



R.N. N° 12 "DELL'ABETONE E DEL BRENNERO"  
Travaux de construction de la route de Ponte a Moriano, entre le  
Km. 30+280 jusqu'au Km. 35+345.

- MAITRE D'OUVRAGE	: A.N.A.S. - AZIENDA NAZIONALE AUTONOMA DELLE STRADE.
- Date du contrat	: 17/04/1991, Rép. n° 20570
- Date de démarrage	: 26/03/1991
- Montant du marché	: Lit. 35.153.000.000=
- Date avancement	: 30.06.1993
- Montant lires	: 13.019.000.000=

Travaux routiers et remblais ferroviaires.

Prestations complétées pour le projet définitif du tronçon de la ligne Ferrandina (i) - Matera La martella (i) et Matera La Martella (e) - Matera C.le (i) et pour le projet exécutif et la réalisation des travaux nécessaires pour la construction du tronçon de la ligne Ferrandina (i) Matera La Martella (i).

- MAITRE D'OUVRAGE	: AZIENDA AUTONOMA FF.SS
- Date du contrat	: 02/12/1983, Rép. n°2641
- Date de démarrage	: 02/05/1986
- Montant du marché	: Lit. 241.948.500.000=
- Date d'achèvement	: 07/10/1995
- Date avancement	: 30/06/1993
- Montant lires	: 77.477.347.004
- Quote part (%)	: 43,92

Les travaux ont été pris en adjudication par une Association Temporaire de Sociétés dont a succédé la Société Consrtiale a r.l. MA.TE.FER., aux termes de l'art. 12 de la loi 687/84.

Le montant net contractuel comprend les Actes Additionnels.

Le montant des travaux exécutés au 31/10/1993 comprend la révision des prix.

R.N. N° 95 "DI BRIENZA", Tronçon TITO SCALO-BRIENZA.  
Lots 2 et 3.

Travaux d'adaptation et d'amélioration entre les Km. 1+750  
jusqu'aux Km 27+940.

- MAITRE D'OUVRAGE : A.N.A.S. - AZIENDA NAZIONALE  
AUTONOMA DELLE STRADE.
- Date du contrat : 12/06/1989, Rép. 19735
- Date de démarrage : 19/10/1988
- Date achèvement prévue : 09/07/1993
- Montant du marché : Lit. 72.225.520.000=
- Actes Additionnels : n° 1: du 13/05/1990, Rép. n°  
20174, Lit. 18.759.520.000 et  
n° 2: du 18/10/1991, Rép. n°  
20839, Lit. 4.706.000.000
- Date avancement : 10/09/1993
- Montant lires : 66.151.940.456=
- Quote part % : 90,70

Le montant des travaux exécutés par la CO.GE.I. S.p.A. pour la  
cat. 6 est de Lit. 34.745.000.000=

En date 21/05/1993, a été requise au "Compartimento di Potenza"  
une prorogation de douze mois pour l'achèvement des travaux.

R.N. N° 321 "DEL POLACCO", Travaux urgents pour le renforcement de la route - Lot 2.

- MAITRE D'OUVRAGE	: A.N.A.S. - AZIENDA NAZIONALE AUTONOMA DELLE STRADE.
- Date de demarrage	: 23/07/1992
- Montant du marché	: Lit. 10.750.000.000=
- Date avancement	: 31/03/1993
- Montant lires	: 2.880.000.000=
- Quote part %	80,00

Concession des ouvrages annexées à le Projet de doublement de la ligne de chemin-de-fer FIRENZE-EMPOLI et construction de part des ouvrages financées.

- MAITRE D'OUVRAGE	: FERROVIE DELLO STATO - FIRENZE
- Date du contrat	: 16/05/1984, Rép. n° 48/1984
- Date de demarrage	: 05/10/1983
- Montant du marché	: Lit. 255.800.000.000=
- Date achèvement	: 31/12/1996
- Date avancement	: 31/01/1994
- Montant liras	: 29.834.465.208=
- Quote part %	51,25

Les travaux ont été pris en adjudication par le Groupement d'Entreprises: CO.GE.I. S.p.A., C.I.R. COSTRUZIONI S.r.l. et COMIL S.p.A.

Le montant net contractuel se rapport à la seule part CO.GE.I. S.p.A.

Le montant des travaux exécutés comprend des Actes Additionnels.

AQUEDUCS, EGOUTS ET ENT. D'IRRIGATION

Travaux pour l'exploitation des eaux de Piedimonte Etneo pour  
l'approvisionnement hydrique de la ville de Catania.  
I° Tronçon.

- Maître d'Ouvrage:

ASSESSORATO REGIONALE AI LAVORI PUBBLICI

- Date du contrat: 31/03/1988

- Numéro du contrat: Rép. n° 10706.

- Date de démarrage: 03/12/1988

- Montant du marché: Lit. 40.021 .246 .164

- Date avancement: 25/11/1990

- Montant lires: 19.858.748.868

- Quote part (%): 82,00

Les travaux ont été exécutés par un Groupement d'Entreprises  
dont la CO.GE.I. S.p.A., participe à 82,00%.

Travaux pour l'exploitation des eaux de Piedimonte Etneo pour  
l'approvisionnement hydrique de la ville de Catania.  
II° Tronçon.

- Maître d'Ouvrage:

ASSESSORATO REGIONALE AI LAVORI PUBBLICI

- Date du contrat: 29/07/1988

- Numéro du contrat: Rép. n° 10724.

- Date de démarrage: 12/10/1988

- Montant du marché: Lit. 79.318.398.626

- Date d'achèvement: 11/04/1996

- Date avancement: 10/08/1994

- Montant liras: 25.400.758.224=

- Quote part (%): 82,00

Les travaux ont été exécutés par un Groupement d'Entreprises  
dont la CO.GE.I. S.p.A., participe à 82,00%.



Travaux de construction de l'Aducteur de PONTE BARCA au Réservoir de LENTINI.  
Projet n°30/3104.

- Organisme Concessionnaire : CONSORZIO DI BONIFICA DELLA PIANA DI CATANIA
- Date consignation travaux : 08/05/1990
- Date du contrat : 11/07/1990, Rép. n° 6893, enr. à Catania le 20/07/1990 sous le numéro 5802
- Date échéance : 14/03/1994
- Montant net des travaux : Lit. 111.133.712.691=
- Date avancement : 16/07/1993
- Montant lires : 72.724.652.916=
- Quote part % : 38,34

Les travaux ont été pris en adjudication par le Groupement d'Entreprises: CO.GE.I. S.p.A. (chef de file), ASTALDI S.p.A., VIANINI LAVORI S.p.A., SOCIETA ITALIANA PER CONDOTTE D'ACQUA S.p.A., LODIGIANI S.p.A., dont la COGEI S.p.A. participe à 38,34%.

Les travaux ont été suspendus en data du 17/05/1990 et repris en date du 17/09/1990.

Travaux d'achèvement pour la réhabilitation de l'installation de l'irrigation du Metapontino, Adducteur AGRI.  
Projet C0679.

- Organisme Concessionnaire : CONSORZIO DI BONIFICA DI BRADANO  
E METAPONTO
- Date consignation travaux : 06/08/1991
- Date du contrat : 07/10/1991, Rép. n° 47734, enr.  
à Matera le 15/10/1991
- Montant net des travaux : Lit. 55.243.000.000=
- Montant révision prix : 1.000.000.000=
- Date avancement : 01/07/1993
- Montant lires : 15.587.051.525=
- Quote part % : 34,00

Les travaux ont été pris en adjudication par un Groupement d'Entreprises.

Travaux de construction des reseaux d'irrigation d'eau sortant du Barrage de PONTE BARCA. Zone à gauche du fleuve SIMETO.

- Organisme Concessionnaire : CONSORZIO DI BONIFICA DELLA PIANA DI CATANIA
- Date consignation travaux : 23/04/1992
- Date du contrat : 21/09/1992, Rép. n° 42600
- Date échéance : 23/07/1994
- Montant net des travaux : Lit. 6.665.086.000=
- Date avancement : 28/09/1993
- Montant liras : 1.413.283.277=
- Quote part % : 60,00

Les travaux ont été pris en adjudication par le Groupement d'Entreprises: CO.GE.I. S.p.A. (chef de file) et SAFAB S.p.A.

Les travaux ont été suspendus de 23/04/1992 jusqu'au 21/09/1992.

Le montant des travaux exécutés se rapport à la seule part COGEI.

Recherches géognostiques et épreuves hydrauliques à l'intérieur  
du tunnel GROTTAFUMATA.

- Maître d'Ouvrage : ENEL
- Date consignation travaux : 23/04/1992
- Date du contrat : 30/04/1992, Rép. n° 142, n° 77  
APA429.1.1CV
- Date échéance : 20/08/1992
- Montant net des travaux : Lit. 965.611.000=

Travaux appartenant au 2ème group des ouvrages divers de la ville de Catania.

Travaux a réalisés:

- . Ecoles sités en Viale Nitta e Viale Bicocca.
- . Viaduct Librino
- . Assainissements divers.

- Maître d'Ouvrage : PRESIDENZA DELLA REGIONE SICILIANA
- Date du contrat : 02/09/1991
- Date de demarrage : 03/09/1991 et 04/09/1991
- Montant net des travaux : Lit. 39.785.042.343=
- Acte additionnel : Lit. 5.351.048.290
- Date avancement : 31/03/1993
- Montant Lires : 8.024.773.306=
- Quote part (%) : 46,00%

Les travaux ont été pris en adjudication par le Groupement d'Entreprises: CO.GE.I. S.p.A. (Chef de file), COMIL S.p.A., CONSORZIO COOPERATIVE et FOSCO ALDO S.r.l.

Travaux appartenant au 1ère group des ouvrages divers de la ville de Catania.

Travaux a réalisés:

. travaux d'assainissement divers

- Maître d'Ouvrage : PRESIDENZA DELLA REGIONE SICILIANA
- Date du contrat : 01/09/1989
- Date de demarrage : 11/12/1989
- Date achèvement : 07/12/1994
- Montant net des travaux : Lit. 34.173.647.575=
- Acte additionnel : n° 1: du 04/02/1991 de Lit. 114.777.946 et n° 2: du 23/07/1992 de Lit. 9.767.623.341
- Date avancement : 31/08/1993
- Montant Lires : 21.477.111.958=
- Date révision prix : 31/08/1993
- Montant lires : 396.097.465
- Quote part (%) : 16,00%

Les travaux ont été pris en adjudication par le Groupement d'Entreprises: VIANINI LAVORI S.p.A. (Chef de file), AIA S.p.A., TODINI S.p.A. CO.GE.I. S.p.A. et GDM S.r.l.

Travaux d'assainissement et adduction des eaux pluviales nommé  
"COLLETORE B".

- Maître d'Ouvrage : CTA 2 a r.l.
- Date du contrat : 25/0/3/1992
- Date de démarrage : 26/03/1992
- Date achèvement prévue : 15/03/1994
- Montant net des travaux : Lit. 6.136.468.837=
- Acte additionnel : n° 1: Lit. 2.507.896.797=
- Date avancement : 31/03/1993
- Montant Lires : 5.067.697.450=

TRAVAUX DE BATIMENTS



Travaux de constructions du nouveau Palais de Justice de Torino,  
Lot 2.

Réalisation des bâtiments destinés à les salles judiciaires,  
bureaux et services divers.

- MAITRE D'OUVRAGE	: EDIL.PRO S.p.A.
- Date du contrat	: 14/05/1991
- Date de démarrage	: 28/12/1990
- Montant du marché	: Lit. 179.039.931.000=
- Date avancement	: 30/06/1993
- Montant liras	: 9.280.000.000=
- Quote part (%)	: 20,00

Les travaux ont été pris en adjudication par un Groupement  
d'entreprises dont la COGEI S.P.A. participe au 20,00%

Autoroute MILANO-NAPOLI.

Liaison directe entre les Autoroutes A1 et A11.

Travaux de construction de la nouvelle gare de Prato Est.  
bâtiments et ouvrages annexes.

- MAITRE D'OUVRAGE	: AUTOSTRADE S.p.A. - CONCESSIONE E COSTRUZIONE AUTOSTRADE
- Date du contrat	: 13/05/1991, Rép. N° 13118
- Date de démarrage	: 27/06/1991
- Date achèvement	: 30/08/1992
- Montant du marché	: Lit. 3.095.614.048=
- Acte additionnel	: n° 1: Lit. 814.380.000=
- Date avancement	: 27/09/1992
- Montant lires	: 1.546.747.094=
- Quote part (%)	: 50,00

Les travaux ont été pris en adjudication par le Groupement  
d'Entreprises: COGEI S.P.A. (chef de file) et COSTRUZIONI  
MAMBRINI S.p.A.

Le montant des travaux exécutés se rapport à la seule part COGEI  
SPA.

Construction de la Caserne et des logements du Commandement des  
Carabinieri de Perugia, 2ème Tronçon

- MAITRE D'OUVRAGE : PROVVEDITORATO REGIONALE ALLE  
OPERE PUBBLICHE PER L'UMBRIA
- Date du contrat : 06/12/1989, Rép. N° 2415,  
ENRG. LE 06/06/1990
- Date de démarrage : 5/06/1990
- Date achèvement : 04/06/1994
- Montant du marché : Lit. 1.604.190.409=
- Acte additionnel : n° 1: Lit. 333.359.330=
- Date avancement : 01/10/1993
- Montant lires : 932.485.635=

Concession des prestations intégrées nécessaires aux études préliminaires, le projet, la construction et la mise en fonction, relatif à la réalisation de magasins pour le stock avec installation mécanisée et à gestion automatisée, ainsi que pour le renforcement avec ces systèmes de magasins existents.

- Organisme Concessionnaire:  
ENTE FERROVIE DELLO STATO - Service Travaux et Construction
- Bureau des Constructions bis
  
- Date du contrat: 12.05.1986
- : n. 50/86du rép.
  
- Date remise travaux: 14.05.1985
  
- Montant net travaux: 453.023.000.000
  
- Date avancement: 30.06.1989
  
- Montant lires: 32.217.943.078

Une quote - part d'oeuvres civiles de L. 110.000.000.000= a été attribuée à la Société.

Le montant net des travaux exécutés au 30/06/1989 comprend la révision des prix.

Travaux pris en adjudication par l'Association FERMAG.

Travaux de restructuration, modernisation et renforcement du Centre national des Matériaux de l'Administration des postes et Télécommunication, situé à Scanzano de Foligno (PG).

- MAITRE D'OUVRAGE : MINISTERO DELLE POSTE E TELECOMUNICAZIONI
- Date du contrat : 31/03/1988
- Date de démarrage : 27/04/1988
- Date achèvement : 10/09/1994
- Montant du marché : Lit. 55.028.668.208=
- Avenants : du 31/03/1988, approuvé avec D.M. du 14/04/1988  
du 24/01/1990, approuvé avec D.M. du 07/02/1990 et  
du 03/12/1990, approuvé avec D.M. du 12/12/1990
- Date avancement : 31/08/1993
- Montant liras : 55.028.668.208=

Travaux pris en adjudication par l'Association FERMAG.

Dans le cadre de l'Association, ont été confiés à la Société CO.GE.I. S.p.A., travaux civils pour un montant de Lit. 68.286.073.111=

Le montant des travaux exécutés se rapporte à la seule part COGEI SPA.

Exécution des prestations nécessaires pour la réalisation du nouveau dépôt à plusieurs fonctions "FIROENZA".

- MAITRE D'OUVRAGE	: FERROVIE DELLO STATO
- Date du contrat	: 16/12/1986
- Date de démarrage	: 31/03/1987
- Date achèvement	: 31/03/1995
- Montant du marché	: Lit. 300.042.929.122=
- Date avancement	: 31/01/1994
- Montant liras	: 82.477.000.000=
- Quote part (%)	: 40,00

Travaux pris en adjudication par le Groupement d'Entreprises:  
CO.GE.I. S.p.A., LODIGIANI S.p.A., ITIN S.p.A. et CONSORZIO  
COOPERATIVE COSTRUZIONI.

Le montant des travaux se rapport à la seule part CO.GE.I.  
S.p.A.

Réalisation de la Centrale en plein air et ouvrage annexes.  
Installation de CORDENONS (PD)

- MAITRE D'OUVRAGE	: ENEL S.p.A.
- Date du contrat	: 29/03/1993
- Date de démarrage	: 27/04/1993
- Date achèvement	: 11/04/1996
- Montant du marché	: Lit. 13.914.415.155=
- Date avancement	: 31/11/1993
- Montant lires	: 967.113.932=
- Date révision prix	: 30/11/1993
- Montant lires	: 21.986.629=
- Quote part (%)	: 85,00

Travaux pris en adjudication par le Groupement d'Entreprises:  
CO.GE.I. S.p.A. (Chef de File) et G.V.A.

Construction de la Caserne et des logements du Commandement des Carabiniers de Perugia, 1ère Tronçon

- MAITRE D'OUVRAGE : PROVVEDITORATO REGIONALE ALLE OPERE PUBBLICHE PER L'UMBRIA
- Date du contrat : 21/12/1988, Rép. N° 2354,
- Date de démarrage : 05/06/1990
- Date achèvement : 04/06/1994
- Montant du marché : Lit. 4.222.849.359=
- Acte additionnel : n° 1 du 26/11/1990 et n° 2 du 02/03/1993
- Date avancement : 01/10/1993
- Montant lires : 4.602.556.420=



Construction de un Garage multi-étages en Place CAVALLOTTI (ME)

- MAITRE D'OUVRAGE : COMUNE DI MESSINA
- Date du contrat : 06/03/1992, Rép. N° 844, ENRG. à  
MESSINA LE 24/03/1992
- Date achèvement : 07/07/1993
- Montant du marché : Lit. 7.920.000.000=
- Acte additionnel:
  - n° 1 du 31/10/1991 de lit. 40.232.808
  - n° 2 du 01/10/1992 de lit. 448.376.8440 et
  - n° 3 du 01/06/1993 de Lit. 82.149.221
- Date avancement : 21/10/1993
- Montant lires : 4.755.089.967=
- Quote part (%) : 78,00

Travaux pris en adjudication par la Société Consortielle à r.l.  
"PARCHEGGI MESSINA": COGEI S.p.A., TORNO S.p.A. et ITIN S.p.A.

TRAVAUX MARITIMES

Travaux portuaires de Pozzallo - Projet exécutif 2° lot -  
Proj. Spéc. 2/R.G.2044/7/2.

- Organisme Concessionnaire:  
CONSORZIO A.S.I. - ZONE DE DEVELOPPEMENT INDUSTRIEL de la  
Province de Raguse.
- Date du contrat: 25-10-1985
- Montant net travaux: 27.469.654.200
- Date avancement: 30-04-1988
- Montant Lires: 27.336.000.000
- Date achèvement travaux: 30-04-1988
- Quote-part %: 30.00

Le travail est exécuté par la Société Consortiale a.r.l.  
PORT DE POZZALLO, dont la CO.GE.I. S.p.a. participe à 30%.

- Déblais dans l'eau	m3	7.680
- Tout-Venant	m3	444.000
- Gros moëllons	t	410.860
- Pierraille préfabriquée "Antifer"	m3	65.500
- Béton pour B.A.	m3	65.870
- Acier	Kg	52.410
- Remblai mélange sable-gravier	m3	92.300

Travaux d'achèvement du Port de Pozzallo - 3° Lot. - P.S.  
2/RG - 2044/7/3.

- Maître d'Ouvrage : CONSORZIO ASI DI RAGUSA
- Date du contrat : 06/04/1989  
: enr. le 18/04/1989, sous le  
numéro 20718
- Date de démarrage : 06/02/1989
- Date d'achèvement prévue : 05/04/1992
- Montant net des travaux : Lit. 40.099.920.000=
- Date avancement : 31/12/1991
- Montant Travaux Exécutés : Lit. 36.973.360.000
- Quote-part (%) : 30,00

Les travaux ont été pris en adjudication par un Groupement d'Entreprises, dont la CO.GE.I. S.p.A. participe à 30%.

Travaux de construction des nouvelles structures interieures du  
Port de ORTONA, lot 2.

- MAITRE D'OUVRAGE : CONSORZIO ASI - AREA DI SVILUPPO  
INDUSTRIALE DELLA VALLE DEL  
PESCARA
- Date du contrat : 05/08/1991, Rép. n° 35025, enrg.  
à Chieti le 21/08/1991
- Date de demarrage : 22/05/1991
- Montant du marché : Lit. 3.067.122.500=
- Date avancement : 31/08/1991
- Montant lires : 3.011.272.651=
- Quote part (%) : 31,59

Construction du PORT COMMERCIAL DE AUGUSTA, travaux de finition  
du 2ème lot.

- MAITRE D'OUVRAGE : CONSORZIO A.S.I. DI SIRACUSA
- Date du contrat : 10/03/1992, Rép. n° 32483, enrg.  
à Siracusa le 11/03/1992
- Date de demarrage : 14/01/1992
- Montant du marché : Lit. 20.103.147.440=
- Quote part (%) : 30,00

Construction des ouvrages constituant la protection du Chemin-de-fer à côté du mer du Km. 159+927 jusqu'au Km 161+416, entre la gare de Diamante et Belvedere et du Km. 199+752 jusqu'au Km 200+750 entre les gares de Paola et S. Lucido.

- MAITRE D'OUVRAGE	: ENTE FERROVIE DELLO STATO
- Date du contrat	: 15/12/1983 n° 77/1983
- Date de démarrage	: 01/10/1983
- Montant du marché	: Lit. 56.249.292.000=
- Date avancement	: 30/06/1992
- Montan lires	: 57.124.001.069
- Date révision prix	: 30/06/1992
- Montant lires	: 29.287.857.152
- Quote part (%)	: 13,34

Les travaux ont été exécutés par le Groupement d'Entreprises:  
CO.GE.I. S.p.A. (Chef de File), SOCOMAR S.p.A., SPARTACO  
S.p.A., SIDER S.p.A., DRAGOMAR S.p.A., Ingg.  
GAGLIARDI-CHIODONI-BIANCHI S.p.A., SOCIETA ITALIANA PER CONDOTTE  
D'ACQUA S.p.A.

Travaux de protection du litoral de Ostia (RM), entre le quai Vittoria au Canal "dei Pescatori".

- MAITRE D'OUVRAGE : MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI,  
Ufficio del Genio OO.MM, Roma
- Date du contrat : 18/04/1989, Rép. n° 1683
- Date de demarrage : 02/05/1989
- Montant du marché : Lit. 30.792.820.000=
- Date avancement : 31/12/1991
- Montan lires : 28.438.506.000=
- Quote part (%) : 31,00

Les travaux on été exécutés par le Groupement d'Entreprises:  
Societa Italiana per Condotte D'acqua (Chef de File), Pietro  
Cidonio S.p.A., DRAGOMAR S.p.A. et CO.GE.I. S.p.A.



Travaux de construction des nouvelles structures interieures du Port de ORTONA.

- MAITRE D'OUVRAGE : CONSORZIO ASI - AREA DI SVILUPPO INDUSTRIALE DELLA VALLE DEL PESCARA
- Date du contrat : 05/12/1988, Rép. n° 28923, enrg. à Chieti le 27/12/1988
- Date de demarrage : 19/10/1988
- Montant du marché : Lit. 6.984.167.758=
- Date avancement : 31/12/1991
- Montant liras : 10.418.599.000=
- Quote part (%) : 31,59

Les travaux ont été suspendus pendant le cours des années 89/90/91, pour un total de 331 jours.

Travaux d'amélioration de la navigation de sortie du Port de Augusta.

- MAITRE D'OUVRAGE	: CONSORZIO A.S.I. DI SIRACUSA
- Date du contrat	: 13/01/1990, Rép. n° 22513
- Date de démarrage	: 13/01/1990
- Montant du marché	: Lit. 45.643.315.000=
- Date avancement	: 31/12/1991
- Montant lires	: 41.405.214.000
- Quote part (%)	: 40,00

Les travaux ont été pris en adjudication par le Groupement d'Entreprises: CONDOTTE S.p.A., DRAGOMAR S.p.A. et CO.GE.I. S.p.A.

Les travaux ont été suspendus en date du 23/04/1991

Travaux de construction du Port Commercial de Augusta, Lot 2,  
seconde partie.

- MAITRE D'OUVRAGE	: CONSORZIO A.S.I. DI SIRACUSA
- Date du contrat	: 01/12/1989, enrg. le 06/12/1989 sous le nà 1981
- Date de demarrage	: 26/10/1989
- Montant du marché	: Lit. 16.338.517.000=
- Date avancement	: 31/12/1991
- Montant lires	: 8.392.710.000=
- Quote part (%)	: 29,75

## FICHE MARCHES EN EXECUTION

OBJET: Travaux de construction des nouvelles structures internes du port de Ortona - 3° tranche

VILLE - ETAT: Ortona (Chieti) - Italie

DESCRIPTION DES TRAVAUX: Le projet prévoit l'exécution d'installations portuaires.

MAITRE D'OUVRAGES: Consortium A.S.I. de la Valle del Pescara

CONTRAT: en date 09/12/1991 n. 35421 de rep., enregistré à Chieti le 18/12/1991 au n. 2245 pour un montant net de L. 4.145.800.000.

ACTE DE SOUMISSION: en date 13/01/1993, enregistré à Chieti en date 08/02/1993 au n. 311, pour un montant net de L. 4.348.390.000.

MONTANT NET DES TRAVAUX EXECUTES au 01/03/1993: L. 2.130.227.000

LIVRAISON DES TRAVAUX EN DATE: 16/09/1991

ECHEANCE DU TEMPS UTILE POUR L'ACHEVEMENT DES TRAVAUX: livraison partielle

PARTENAIRES:

- DRAGOMAR de Rome (chef de file)
- DI VINCENZO S.p.A de Pescara
- ITALDREDGING S.p.A de Rome

QUOTE-PART COS.NA : 31,59%

PRINCIPALES OEUVRES EXECUTEES:

- |                            |                |        |
|----------------------------|----------------|--------|
| - Conglomérat en béton     | mc             | 2.350  |
| - Câbles électriques       | ml             | 12.180 |
| - Pavage en blocs masselli | m <sup>2</sup> | 11.150 |

TRAVAUX DE RESTAURATION

-----

Travaux de restauration des lieux ex magasins ALATRI.

- Maître d'Ouvrage : BANCARIA IMMOBILIARE S.p.A.
- Date du contrat : 08/11/1989  
: rép. n° 6/54209
- Date de démarrage : 08/11/1989
- Montant net des travaux : Lit. 1.722.000.000=
- Date achèvement travaux : 23/03/1991
- Avenant : du 23/07/1990
- Date avancement : 30/06/1991
- Montant lires : Lit. 1.722.000.000

Autoroute AOSTA-MONTE BIANCO.  
Tronçon Monte Bianco - Morgex, Lot 3

- MAITRE D'OUVRAGE	: R.A.V. - RACCORDO AUTOSTRADALE VALLE D'AOSTA S.p.A
- Date du contrat	: 06/02/1993
- Date de démarrage	: 15/07/1992
- Date achèvement prévue	: 15/07/1995
- Montant du marché	: Lit. 51.096.826.000=
- Date avancement	: 30/11/1993
- Montant liras	: 2.948.410.456=
- Quote part %	: 28,00

Les travaux ont été pris en adjudication par le Groupement d'entreprises: ASTALDI S.p.A., COGEI S.P.A., GIUSTINO COSTRUZIONI S.p.A., CALDART S.p.A. RARA OTTAVIO S.p.A., nommé VIADOTTI DI COURMAYEUR S.c.r.l.

Le montant des travaux exécutés se rapporte à la seule part COGEI.

TRAVAUX DE DEBUT IMMINENT



TRAVAUX ROUTIERS

Construction d'un tronçon de nouvelle ligne de chemin de fer  
entre S. SEVERO et APRICENA, parallèle au réseau FS. S. SEVERO  
TERMOLI.

- MAITRE D'OUVRAGE : FERROVIE DEL GARGANO S.r.l.
- Date du contrat : 30/10/1989, enrg. à Bari le  
20/11/1989 sous le n° 20067
- Montant du marché : Lit. 62.946.219.000=

Ce projet, comprend la projection finale et la construction du Chemin de fer du "GARGANO" entre S. SEVERO et APRICENA, Puglia- Italie, pour une longueur de 21 Km. y compris les structures principales suivantes:

- 1 pont métallique : : 90 m.l. (2 x 45 m)
- 1 pont métallique : 35 m.l.
- 1 viaduc : : 500 m.l. (20 x 25 m)
- 1 tunnel : 3.200 m.l.

CARATTERISTIQUES TECHNIQUES:

- Deblais en terre : 350.000 m3
- Remblais : 930.000 m3
- Deblais en rock : 130.000 m3
- Deblais en tunnel : 232.000 m3
- Béton armée pour tunnel : 50.500 m3
- Structures en acier : 508.000 Kg.
- Béton pour structures : 28.800 m3
- Acier : 1.254.000 Kg.
- Poutres métalliques : 396.000 Kg.
- Piles pour foundation : 6.530 m.l.
- Micropiles : 16.100 m.l.
- Rivetage pour rock : 28.500 m.l.

TRAVAUX DE BATIMENTS

Concession pour la projection et l'exécution des travaux de construction d'un complexe hospitalier de 1100 lits en localité LIBRINO (CT). 1° Lot.

- Organisme Concessionnaire : UNITA' SANITARIA LOCALE N° 35
- Date du contrat : 08/05/1991  
: Rép. n° 234
- Montant net des travaux : Lit. 55.098.992.120=
- Quote-part (%) : 33,00

Les travaux ont été pris en adjudication entre les Entreprises CO.GE.FAR. IMPRESIT S.p.A. (Chef de file), CO.GE.I. S.p.A. et ITIN S.p.A.

Travaux en concession pour la construction du nouvel siège de la  
"Guardia di Finanza" en localité Fontanarossa (CT)

- MAITRE D'OUVRAGE : MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI,  
PROVVEDITORATO ALLE OO.PP.
- Montant du marché : Lit. 4.830.183.930=

Travaux de construction de la Caserne "LA MAGGIOLINA", destinée à la "IV Compagnia di Roma" du corp de la "Guardia di Finanza".

- MAITRE D'OUVRAGE : MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI,  
PROVVEDITORATO ALLE OO.PP.  
PERIL LAZIO, UFFICIO CONTRATTI
- Date du contrat : 28/03/1992
- Montant du marché : Lit. 16.000.000.000=

TRAVAUX DE RESTAURATION

-----



Travaux ayant pour but les travaux de maçonnerie des "Grandi Uffizi", faisant partie du Système des Musées Fiorentino .

- Organisme Concessionnaire : MINISTERO BENI CULTURALI E AMBIENTALI
- Date de démarrage : 17/05/1990
- Montant net des travaux : Lit. 20.000.000.000=
- Quote-part (%) : 11,00

Les travaux ont été pris en adjudication entre les Entreprises CO.GE.FAR. IMPRESIT S.p.A. (Chef de file), CO.GE.I. S.p.A. et ITIN S.p.A.

Réalisation des Ecoles en Viale Bicocca.

- MAITRE D'OUVRAGE : CTA 2 a r.l.
- Date de démarrage : 01/11/1993
- Montant du marché : Lit. 5.495.376.194=
- Date achèvement : 01/11/1995

TRAVAUX A L'ETRANGER

**PROCES-VERBAL**  
**DE RECEPTION PROVISOIRE DES TRAVAUX**

---

L'an mil neuf cent quatre-vingt onze, le deuxième jour du mois d'Avril, la Sous-Commission de Réception composée de :

Emmanuel SINZINKAYO	Directeur Technique de l'Exploitation des routes " PRESIDENT "
Félix NAHIMANA	Représentant de l'Inspection Générale des Finances " MEMBRE "
Daniel BEAUCOURT	Conseiller au Ministère du Plan " MEMBRE "
Prosper NYAWAKIRA	Conseiller à la Direction Générale des Marchés Publics " MEMBRE "

Le Directeur du Département des Affaires Juridiques et du Contentieux, était empêché.

a procédé à la réception provisoire des travaux de réhabilitation de la Route BUGARAMA-GITEGA, travaux exécutés par l'Entreprise Constructions Générales Italiennes (CO.GE.I) suivant lettre de commande n° 720/1024 du 23/11/1988.

Outre la Sous-Commission de Réception :

- Monsieur Yvon POSTIC : Conseiller de la Délégation CCE
- Monsieur Joseph NTAMAGIRO : Directeur-Adjoint Chargé du Contrôle
- Monsieur Gordien HAKIZIMANA : Conseiller à la Direction Générale des Routes

assistent à la réception des travaux .

- L'Entreprise est représentée par Monsieur Antonio FABRIANI
- Monsieur Janvier NGRENZIRA : Directeur Technique des Etudes et du Contrôle des Routes  
est présent en sa qualité de Fonctionnaire-Dirigeant.

- La Mission de Contrôle TRANSROUTE est représentée par Monsieur Michel TISSERONT.

Nom du Projet : Travaux de réhabilitation de la Route Nationale N° 2 entre BUGARAMA et GITEGA en République du BURUNDI, du Km. 13,600 au Km. 62,500

ASPECTS ADMINISTRATIFS ET FINANCIERS:

Maître de l'ouvrage : République du BURUNDI

Maître d'oeuvre : Direction Générale des Routes du Ministère des Travaux Publics et du Développement Urbain.

Financement : Communauté Economique Européenne

Contrôle des Travaux : Fonctionnaire-Dirigeant nommé par la Direction Générale des Routes

Par lettre de commande n° 720 du 23 Novembre 1988, le Ministère des Travaux Publics et du Développement Urbain confiait, après analyse des offres, l'exécution des travaux à l'Entreprise CO.GE.I SPA, en retenant sa soumission du 8 juin 1988.

Précisions de ce marché :

Financement : 6ème FED - Projet n° 6100.41.15.016

Marché n° 1024 : approuvé le 23 Novembre 1988  
notifié le 2 Février 1989

Attributaire : Entreprise COGEL - SPA


Délai contractuel initial : 12 mois à compter de 30 jours après réception de la lettre de commande (2.02.89 + 30 jours)

Départ du délai contractuel : 4 Mars 1989

Prix du Marché : unitaires, révisables

Montant initial du marché : 568.471.498 FBU

REPUBLIQUE DU BURUNDI

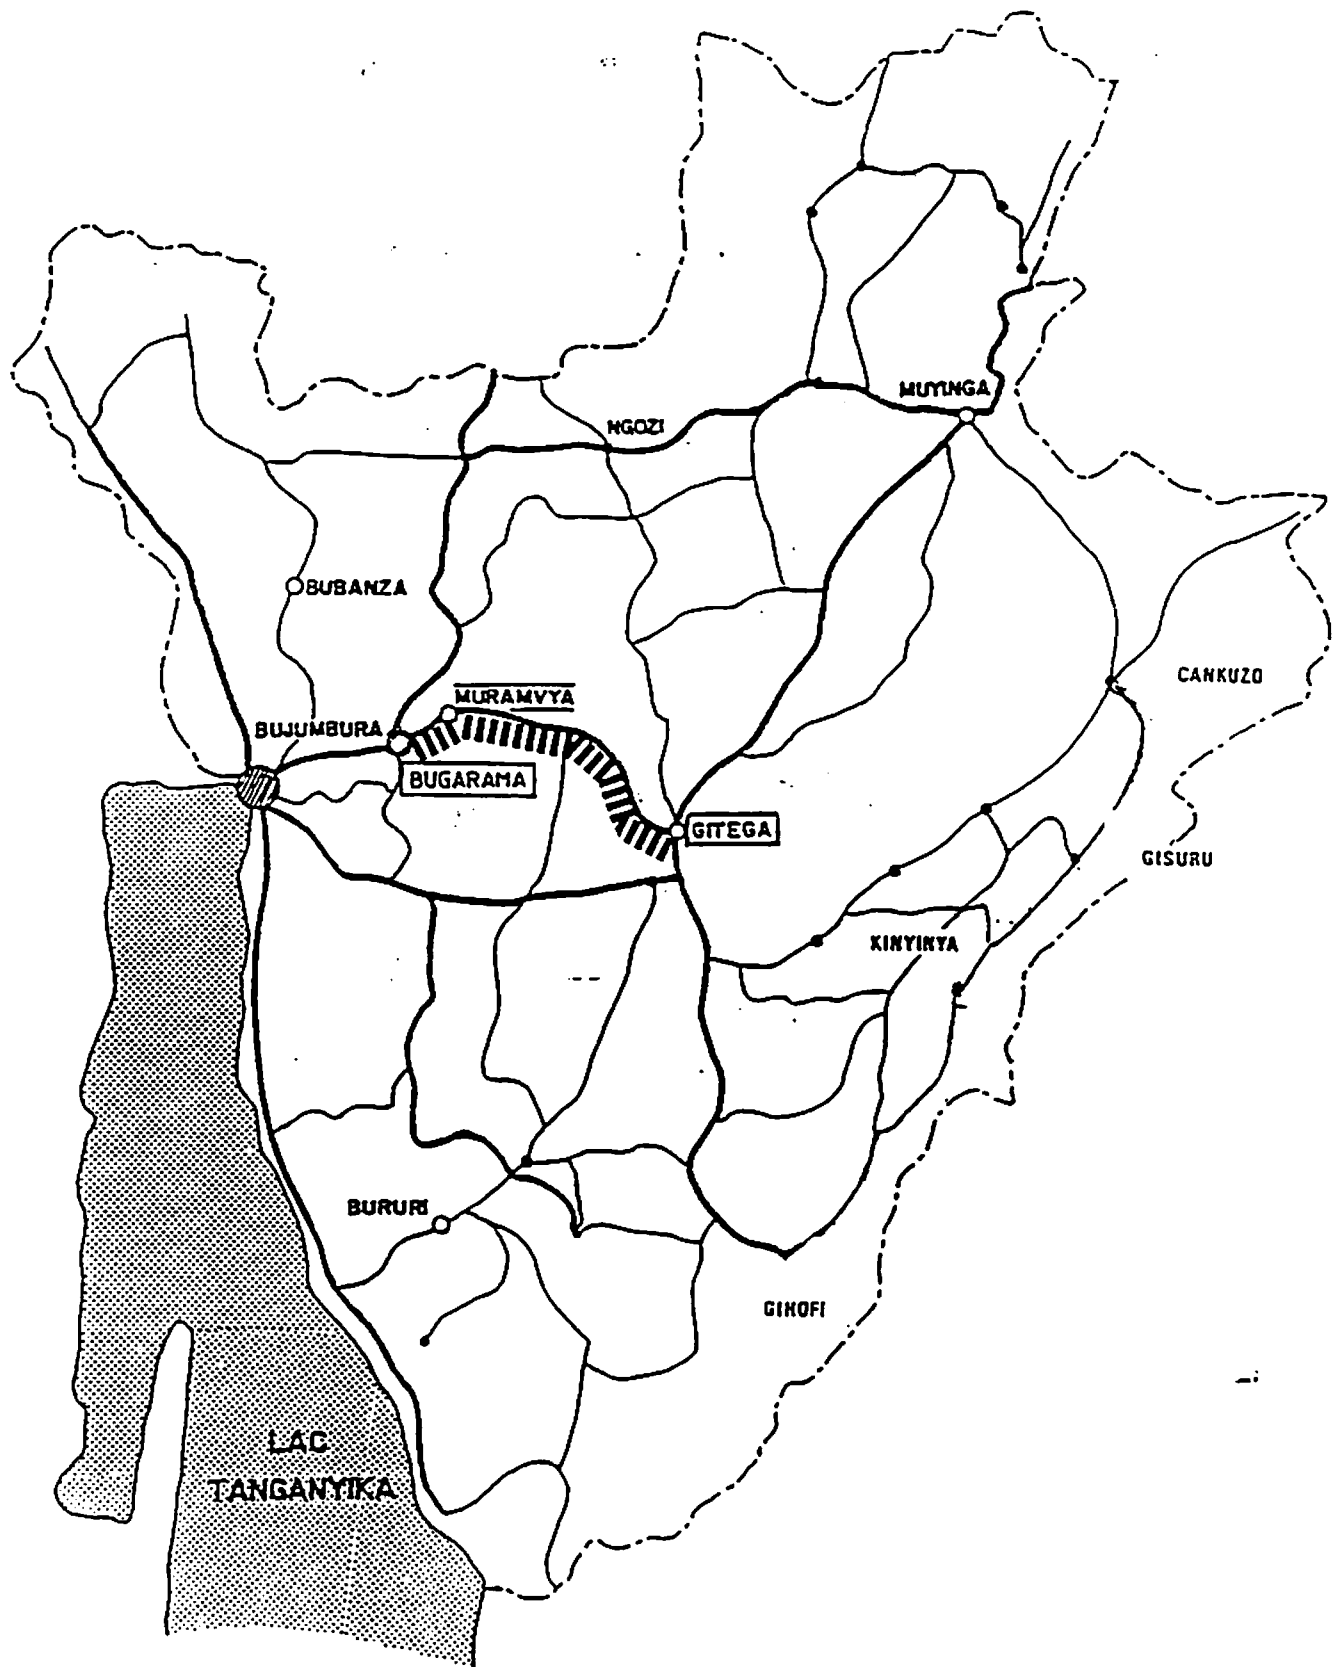

MARCHE DE TRAVAUX + AVENANT N° 1.

Financement 6° F.E.D : Projet n° 6100.41.15.016

Marché n° 1024 : notifié le 2 Février 1989

Attributaire : CO.GE.I SPA

Montant initial du Marché : 568.471.498 F.BU

Montant Avenant n° 1 : 283.270.850 F.BU

Montant Total du Contrat : 851.742.348 F.BU

Délai contractuel initial : 12 mois

Prolongation délais : 6,5 mois


Délais contractuels d'exécution : 18,5 mois

Départ délai contractuel : 4 Mars 1989


Fin délai contractuel : 19 Septembre 1990

# PROFILS EN TRAVERS TYPE


## A. POUTRES DE RIVES PK. 0-13 ALIGNEMENT.

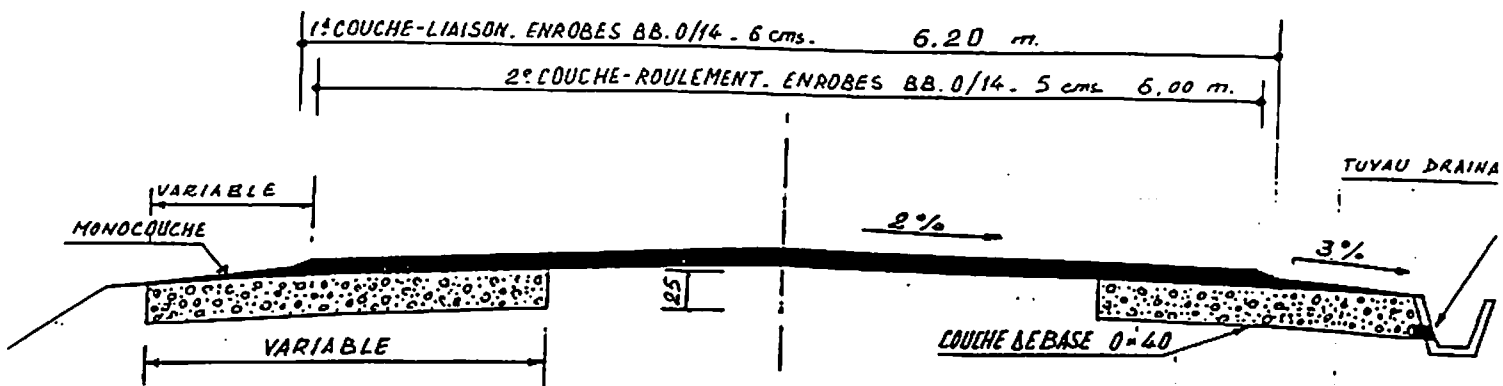

## B. POUTRES DE RIVES PK. 0-13 COURBE

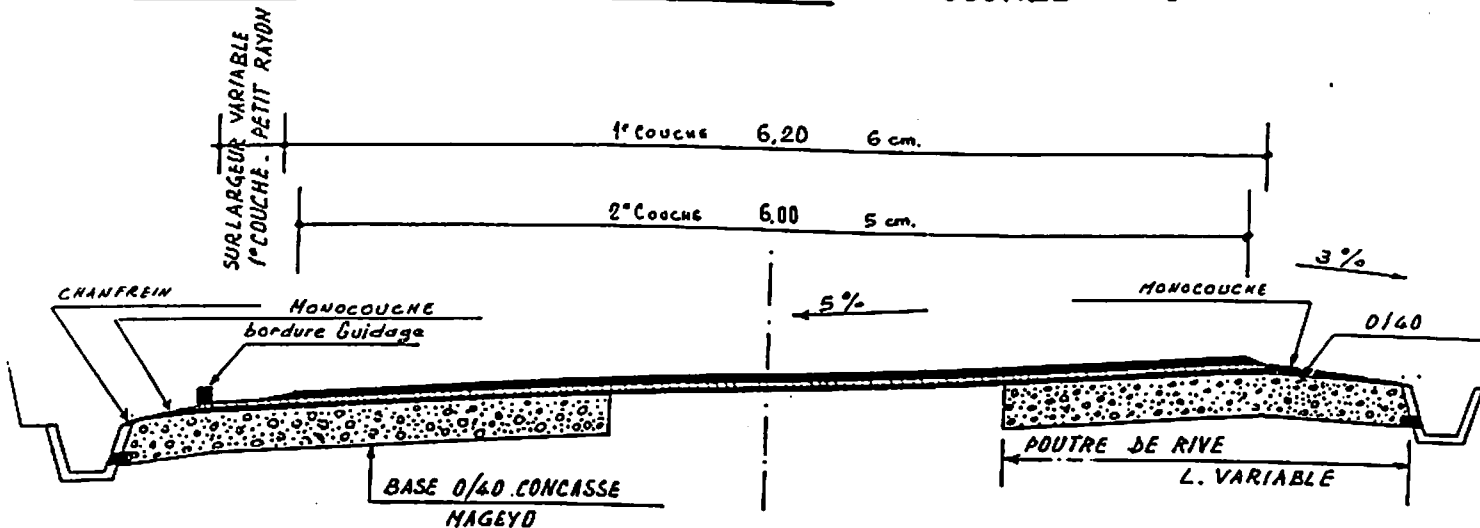

## C. RENFORCEMENTS PK. 14,6 - 65,7 PLUSIEURS CAS DE FIGURES.

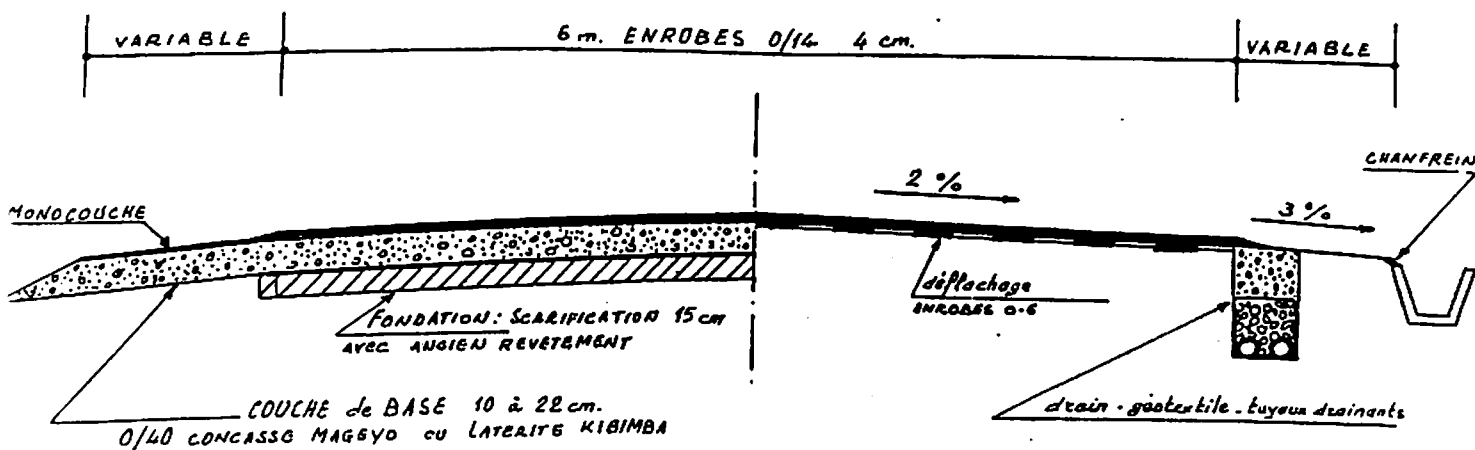



## CONSISTANCE DES TRAVAUX

Les travaux entrant dans le cadre du présent CPT comprenaient :

- le débroussaillage des abords
- le reprofilage des talus
- la purge des talus et le déblaiement des produits
- le remblaiement des érosions régressives dues à la présence de sources dans le talus aval et la route
- la réfection des nids de poules et des affaissements de rives dans les zones à renforcer avec purge
- le renforcement de la chaussée suivant les diverses techniques définies à l'article 1.4.B
- la reconstitution des accotements
- la mise en place de drains
- l'exécution d'un revêtement en béton bitumineux 0/14
- le curage des fossés
- la remise en état des ouvrages d'assainissement
- la mise en place de protection en enrochements ou en gabions
- l'installation d'équipements de sécurité.

.../...

## DESCRIPTION DES TRAVAUX

### A. TERRASSEMENTS :

Ils comprenaient :

- le débroussaillage, l'abattage, l'essouchage des arbres et des arbustes situés dans l'emprise de la route, et dont la présence gêne le drainage des eaux de ruissellement, en particulier au droit des ouvrages d'assainissement.
- le déblaiement des éboulements et le reprofilage des talus de déblais rendus instables par l'action érosive des eaux de ruissellement;
- le remblaiement des ravines existantes à la sortie des buses à l'aide d'enrochements et de matériaux de remblais;
- le remblaiement des deux ravines (érosions régressives sur le tronçon BUGARAMA-MURAMVYA), créées par des sources dans le talus aval de la route, à l'aide de gabions, enrochements et matériaux de remblais;
- le décaissement de parties de la chaussée existante avec le réglage du compactage du fond de forme (nids de poule, affaissements localisés....);
- le décaissement de bords de chaussée sur la section BUGARAMA MURAMVYA et de l'accotement par mise en place de poutres de rive de largeur variable en fonction des dégradations constatées, avec réglage et compactage du fond de forme.

.../...

B. CHAUSSEE :

Les travaux de chaussée comprennent principalement :

1) Sur la section BUGARAMA - MURAMVYA

- \* la réparation des zones détériorées (nids de poules, affaissements localisés, etc...) par décaissement et remplissage de grave concassée 0/40. L'étanchéité sera assurée par un enduit superficiel monocouche
- \* le renforcement des rives par mise en place d'un épaulement de rive de largeur variable de part et d'autre du bord de la chaussée actuelle, conformément aux plans types de l'étude de cette section
- \* le renforcement de la chaussée par deux couches de béton bitumineux 0/14, d'épaisseur totale de 11 à 12 cm
- \* la remise à niveau des accotements par apport de concassé 0/40 et le revêtement de ces accotements avec un enduit superficiel monocouche ou bicouche (dans les courbes déversées).

2) Section PK 13.600 - 18.000 et PK 33.000 - 65.200

(sauf zones ponctuelles PK 34.500 - 36.400 - 44.600 et 50.000)

- \* réfections localisées des nids de poules et affaissements, par décaissement et remplissage de grave 0/40. L'étanchéité sera assurée par un enduit superficiel
- \* exécution d'un tapis en béton bitumineux de 4 cm d'épaisseur après déflachage éventuel
- \* réfection des accotements avec arasement éventuel ou remise à niveau avec matériaux graveleux latéritiques.

3) Section PK 18.000 - 33.000  
-----

- \* la scarification de la chaussée existante sur 15 cm de profondeur et remise en forme
- \* le rechargement de 15, 17 ou 20 cm de grave concassée 0/40 suivant des tronçons homogènes à définir par le Fonctionnaire-Dirigeant
- \* l'exécution d'une couche d'imprégnation
- \* la mise en place d'un revêtement en béton bitumineux 0/14 sur 4 cm d'épaisseur
- \* la remise à niveau des accotements avec grave 0/40 étanchée par imprégnation sablée.

4) Zones ponctuelles PK.34.500 - 36.400 - 44.600 - 50.000  
-----

Les zones précisées ci-dessus devraient faire l'objet d'études ponctuelles qui dégageraient la solution à retenir pour le renforcement :

- . soit analogue à la section PK 18.000 - 33.000
- . soit analogue à la section PK 13.600 - 18.000 avec surépaisseur de béton bitumineux.

## C. DIVERS

-----

Les travaux étant exécutés sous circulation, les travaux dont l'exécution dépasserait 2 heures devraient impérativement être exécutés par demi-chaussée, afin de laisser libre une voie de circulation. Les divers chantiers, pour les mêmes raisons, seront limités en longueur à 500 m.

L'Entrepreneur pourrait dans les zones où la possibilité existait, créer une déviation afin de lui permettre de travailler "pleine largeur". Dans ce cas, cette déviation devrait être créée et devrait être entretenue à ses frais pour permettre une vitesse maximum de 30 Km/h.

La signalisation du chantier devra être visible de jour comme de nuit et devra être entretenue avec soin par l'Entrepreneur, étant donné la sinuosité de la route, et les conditions atmosphériques défavorables surtout entre BUGARAMA et MURAMVYA.

:0.01:Instal.chantier	:F	:	1,00
:0.02:Repli chantier	:F	:	1,00
:1.01:Débroussaillage	:M <sup>2</sup>	:	24.000,00
:1.02:Dèblais	:M3	:	3.558,09
:1.03:Talutage	:M2	:	83.980,00
:1.04:Arasement Accot.	:M <sup>2</sup>	:	52.478,55
:1.05:Recharg. Accot.	:M3	:	41,63
:1.06:Scarification	:M <sup>2</sup>	:	53.039,00
:1.07:Décais.pte larg.	:M3	:	5.461,61
:1.08:Décaiss.pl.larg.	:M3	:	21.285,00
:1.09:Rempl.emprunt	:M3	:	132,50
:1.10:Finit.Plateforme	:M <sup>2</sup>	:	16.687,00
:1.12:Transp.matériaux	:M3xKM:	:	74.415,99
:1.14:Engazonnement	:M <sup>2</sup>	:	12.696,00
:1.15:Remblais ravines	:M3	:	24.399,02
:1.16:Déforest.Dessouch.	:M <sup>2</sup>	:	1.320,00
:1.17:Stabilisat.décasse:	M3	:	718,75
1.18:Dragages - forfait:	F	:	1,00
:2.01:Fondation S>75 M2	:M3	:	9.037,00
:2.02:Fondation S<75 M2	:M3	:	23,25
:2.04:0/40 S>75M2	:M3	:	29.724,28
:2.05:0/40 S<75M2	:M3	:	229,40
:2.06:Transport latérite:	M3 Km:	:	18.025,00
:2.07:Imprégnation	:T	:	223,74
:2.08:Liant enduit	:T	:	185,46
:2.09:Gravillons 12,5/18:	M3	:	0
:2.10:Gravil.8/12.5	:M3	:	844,12
:2.11:Transp. concassés	:M3xKM:	:	956.514,00
:2.16:Latér.S>75M2	:M3	:	2.265,00
:2.17:Latér.S<75M2	:M3	:	656,21
:2.18:0/40 Kibimba	:M3	:	10.528,55
:3.01:Curage fossés	:M1	:	100.535,00
:3.02:Ouverture fossés	:M1	:	225,00
:3.03:Drains	:M1	:	5.409,50
:3.04:Réf.fossés hét.	:M1	:	3.785,00
:3.05:Fossés hét.Neufs	:M1	:	9.535,50
:3.06:Filet d'eau	:M1	:	892,50
:3.07:Curage buses	:U	:	248,00
:3.08:Fouilles ouvrages	:M3	:	1.741,00
:3.09:Fouilles rocheuses:	M3	:	369,40
:3.10:Buse métallique	:M1	:	29,50
:3.11:Rembl.Ouvrage	:M3	:	0,00
:3.12:Maçonnerie	:M3	:	346,58
:3.13:Béton propreté B1	:M3	:	12,75
:3.14:Béton fond.B2	:M3	:	0,00
:3.15:Béton 250 Kg B3	:M3	:	1.182,80
:3.16:Béton 350 Kg B4	:M3	:	214,77
:3.17:Béton 400Kg. B5	:M3	:	0,00
:3.18:Arm. Ac. doux	:Kg	:	200,23
:3.19:Armatures H.A.	:Kg	:	4.369,00
:3.20:Enduit 2c. 600Kg	:M2	:	0,00
:3.21:Enrochements	:M3	:	1.090,00
:3.22:Gabions	:M3	:	4,00
:3.23:Dèp.rep.elem.pref.:	M1	:	7.191,20
:3.24:Confort.remblais	:M3	:	395,61
:3.25:Tuyaux drainants	:M1	:	1.943,10
:4.01:Panneaux Signal.	:U	:	35,00
:4.02:Balises	:U	:	77,00
:4.03:Peinture réfléchis:	M <sup>2</sup>	:	8.528,00
:4.04:Glissière sécurité:	M1	:	0
:4.05:Bord. de guidage	:U	:	2.657,00
:7.05:B.B 0/14<36000T	:T	:	36.000,00
:7.06:B.B.0/14>36000T	:T	:	27.835,50

2° Il faut signaler que le marché a connu des travaux supplémentaires notamment l'exécution de l'ouvrage perrové de la zone submersible de RURENDA, la pose des dalles de passage sur caniveaux, le revêtement de Muramvya, les grilles sur avaloirs et l'assainissement de GATABO.

La visite des travaux a donné lieu aux observations ci-après :

- 1.150 - D : érosion de l'accotement  
eau stagnante sur accotement : flaches à éliminer.  
reprise de l'accotement afin d'évacuer les eaux.
- 1.800 - D : consolider par enrochements la sortie des  
caniveaux divergents.
- 7.300 - D : bétonner les remblais du caniveau.  
prolonger de 5 m] le caniveau divergent.
- 8.700 - D : mur de soutènement maçonné à exécuter en  
confortement du talus de déblai (1 m de hauteur  
sur semelle bétonnée: 5 m de long).
- 0.100-13.100 : quelques carottages restant à colmater
- 13.100-14.600 : Grilles sur 17 avaloirs à exécuter (travaux  
supplémentaires).
- 23.000 : observation de l'accotement fissuré :  
accotement stabilisé mais à maintenir sous-  
surveillance.
- 26.300 D : assainissement de Gatabo à terminer rapidement  
(travaux supplémentaires)
- monocouche sur accotement à exécuter entre  
les 2 O.H.
- G : monocouche à exécuter sur 2 m de largeur, entre  
caniveaux et chemin de MBEYE.

- 32.000 - 44.000 D : bornes kilométriques à redresser
- 33.000 - 58.000 : fissures du revêtement à colmater par reprises en profondeur -
- 37.000 à 38.000 : ressuage sur l'axe : sabler en 0/3 aux heures chaudes et compacter au pneu.
- 37.500 G : 5 ml de caniveaux à réparer.
- 41.200 D : carrefour de Kibimba : dalles à changer (augmenter l'épaisseur : 18 cm, dosage à 350 Kgs de ciment à vérifier; ferrailage  $\phi$  12 H.A à mailler 12 x 12 cm double nappe)
- 60.000 : carrefour AMSTEL, évacuation des eaux de la route de la Brasserie dans les caniveaux.
- 64.600- 64.800 D : caniveaux à déboucher - vérifier la pente et l'évacuation des eaux.
- 63.000 au 65.000 : carrefours Ecole des TP, Palais Présidentiel et Cour d'Appel à revêtir en monocouche.
- 65.700 D : joindre les caniveaux en Amont et en Aval de la barrière, avec passage dallé de 6 ml.
- G : joindre les caniveaux Amont et Aval, devant l'Eglise, avec passage dallé de 10 ml.

**Autres Remarques :**

-----

Signalisation verticale.  
 les panneaux doivent être soudés sur les colliers de fixation, eux mêmes soudés sur les poteaux.

Caniveaux bétonnés.  
 les caniveaux doivent être débarrassés de toute végétation les cavités provoquées par l'arrachement de cette végétation, comblées au mortier.

Outre ces réserves formulées par la Sous- Commission, qui devront être levées sous quinze jours au plus tard, l'Entreprise s'engage à corriger tous les désordres et dommages qui apparaîtraient ultérieurement, avant la réception définitive.



Enfin, la Sous-Commission jugeant que les travaux ont été généralement bien exécutés, prononce la réception provisoire desdits travaux au jour, mois et an que dessus.

LES MEMBRES

- Félix NAHIMANA

- Daniel BEAUCOURT

- Prosper NYAWAKIHA

LE FONCTIONNAIRE-DIRIGEANT

- Janvier NGURINZIRA

LA MISSION DE CONTROLE

- Michel TISSERONT


L'ENTREPRISE


- Antonio FABRIANI

LE PRESIDENT


Emmanuel SINZIKAYO

PURGES et POUTRES de RIVES ( 25cm en 0/40 )

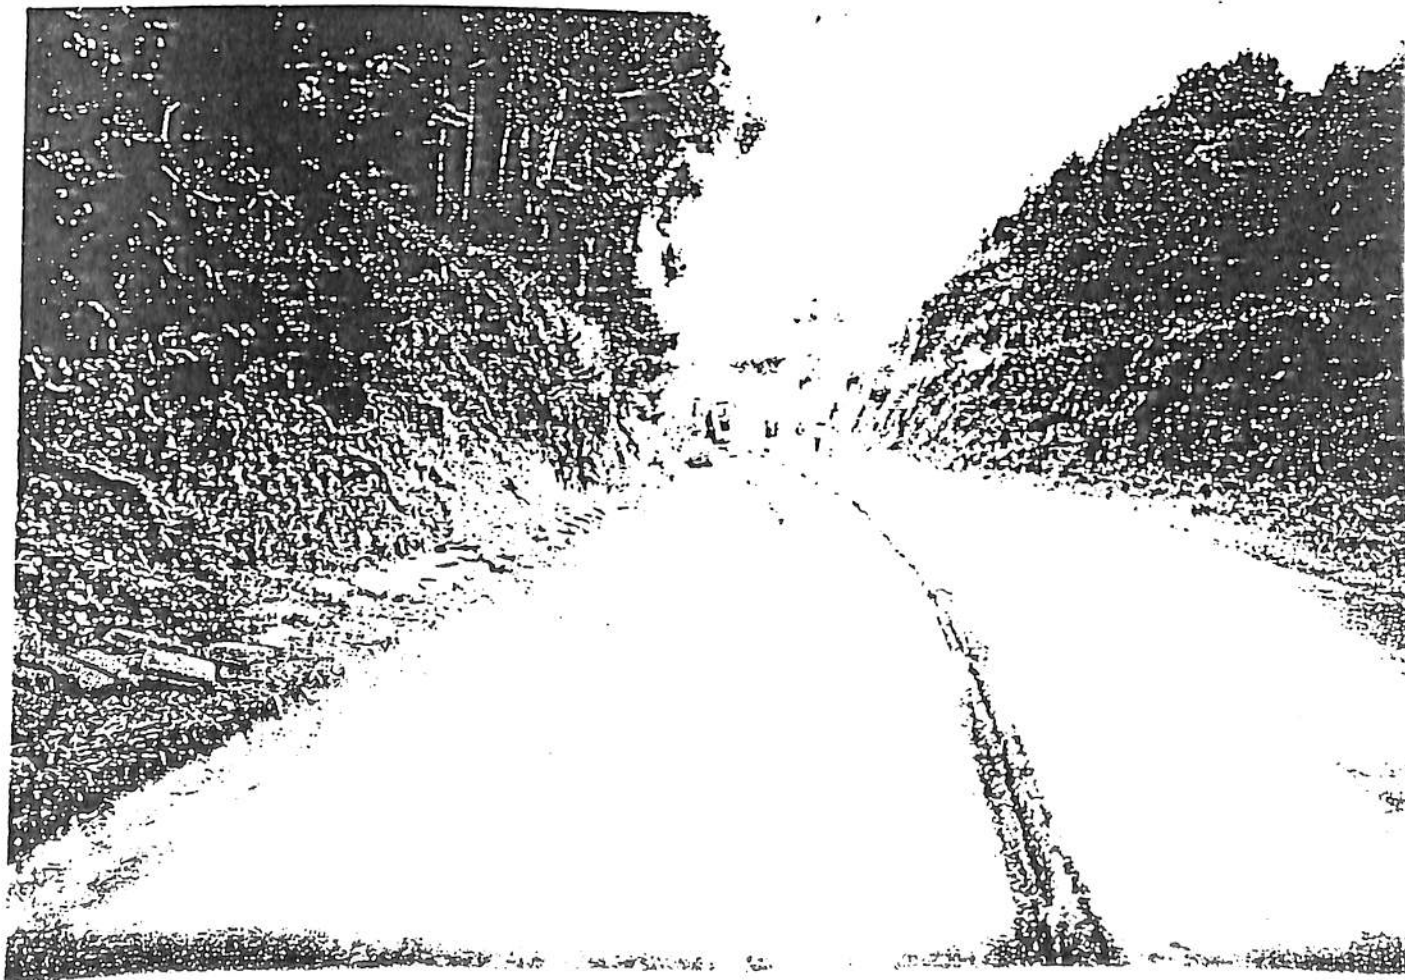

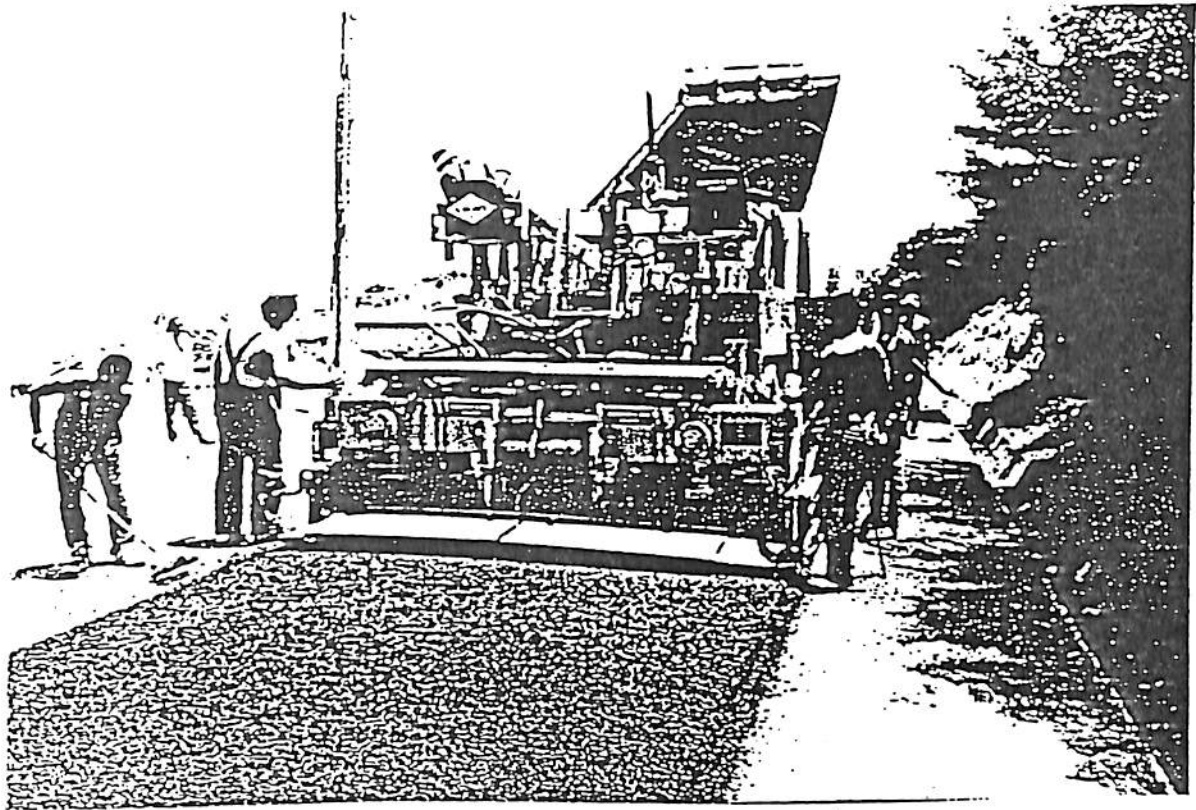


Enrobés 0/14 - 4cm- PK. 16 + 500 - 17 + 000  
Début du revêtement




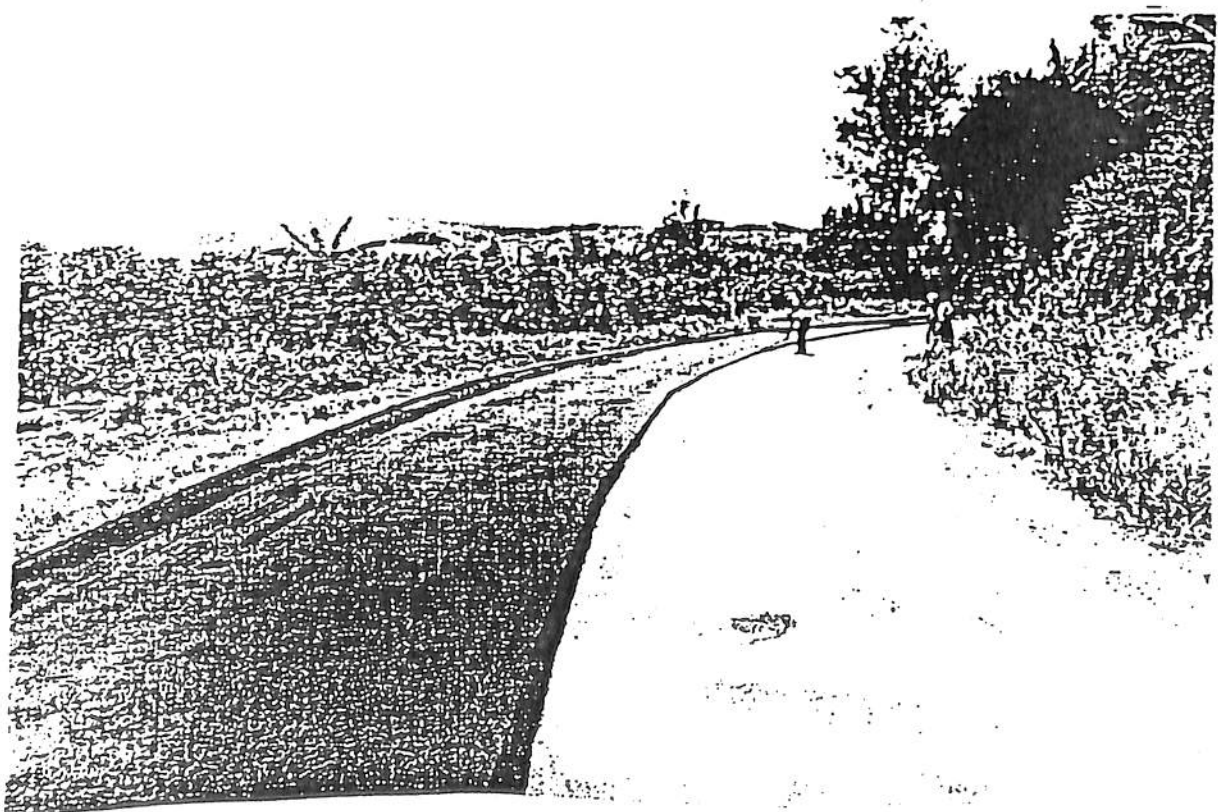




4cm d'enrobés 0/14 posé sur un ancien revêtement très fissuré

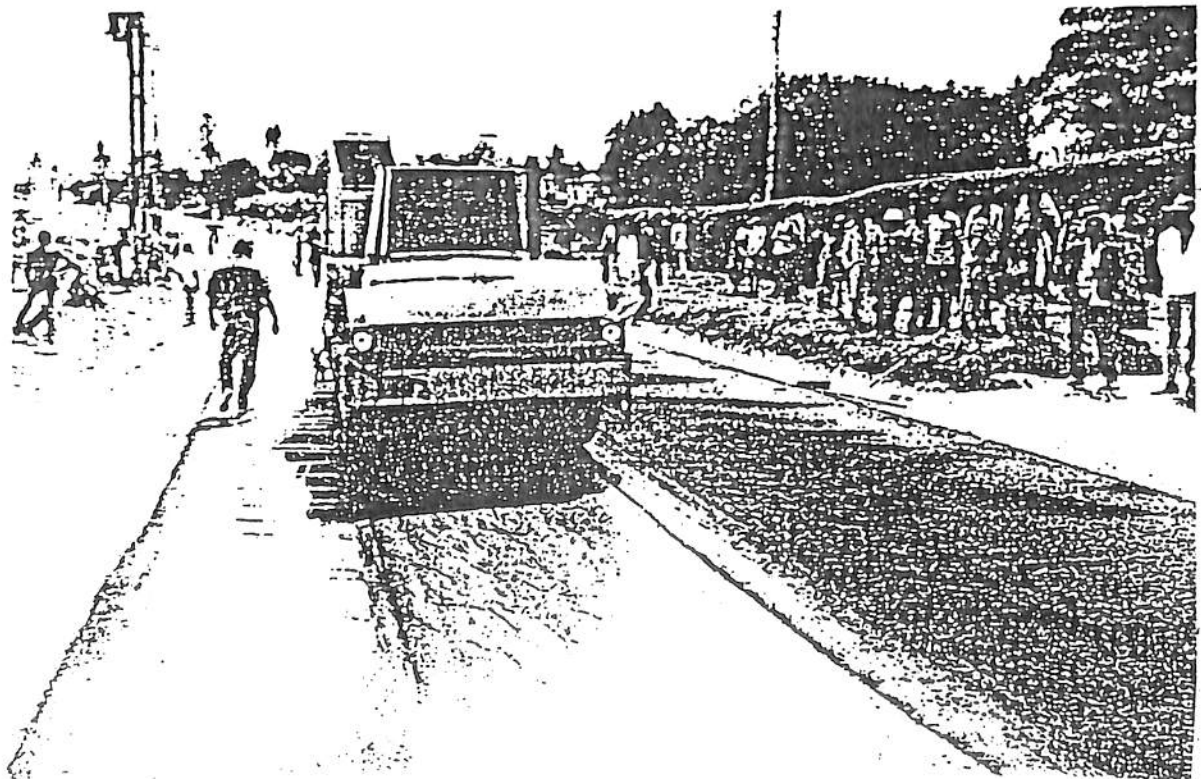



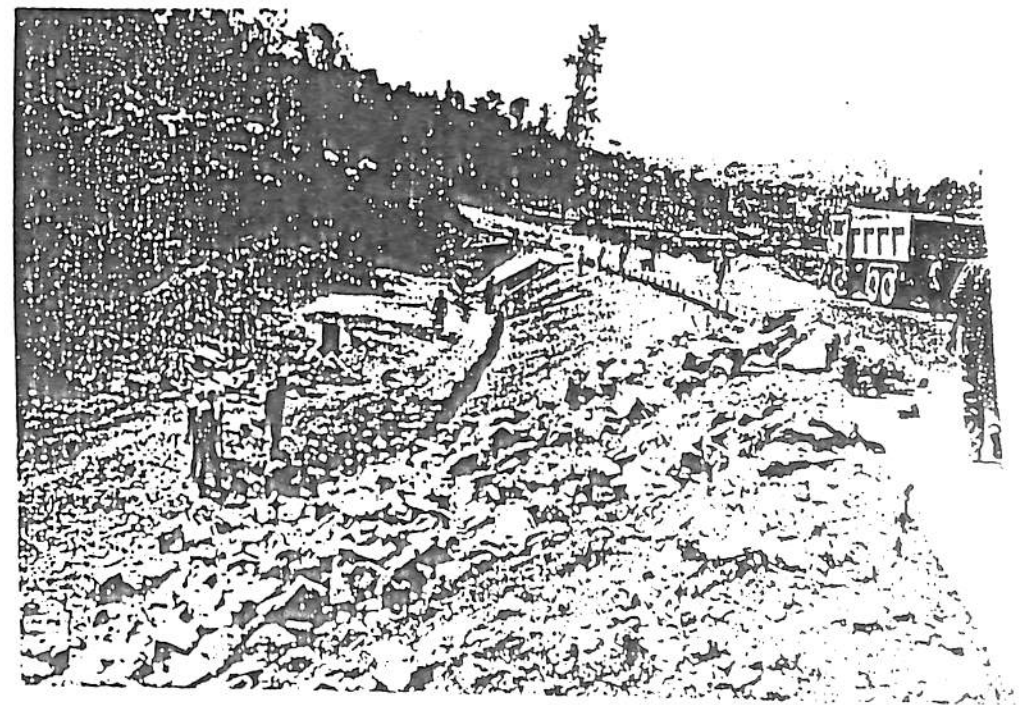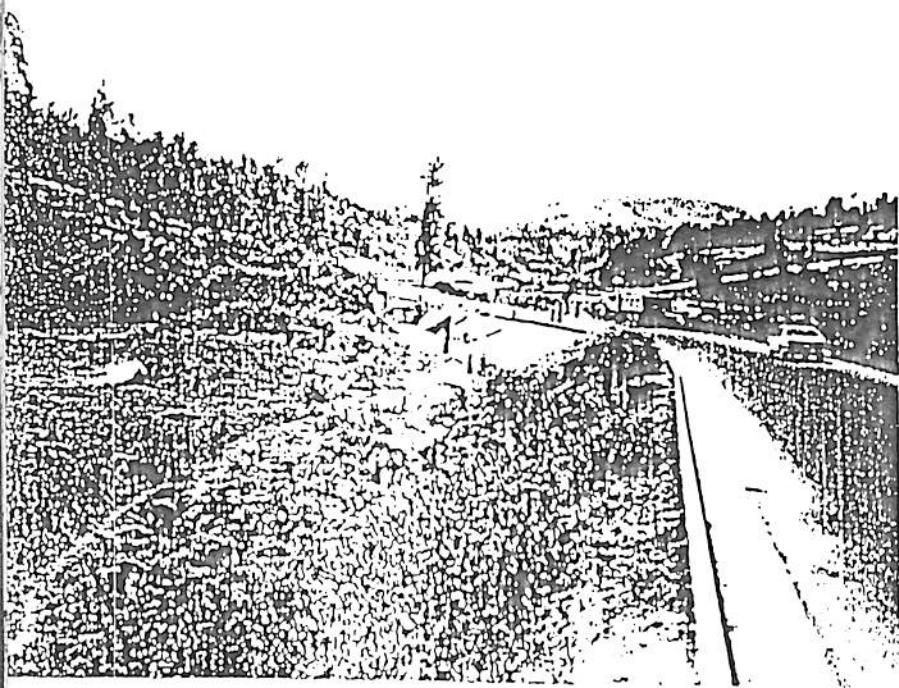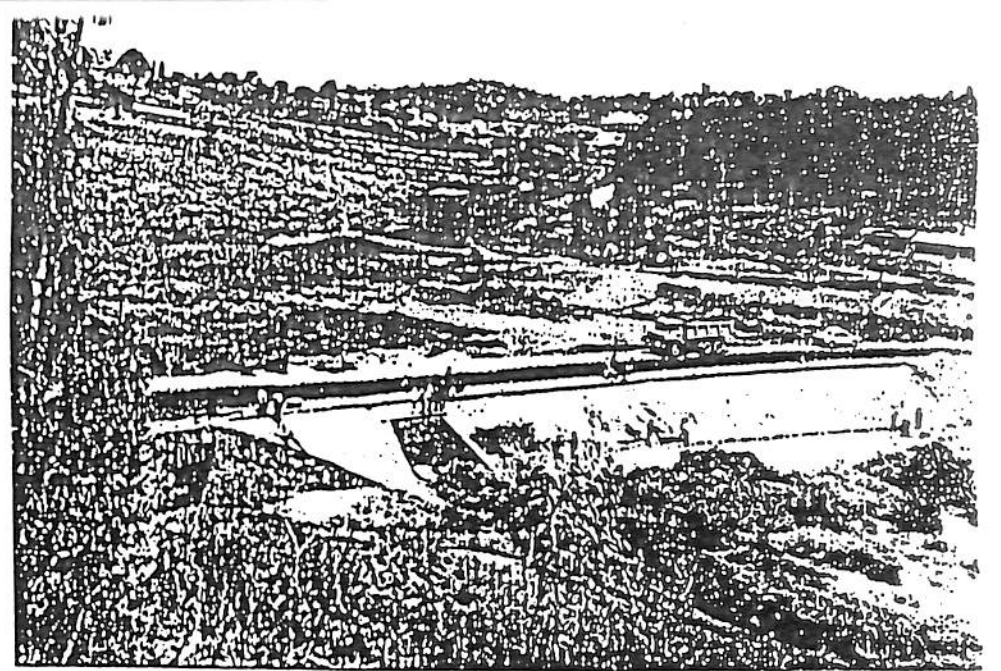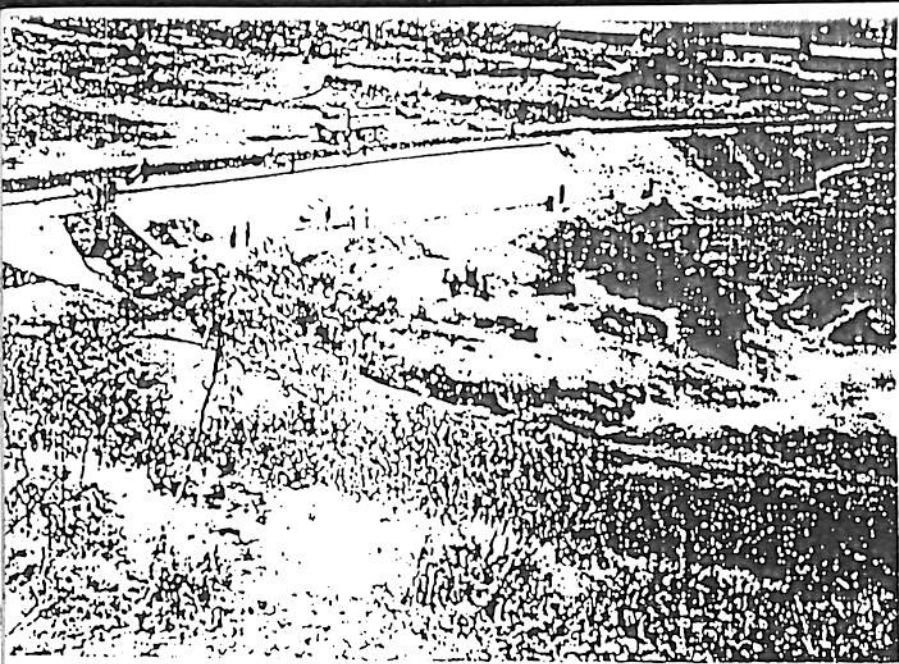

AUTOROUTE NATIONALE N° 32  
Tronçon CHAINAT-UTHAI THANI  
THAILANDE

Ce contrat a été adjudgé à CO.GE.I. S.p.A. en Joint Venture paritaire avec UCON Ltd. de Bangkok par suite de l'appel d'offre de le Departement des Autoroutes au Ministère des Travaux et des Communnications.

Le contrat fait part d'une série de 6 (six) qui correspondent aux 6 (six) tranches de travaux formant 182,7 Km du premier tronçon de la route N° 32 allant de la zone de Bangkok à la zone nord-est du Pays.

Le programme (ADB - Projet du 2iemme Tronçon Routier) prévoit le doublement de la route existante, laquelle non suffit plus au volume de trafic qui accroît constamment d'aillens en ce période de grand developpement nationale.

Le travail consiste en la construction d'une route a deux voies plus une voie de secours que soit parfaitement paralléle à la route existant. Le tout sera construit en remblai fait essentiellement de sable riviére et le problème principal vient du fait que le tracé déronle entièrement entre des rizières.

La structure du pavage est fait d'une couche de melange naturelle et de tout-venant avec une épaisseur de 20 cm., une couche de pavage rigide avec une épaisseur de 25- cm. et une couche d'asphalte avec une épaisseur de 6 cm.

Une fois que ces travaux sont terminés, l'on procédera à l'aménagement de tout le pavage de la route existante en

employant les mêmes standard qu'en la construction de la route nouvelle. Les travaux comportent 11 ponts parvui lesquels un viaduct long 300 ml.

#### DONNES GENERALES

- Client et Direction des travaux : Departement des Autoroutes
- Financement : Asian Developpement Bank
- Date lettre d'adjudication : 14 Novembre 1990
- Date signature du contrat : 17 Décembre 1990
- Ordre de Pousuites : 17 Février 1991
- Valeur du contrat : 582.832.490 Baht
- Quote-Part CO.GE.I.(%) : 50.00

#### CARATTERISTIQUES TECHNIQUES

- Longueur du tronçon : 31,30 Km
- Remblai : 1.250.000 m3
- Melange naturelle : 173.000 m3
- Tout-venant : 80.000 m3
- Couche en béton : 475.000 m3
- Conglomérat bitumineux : 14.075 m3
- Longueur totale des pontes : 679 ml

/

**TRAVAUX D'AMENAGEMENT HYDROAGRICOLE**  
**DES UNITES NATURELLES M03/N'DIOUM ET D01/AERE-LAO**

**REPUBLIQUE DU SENEGAL**

Ce contrat a été adjudgé à CO.GE.I. S.p.A., par suite de l'Appel d'Offres International lancée par le Ministère du Développement Rural du Sénégal et soumis à la date du 26.09.1988.

Les travaux d'aménagement des deux périmètres ont pour but de réaliser les équipements collectifs nécessaires à l'irrigation, au drainage et à la protection des 1.784 ha.

Les deux périmètres à aménager sont situés dans le département de PODOR au Sénégal, l'un (D01) sur la rive gauche du Doué, un défluent du fleuve Sénégal, l'autre (M03) sur l'Ile à MORFIL

Ils sont accessibles par la Route Nationale N° 2, et se trouvent respectivement pour D01 et M03 à 260 Km. et 219 Km. à l'Est de SAINT-LOUIS et à 87 Km. et 45 Km. à l'Est de PODOR.

Les surfaces nettes à équiper sont de 1.205 ha. et 623 ha. environ et les travaux sont répartis dans deux Unités naturelles d'Equipement de 6.400 ha. et 1.400 ha. environ.

Les périmètres seront organisés en Unités Autonomes d'Irrigation.

Les surfaces aménagés se subdivisent en deux grandes classes, en fonction de leur vocation agricole: la riziculture et la polyculture.

Dans le même contrat, seront encore réalisés: les pistes d'accès aux ouvrages, le planage et les diguettes des parcelles, la réalisation des réseaux de canaux, drains et pistes



tertiaires à l'intérieur même de chaque "Unité Autonome d'Irrigation" (U.A.I.).

**DONNES GENERALES:**

- Maître d'Oeuvre et de l'ouvrage : (S.A.E.D.) - Société Nationale d'Aménagement et d'Exploitation des terres du delta du fleuve Sénégal et des Vallées du fleuve Sénégal et de la Falémé.  
MINISTERE DU DEVELOPPE RURAL
- Lettre de Notification d'adjudication : 19 décembre 1989
- Financement : F.E.D. - Found Européen Développement
- Date de démarrage : 28 mai 1990
- Délai contractuel : 21 mois
- Montant du contract : Lot. 1 (M=3/NDIOUM)  
2.099.541.681 F.cfa  
Lot. 2 (D01/AERE-LAO)  
3.146.463.667 F.Cfa.
- Total : 5.246.005.348 F.Cfa.

**DONNES TECHNIQUES;**

- 1.750.000 m<sup>3</sup> de remblais compactés pour 41,3 Km. de canaux, 33,7 Km. de digues et 61,5 Km. de pistes.

- 175.000 m3 de déblais pour drains.
- 3000 m3 de béton armé pour la station de pompage principale et 2500 m3 pour les ouvrages du réseau principal.
- fourniture et installation de 12 vannes automatiques et 94 modules.
- 5.247 m3 pour revêtement du réseau principal d'irrigation.
- transport, mise en place et compactage de 64.000 m3 de latérite sur les talus des digues et 28.000 autres m3 sur les pistes revêtues.
- réalisation des réseaux tertiaires pour 1820 ha. nets environ, planage de 1480 ha. en bassins rizicoles et de 340 ha environ en touches de piano pour la polyculture.
- treize pompes électriques submersibles équipant les 4 stations de pompage.

## OBJET DU MARCHE

### U.N.E. DG1 "AERE LAU"

#### SOUS-LOT 2.1:

- terrassements:  
-780.000 m3 de remblais compactes pour les canaux, digues et pistes;  
-146.000 m3 de déblais pour drains;  
-transport, mise en place et compactage de 55.000 m3 de laterite sur les talus et crêtes des digues, canaux et sur les pistes revêtues;  
-réalisation des réseaux tertiaires pour 370 ha environ (planage de 294 ha de rizières et de 76 ha pour les parcelles destinées à la polyculture);

- Genie-civil:  
-700 m3 de béton armé pour la station de pompage n°1 et 740 m3 pour les ouvrages du réseau principal, y compris l'installation de leur matériel hydro mécanique (vannes, modules, etc...);  
-11.500 m2 de revêtement en béton des canaux du réseau principal d'irrigation;  
-les ouvrages des réseaux tertiaires;

#### SOUS-LOT 2.2:

- terrassements:  
-210.000 m3 de remblais compactés pour les canaux et pistes;  
-96.000 m3 de déblais pour drains;  
-transport, mise en place et compactage de 24.000 m3 de laterite sur les talus et crêtes des canaux et sur les pistes revêtues;  
-réalisation des réseaux tertiaires pour 834 ha environ (planage de 683 ha de rizières et de 151 ha de parcelles destinées à la polyculture);

- génie-civil:  
-1200 m3 de béton armé pour la station de pompage n°2 et 920 m3 pour les ouvrages du réseau principal, y compris l'installation de leur matériel hydromécanique;  
-43.000 m3 de revêtement en béton des canaux du réseau principal d'irrigation;  
-les ouvrages des réseaux tertiaires;

## OBJET DU MARCHE

### U.N.E. MO3 "NDIOUM"

#### PHASE 1:

##### terrassements:

- 800.000 m<sup>3</sup> de remblais compactes pour les canaux, digues et pistes;
- 44.000 m<sup>3</sup> de déblais pour drains;
- transport, mise en place et compactage de 47.000 m<sup>3</sup> de laterite sur les talus et crêtes des digues, canaux et sur les pistes revetues;
- realisation des réseaux tertiaires pour 260 ha environ (planage de 195 ha de rizieres et de 65 ha pour les parcelles destinees à la polyculture);

##### Genie-civil:

- 400 m<sup>3</sup> de beton armé pour la station de pompage n°1 et 370 m<sup>3</sup> pour les ouvrages du réseau principal, y compris l'installation de leur materiel hydro mecanique (vannes, modules, etc...);
- 6900 m<sup>2</sup> de revêtement en béton des canaux du réseau principal d'irrigation;
- les ouvrages des reseaux tertiaires;



#### PHASE 2:




##### terrassements:

- 180.000 m<sup>3</sup> de remblais compactes pour les canaux et pistes;
- 58.000 m<sup>3</sup> de déblais pour drains;
- transport, mise en place et compactage de 14.000 m<sup>3</sup> de laterite sur les talus et crêtes des canaux et sur les pistes revetues;
- realisation des réseaux tertiaires pour 428 ha environ (planage de 254 ha de rizieres et de 112 ha de parcelles destinees à la polyculture);

##### genie-civil:

- 760 m<sup>3</sup> de beton arme pour la station de pompage n°2 et 650 m<sup>3</sup> pour les ouvrages du reseau principal, y compris l'installation de leur materiel hydromecanique;
- 4500 m<sup>3</sup> de revêtement en béton des canaux du reseau principal d'irrigation;
- les ouvrages des reseaux tertliaires;

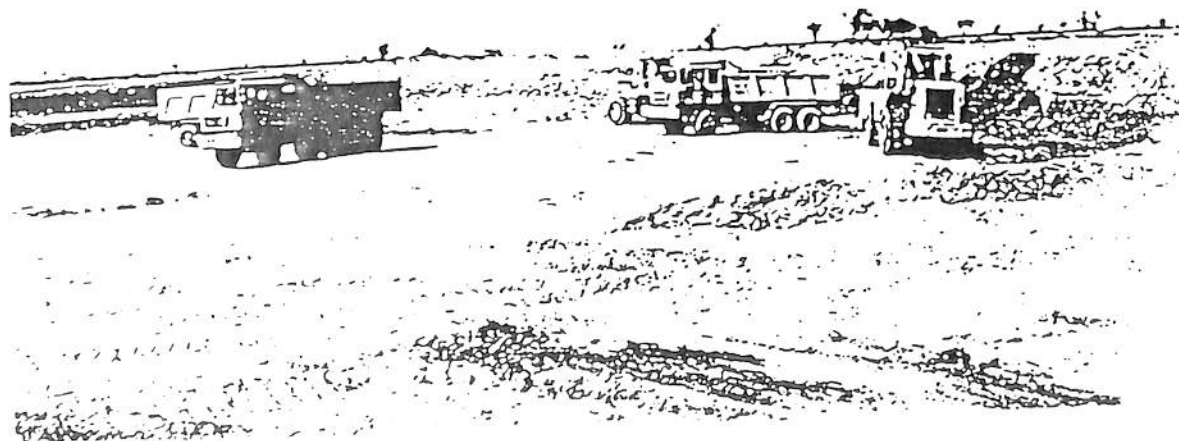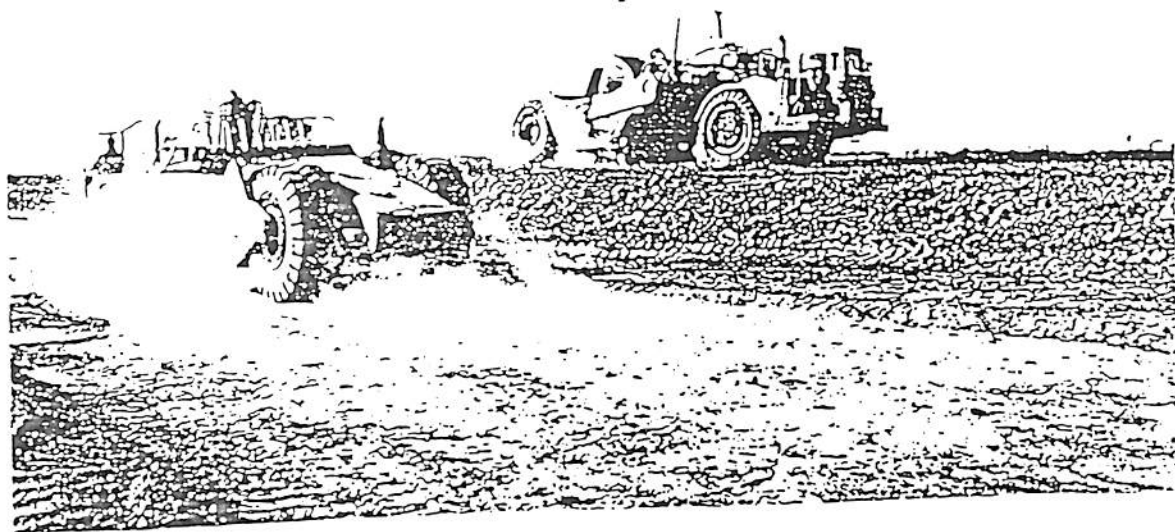

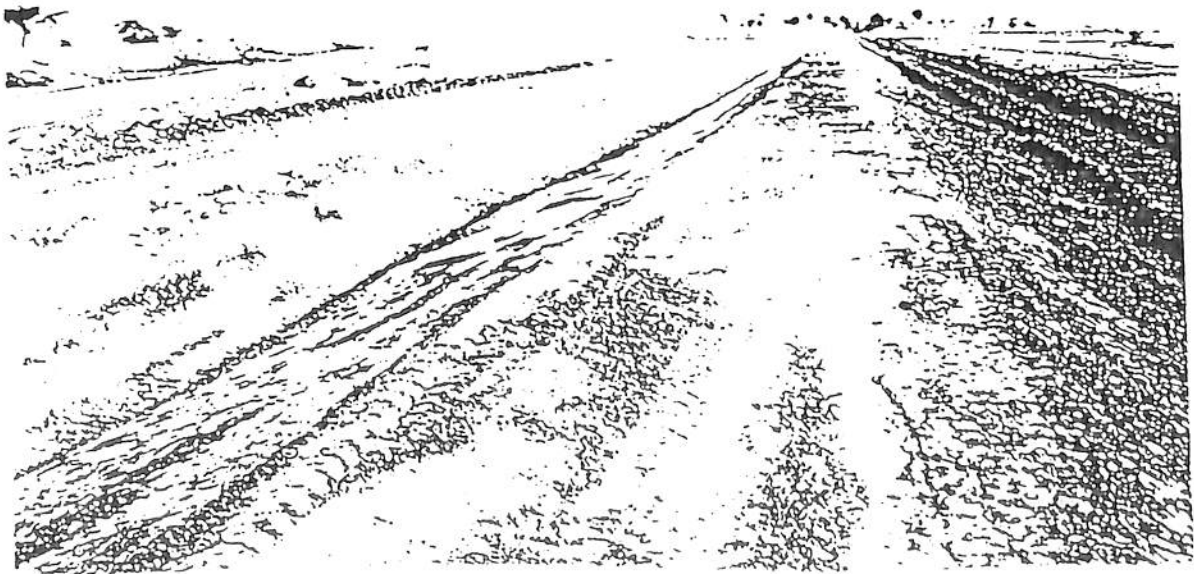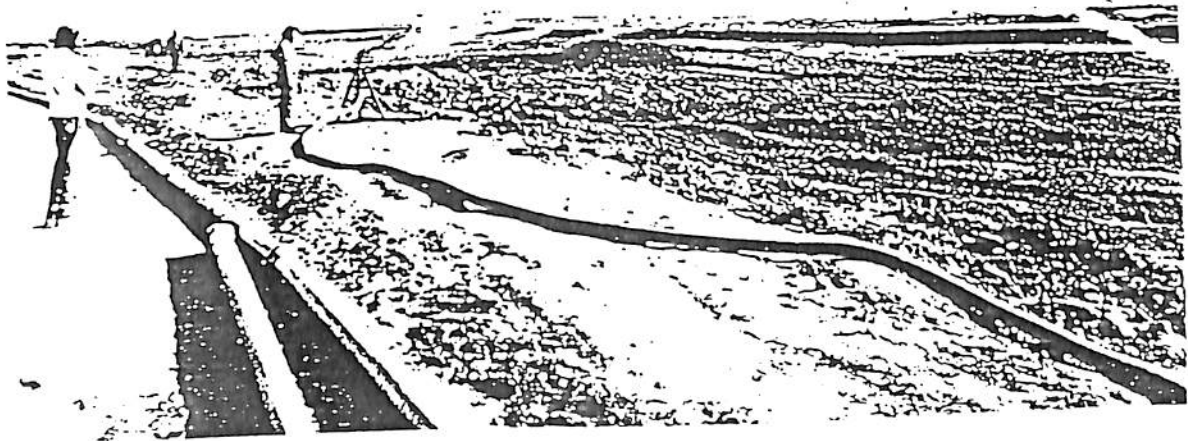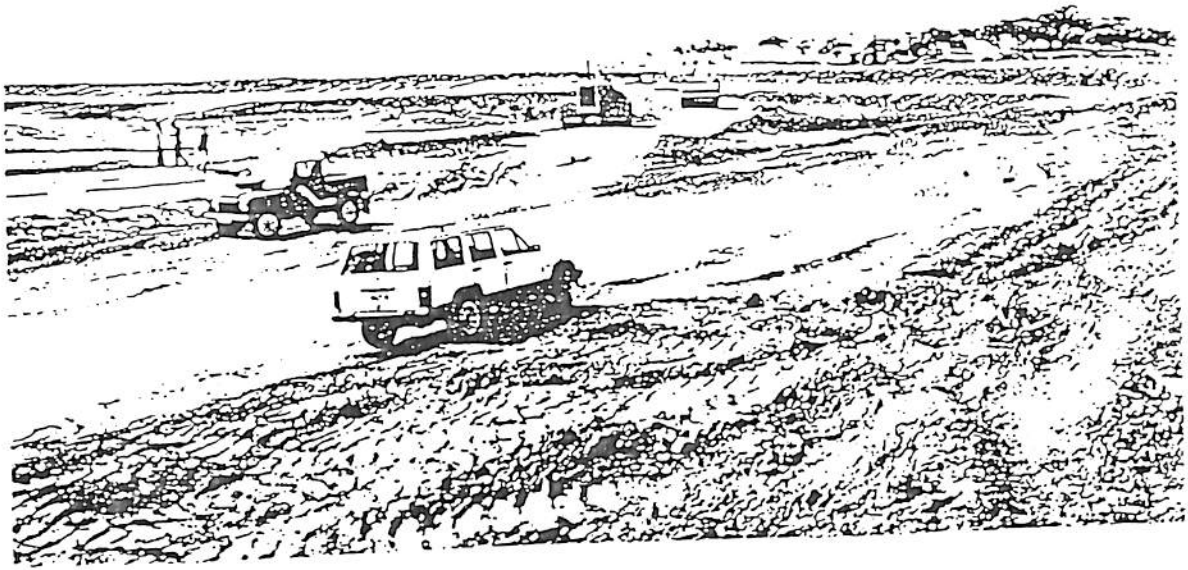

## CENTRALE ELECTRIQUE DE "DELIMARA"

### MALTA

En Janvier 1990 le contrat pour la réalisation des travaux de genie civil pour la Centrale Electrique "Delimara" à Malte a été attribuée de la part de la Société Enemalta au Groupement d'entreprises Ing. F. Federici S.p.A. - Cogefar Impresit S.p.A. - Co.ge.i. S.p.A.

Le projet entraîne la réalisation des structures suivantes:

- a-1) Bâtiment central avec salle pour deux turbines de 65 MW chacune.
- 2) Sous-Station avec salle de contrôle électrique.
- 3) Atelier et Magasin.
- 4) Installation de traitement des eaux.
- 5) Cabine de pompage anti-incendie.
- 6) Station de pompage pour le combustible avec brûleur.
  
- b- Une Cheminée de 150 m. de hauteur.
  
- c- Système pour la circulation de l'eau comprenant:
  - 1) Conduit d'admission et station de pompage construit a 5m sous le niveau de la mer.
  - 2) Installation d'électrochlorination.
  - 3) Tunnel de 500 m. avec épanchement.
  
- d-1) Ruotes et pavés.
- 2) Drainages.
- 3) Citernes à eau et à combustible.
- 4) Tranchée pour cables et soubassements à treteaux.

Le système de circulation d'eau fournit de l'eau aux turbines dans la salle à turbines. Les gaz affluents des brûleurs, sont dirigés à la cheminée, laquelle a été complétée dans un délai de six semaines en utilisant la méthode a "slipform" continuées.

L'eau du système refrigerant est recyclée vers la mer à travers le tunnel souterrain et la structure d'épanchement qui ont été creusés dans la presqu'île qui entoure le chantier.

Le projet entraîne le coulage de 30.000 mc. de béton et l'installation de 220.000 tonnes de renforcement en acier.

La direction du chantier a coordonné le travail d'un groupe multinational de plus de 350 ouvriers.

La valeur du projet est estimée à 10.000.000 de lire malteses (US \$ 30.000.000) et les travaux seront achevés avant la fin du 1991.



EURO DISNEYLAND MAGIC KINGDOM

Developpement en Marne La Vallée - FRANCE

COMPLEX: AUTOPIA/RESTROOM/STARJETS

Ce contrat a été adjudgé à CO.GE.I. Constructions Générales Italiennes S.p.A. par suite de l'Appel d'Offres Internationale annoncée par EURO DISNEYLAND S.C.A. (client) et présentée à la date du 03.12.1990.

Euro Disneyland M.K. c'est la version européenne du Parc Americain, qui sera ouvert au public dans l'année 1992; il est situé en Marne La Vallée, 50 Km. de Paris.

Les travaux consistent en la réalisation d'un Parc d'attractions sur une superficie d'environ 100 ha., comprenant:

- une zone d'attraction ouvert au public, divisée en cinq "lands":
  - . Main Street USA
  - . Frontierland
  - . Adventureland
  - . Fantasyland
  - . Discoveryland
- deux zones fermées au public, comprenant les bâtiments de service et situées au Nord et au Sud-Ouest de la zone d'attraction.

Les travaux adjudgés à la CO.GE.I. concernent l'attraction dénommé AUTOPIA/RESTROOM/STARJETS, une des quatre zones de Discoveryland.

AUTOPIA est une attraction en plein air. Il s'agit d'un circuit pour automobiles à essence, que les visiteurs seront invités à conduire eux-mêmes.

Le circuit est conçu pour recevoir 125 voitures, le bâtiment d'entrée au niveau de la place est en porte-à-faux sur le circuit qu'il domine, et donne aux visiteurs une vue plongeante du circuit; sur ce circuit en boucle, les

voitures se croiseront en passant sur des ponts, et traverseront les collines dans les tunnels.

RESTROOM c'est les sanitaires qui déserviront la Grande Place de Discoveryland avec 14 cabines; ils couvrent une surface de 160 m<sup>2</sup>.

Dans la zone de STARJETS, les visiteurs embarqueront à bord de leur propre vaisseau spatial. Des modèles réduits des planètes et constellations, réalisés en métaux polis ou brossés, s'animeront autour d'eux, et formeront aussi au centre de la place une sculpture géante visible de tous.

DONNES GENERAUX:

- Client et financement	: EURO DISNEYLAND S.C.A. (FRANCE)
- Signature du contrat	: 31 Janvier 1991
- Ordre de démarrage	: 31 Janvier 1991
- Délai contractuel	: 275 jours
- Montant du contrat	: 64.699.582 F.F.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES:

- Tunnel Ø 3000	:	3.052 m.l.
- Galerie	:	38 m.l.
- Deblais en terre	:	13.358 m3
- Deblais en rocker	:	17.587 m3
- Deblais pour tunnel	:	43.592 m3
- Remblais	:	13.288 m3
- Piles en B.A. Ø 1000 - Ø 600	:	14.985 l.m.
- Béton pour B.A.	:	38.635 m3
- Acier	:	3.831.546 Kg.
- Route de jonction	:	3.500 m.l.

Formulaire de pré-qualification

---

Projet : AMÉNAGEMENT HYDROAGRICOLE DU BASSIN DE L'ANAMBE - PHASE II

Entreprise : CO.GE.I. COSTRUZIONI GENERALI ITALIANE S.p.A.


RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

---

Veillez ajouter toute information additionnelle que vous considérez pertinente à l'évaluation de votre demande de pré-qualification. Si vous désirez joindre d'autres documents annexes, veuillez les énumérer ci-dessous, sinon indiquez "non pertinent"..

- Annexes: "Certificat du Greffier du Tribunal de Rome - Section Commerciale"  
"Certificat de la Chambre de Commerce"  
"Certificat du Ministère des Travaux Publics"  
"Certificat du Tribunal Civil et penal de Rome - Section Fallimentaire"  
"Brochures"

CO. GE. I.  
Costruzioni Generali Italiane S.p.A.  
Ing. FABRIZIO PERRINI



C.C.I.A.A.  
IMPOSTA DI BOLLO  
ASSOLTA IN MODO VIRTUALE  
AUT. INT. FINANZA ROMA  
N. 103908 DEL 21-12-1976  
E DIRITTI DI SEGRETERIA



TOTALE  
22000  
LIRE

CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA  
ROMA

PROT.N. 241545

VISTO IL REGISTRO DELLE DITTE, TENUTO DA QUESTA  
CAMERA A NORMA DI LEGGE,

S I C E R T I F I C A

CHE IN DETTO REGISTRO RISULTA QUANTO SEGUE RELATI-  
VAMENTE ALLA DITTA APPRESSO INDICATA

ISCRIZIONE N. 388724 DATA ISCRIZIONE 22-01-1974

\* FORMA GIURIDICA \*  
SOCIETA PER AZIONI

\* DENOMINAZIONE \*  
CO.GE.I.-COSTRUZIONI GENERALI ITALIANE - SOCIETA P  
ER AZIONI

\* CODICE FISCALE \*  
00136710878

\* SEDE \*  
ROMA  
VIA DI VILLA PATRIZI, 7

\* ESTREMI DI COSTITUZIONE \*  
29-12-1973 ROG. NOT. LO GIUDICE FRANCESCO COADIUTORE  
PORTALE FERDINANDO IN CATANIA  
REP.N. 105873  
TRIBUNALE DI CATANIA  
NUMERO REGISTRO TRIBUNALE 00000000007529

\* ESTREMI DEL TRASFERIMENTO \*  
05-07-1986 ROG. NOT. FRANCESCO LO GIUDICE COAUD. TEM  
P. DEL DOTT. FERDINANDO PORTALE IN CATANIA  
REP.N. 159890  
TRIBUNALE DI ROMA  
NUMERO REGISTRO TRIBUNALE 00000006171/86

\* DURATA DELLA SOCIETA \*  
FINO AL 31-12-2050

\* CAPITALE SOCIALE \*  
LIRE \*\*\*30.000.000.000 INTERAMENTE VERSATO

\* OGGETTO SOCIALE \*  
ASSEGNAZIONE E ESECUZIONE DI APPALTI PUBBLICI E/O PR  
SEGUE A PAG. 2

CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA

R O M A

SEGUE CERTIF. R.D.N. 388724 DEL 18-10-94 PAG. 2

IVATI DI QUALSIASI GENERE E SPECIALIZZAZIONE ED IM  
PORTO E PIU' DETTAGLIATAMENTE COME PREVISTO DALLE C  
ATEGORIE DELL'ALBO NAZIONALE COSTRUTTORI: MOVIMENT  
O DI TERRA; COSTRUZIONE DI EDIFICI CIVILI, INDUST  
RIALI E MONUMENTALI; RESTAURO EDIFICI MONUMENTALI;  
SCAVI ARCHEOLOGICI; OPERE SPECIALI IN C.A.; ECC.

\* ATTIVITA' ESERCITATA \*

ASSUNZIONE ESECUZIONE APPALTI PUBBLICI E/O PRIVATI  
DI QUALSIASI GENERE E SPECIALIZZAZIONE E PER QUAL  
SIASI IMPORTO. AUTOTRASPORTO DI COSE PER CONTO TER  
ZI.--

\* UNITA' LOCALI DIPENDENTI \*

ROMA  
VIA SAMBUCA PISTOIESE, 57  
SEDE AMMINISTRATIVA.---

\* DATI RELATIVI ALL'AMMINISTRAZIONE \*

\* COMPOSIZIONE-DATA NOMINA-DURATA IN CARICA \*  
AMMINISTRAZ. AFFIDATA A UN CONSIGLIO DI AMMINIST.  
COMPOSTO DI 4 MEMERI  
NOMINATO IL 30-06-1994  
PER LA DURATA DI 3 ESERCIZI

\* DATI RELATIVI AGLI AMMINISTRATORI \*

\* QUALIFICA-DATA DI NOMINA-GENERALITA' \*

PRESIDENTE

NOMINATO IL 30-06-1994

ORIGLI SERGIO

NATO A CASTEL BOLOGNESE

IL 08-12-1927

-POTERI CONFERITI-

POTERI CONFERITI CON ATTO DEL 12/7/94

CONSIGLIERE DELEGATO

NOMINATO IL 30-06-1994

SANTO CAMPIONE

NATO A CATANIA

IL 27-01-1948

-POTERI CONFERITI-

POTERI CONFERITI CON ATTO DEL 12/7/94

CONSIGLIERE

NOMINATO IL 30-06-1994

RENDO UGO

NATO A CATANIA

IL 01-10-1926

-POTERI CONFERITI-

POTERI CONFERITI CON ATTO DEL 12/7/94

CONSIGLIERE

PAG. 1. 241545 SEGUE A PAG. 3

CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA  
R O M A

ESSE DEBITO, P.D.N. 889784 DEL 18-10-1994. P.D.N. 10

NOMINATO IL 20-01-1994  
PANTAGRO GIUSEPPE  
NATO A CATANIA

IL 08-01-1994

\* POTERI DI AMM.NE RAPPRE. FIRMA \*  
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E INVESTITO DEL 21  
L. 2001 POTERI PER LA GESTIONE DELLA SOCIETA', LA RA  
RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETA' DI FRONTE AI TERZI ED IL  
BILANCIO E ATTRIBUITA AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  
DI AMMINISTRAZIONE.---

DIRETTORE TECNICO  
NOMINATO IL 22-05-1991  
SALLARIZIO PANTAGRO GIUSEPPE  
NATO A TERTERICI

IL 08-01-1994

DIRETTORE TECNICO  
NOMINATO IL 16-02-1992  
BRONE FRANCESCO  
NATO A CATANIA

IL 22-05-1991

DIRETTORE TECNICO  
NOMINATO IL 18-02-1992  
SIGNARINI FULVIO  
NATO A ROMA

IL 08-07-1991

ROMA 18-10-1994

IL SEGRETARIO GENERALE



IL SEGRETARIO GENERALE  
P. G. G. G. G.

*Luca*

(Timbre de la C.C.I.A.A. et timbre de 22.000  
lire, ROME le 18.10.1994)

CHAMBRE DE COMMERCE INDUSTRIE ARTISANAT ET  
AGRICULTURE

ROME

N. ENREGISTREMENT 241545

LE REGISTRE DES SOCIETES, TENU PAR CETTE CHAMBRE  
AUX TERMES DE LA LOI..

ON CERTIFIE

QUE DANS LE SUSDIT REGISTRE FIGURENT LES DONNEES  
SUIVANTES RELATIVES A LA SOCIETE MENTIONNEE  
CI-APRES

INSCRIPTION N. 388724

DATE D'INSCRIPTION 22.01.1974

\* FORME JURIDIQUE \*

SOCIETE PAR ACTIONS

\* RAISON SOCIALE \*

CO.GE.I. COSTRUZIONI GENERALI ITALIANE - Société  
par Actions

\* CODE FISCAL \*

00136710878

\* SIEGE SOCIAL \*

ROME, VIA DI VILLA PATRIZI, 7

SUIT A LA PAG. 2



SUIT CERTIFICAT R.D.N. 388724 DU 18-10-94 PAG 2

\* ACTE DE CONSTITUTION \*

29-12-1973 ACTE NOT. LO GIUDICE FRANCESCO  
COLLABORATEUR DE PORTALE FERDINANDO A CATANIA  
REP. N. 105673

TRIBUNAL DE CATANIA

NUMERO REGISTRE DU TRIBUNAL 0000000007529

\* ACTE DE TRANSFERT

05-07-1986 ACTE NOT. LO GIUDICE FRANCESCO  
COLLABORATEUR DE PORTALE FERDINANDO A CATANIA  
REP. N. 159690

TRIBUNAL DE ROME

NUMERO REGISTRE DU TRIBUNAL 00000008171/86

\* DUREE DE LA SOCIETE \*

JUSQU'AU 31.12.2050

\* CAPITAL SOCIAL \*

LIRES \*\*\*\*30.000.000.000= ENTIEREMENT VERSE

\* OBJET SOCIAL \*

ACQUISITION ET EXECUTION DES MARCHES PUBLICS  
ET PRIVES DE TOUT GENRE ET SECTEUR ET A QUEL  
MONTANT QUE CE SOIT ET EN PARTICULIER COMME PREVU  
PAR LES CATEGORIES DU REGISTRE NATIONAL DES  
CONSTRUCTEURS: TERRASEMENT, CONSTRUCTION DE  
BATIMENTS CIVILS, INDUSTRIELS ET MONUMENTAUX,

SUIT A LA PAG. 3

RESTAURATION DE BATIMENTS MONUMENTAUX, FOUILLES  
ARCHEOLOGIQUES, TRAVAUX SPECIAUX EN BETON ARME,  
ETC.

\* CTIVITES EXERCES PAR LA SOCIETE \*

ACQUISITION ET EXECUTION DES MARCHES PUBLICS ET/OU  
PRIVES DE TOUT GENRE ET SECTEUR ET POUR QUELQUE  
MONTANT QUE CE SOIT. AUTOTRANSPORT DE  
MARCHANDISES POUR LA COMPTE DE TIERS.---

\* UNITES TERRITORIALES DEPENDANTES \*

ROME

VIA SAMBUCA PISTOIESE, 57

SEDE AMMINISTRATIVA.----

\* DONNEES RELATIVES A L'ADMINISTRATION \*

\* COMPOSITION-DATE DESIGNATION-DUREE EN FOCTION \*  
ADMINISTRATION CONFIEE A UN CONSEIL D'ADMINISTRA-  
TION COMPOSE DE 4 MEMBRES

DESIGNE LE 30-06-1994

POUR LA DUREE DE 3 EXERCICES

\* DONNEES RELATIVES AUX ADMINISTRATEURS \*

\* FONCTION - DATE DE DESIGNATION - ETAT CIVIL \*

PRESIDENT

SUIT A LA PAG. 4

SUIT CERTIFICAT R.D.N. 388724 DU 18-10-94 PAGE 4

DESIGNE LE 22-07-1993

SERGIO ORIOLI

NE A CASTEL BOLOGNESE

LE 06-12-1927

-POUVOIRS CONFERES-

DONT A L'ACTE DU 06-09-1993

ADMINISTRATEUR DELEGUE

DESIGNE LE 30-06-1994

SANTO CAMPIONE

NE A CATANIA

LE 27-01-1948

-POUVOIRS CONFERES-

DONT A L'ACTE DU 06-09-1993

ADMINISTRATEUR

DESIGNE LE 30-06-1994

RENDO UGO

NE A CATANIA

LE 01-10-1926

-POUVOIRS CONFERES-

DONT A L'ACTE DU 06-09-1993

ADMINISTRATEUR

DESIGNE LE 30-06-1994

PINTAGRO GALLARIZZO GIUSEPPE

NE A TORTORICI

LE 09-01-1936

\* POUVOIRS D'ADMINISTRATION REPRESENTATION ET

SIGNATURE \*

SUIT A LA PAGE 5

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION EST INVESTI DES PLUS  
AMPLES POUVOIRS POUR LA GESTION DE LA SOCIETE. LA  
REPRESENTATION DE LA SOCIETE ENVERS LES TIERS ET  
EN JUSTICE EST ATTRIBUEE AU PRESIDENT DU CONSEIL  
D'ADMINISTRATION.---

DIRECTEUR TECHNIQUE

DESIGNE LE 25-05-1991

GALLARIZZO PINTAGRO GIUSEPPE

NE A TORTORICI

LE 09-01-1936

DIRECTEUR TECHNIQUE

DESIGNE LE 18-02-1992

BRUNO FRANCESCO

NE A CATANIA

LE 22-06-1941

DIRECTEUR TECHNIQUE

DESIGNE LE 18-02-1992

GIOVANNINI FULVIO

NE A ROME

LE 12-12-1952

ROME, LE 18 october 1994

LE SECRETAIRE GENERAL

(SIGNATURE ILLISIBLE)

LE RESPONSABLE

M. Vittorio ABBRUCIATI

IL CANCELLIERE DEL TRIBUNALE DI ROMA

SEZIONE COMMERCIALE

CERTIFICA



- Che dai registri esistenti in questa Cancelleria al 8171/86 risulta iscritta la Società "CO.GE.I. COSTRUZIONI GENERALI ITALIANE S.p.A." con sede legale in Roma, Via di Villa Patrizi n° 7 e sede amministrativa in Roma, Via Sambuca Pistoiese n° 57/59,

- Che in data 29.12.1973 a Catania si costituisce la Società denominata "IMPRESA DI COSTRUZIONI RENDO CAV. DEL LAVORO MARIO S.n.c." e successivamente in data 20.12.1980 a Catania con atto di trasformazione "IMPRESA DI COSTRUZIONI RENDO CAV. DEL LAVORO MARIO S.p.A." e che in data 30.12.1983 risulta depositato nella Cancelleria del Tribunale di Catania la variazione di denominazione sociale in "CO.GE.I. - COSTRUZIONI GENERALI ITALIANE S.p.A.".

- Che la Società ha per oggetto: l'assunzione e l'esecuzione di appalti pubblici e/o privati di qualsiasi genere, specializzazione ed importo e più dettagliatamente come previsto dalle categorie dell'Albo Nazionale dei Costruttori: - 1 movimento terra - 2 costruzioni di edifici civili, industriali e monumentali - 3 restauro edifici monumentali - 4 scavi archeologici - 5 opere speciali in c.a. - 6 impianti termici di ventilazione e di condizionamento - 7 impianti igienici, idrico-sanitari, cucine, lavanderia e gas - 8 ascensori e scale mobili - 9 impianti pneumatici e di sicurezza - 10 fornitura ed installazione di manufatti in legno, metallo plastica, materiali lapidei e materiali vetrosi - 11 tinteggiatura e verniciatura - 12 fornitura in opera di isolanti termici acustici ed

antincendi - 13 costruzioni e pavimentazioni stradali, rilevati aeroportuali  
e ferroviari - 14 segnaletica e sicurezza stradale - 15 pavimentazioni  
speciali - 16 manutenzione sistematica dell'armamento - 17 lavorazioni  
speciali del binario - 18 impianti di sicurezza del traffico - 19 impianti  
per trazione elettrica - 20 impianti di frenatura e automazione per stazione  
di smistamento merci - 21 acquedotti fognatura ed impianti di irrigazione -  
22 difesa e sistemazione idraulica - 23 gasdotti e oleodotti - 24  
sistemazione agraria, forestale e di verde pubblico - 25 impianti di  
sollevamento, potabilizzazione e depurazione delle acque - 26 impianti di  
trattamento dei rifiuti - 27 costruzioni di moli, bacini e banchine - 28  
dragaggio - 29 manutenzione di apparecchiature portuali e pulizia di acque  
portuali - 30 dighe - 31 gallerie - 32 centrali idrauliche - 33 centrali  
termiche - 34 centrali elettronucleari - 35 impianti di produzione di energia  
da fonte alternativa - 36 impianti elettrici per centrali - 37 cabine di  
trasformazione - 38 linee a bassa media e alta tensione - 39 apparati vari -  
40 impianti esterni di illuminazione - 41 linee telefoniche e opere connesse  
- 42 carpenteria metallica - 43 impianti di telecomunicazione - 44  
rilevamenti topografici speciali - 45 esplorazioni del sottosuolo con mezzi  
speciali - 46 fondazioni speciali - 47 consolidamento dei terreni e opere  
speciali nel sottosuolo - 48 impermeabilizzazione dei terreni - 49  
trivellazione a pozzi - 50 fornitura e installazione di impianti e apparecchi  
di sollevamento e trasporto; l'esercizio dell'attività estrattiva; la  
prestazione di servizi nel settore dell'elaborazione dati e dell'informatica  
in genere; servizi di noleggio attrezzature in genere parco macchine  
operatrici ed automezzi, gestione officine meccaniche, riparazione automezzi

e costruzioni speciali; autotrasporto di merci per conto di terzi, studio e progettazione connesse alle attività sociali. Nell'ambito dell'oggetto sociale, la Società può compiere tutte le operazioni industriali, commerciali, immobiliari, mobiliari e finanziarie necessarie ed utili al conseguimento dei suoi fini; può inoltre prestare fidejussioni e garanzie a favore di terzi. La Società potrà far parte di Consorzi, Società Consortili e Raggruppamenti di Imprese. Essa potrà, altresì, assumere partecipazioni in altre Società o Enti.

- Che il Consiglio di Amministrazione è composto dai Signor Dott. Ing. Sergio ORIOLI, nato a Castel Bolognese (RA) il 06.12.1927 Presidente; Avv. Santo CAMPIONE, nato a Catania il 27.01.1948; Comm. Ugo RENZO, nato a Catania il 01.10.1926; Dott. Ing. Giuseppe Pintagro GALLARIZZO, nato a Tortorici (ME) il 09.01.1936, Consiglieri.

- Che la rappresentanza legale e la firma sociale, con tutti i poteri necessari per il raggiungimento dell'oggetto e dello scopo sociale, spettano disgiuntamente al Presidente del Consiglio di Amministrazione Ing. Sergio ORIOLI, nato a Castel Bolognese (RA) il 06.12.1927 ed al Consigliere Delegato Avv. Santo CAMPIONE, nato a Catania il 27.01.1948.

- Che con Verbale di Assemblea Straordinaria dei Soci del 15.06.1985, depositato il 03.09.1985, è stata deliberata l'incorporazione nella "CO.GE.I. COSTRUZIONI GENERALI ITALIANE S.p.A." della Società "ME.C. Meridionali Costruzioni S.p.A." ed il relativo Atto di Fusione rogato il 03.12.1985 è stato depositato in data 04.12.1985.

- Che con Verbale di Assemblea Straordinaria dei Soci del 09.09.1991 è stata deliberata la fusione per incorporazione nella "CO.GE.I. COSTRUZIONI GENERALI

ITALIANE S.p.A." della "IMPRESITAL S.p.A." ed il relativo Atto di Fusione,  
ITALIANE S.p.A." della "IMPRESITAL S.p.A." ed il relativo Atto di Fusione,  
rogato il 30.12.1991 è stato depositato in data 31.12.1991.

rogato il 30.12.1991 è stato depositato in data 31.12.1991.

- Che con Verbale di Assemblea Straordinaria dei Soci del 23.09.1991 è stata

- Che con Verbale di Assemblea Straordinaria dei Soci del 23.09.1991 è stata  
deliberata la fusione per incorporazione nella "CO.GE.I. COSTRUZIONI GENERALI

deliberata la fusione per incorporazione nella "CO.GE.I. COSTRUZIONI GENERALI  
ITALIANE S.p.A." della "CO.SNA COSTRUZIONI NAZIONALI S.p.A." ed il relativo

ITALIANE S.p.A." della "CO.SNA COSTRUZIONI NAZIONALI S.p.A." ed il relativo  
Atto di Fusione, rogato il 30.12.1991 è stato depositato in data 31.12.1991.

Atto di Fusione, rogato il 30.12.1991 è stato depositato in data 31.12.1991.

- Che il Capitale Sociale è di Lit. 30.000.000.000= (trentamiliardi di lire

Che il Capitale Sociale è di Lit. 30.000.000.000= (trentamiliardi di lire  
italiane) interamente versato.

italiane) interamente versato.

- Che la Direzione Tecnica dei lavori è affidata al Dott. Ing. Francesco

Che la Direzione Tecnica dei lavori è affidata al Dott. Ing. Francesco  
BRUNO, nato a Catania il 22.07.1941;

BRUNO, nato a Catania il 22.07.1941;

Dott. Ing. Fulvio GIOVANNINI, nato a Roma il 02.07.1941;

Dott. Ing. Fulvio GIOVANNINI, nato a Roma il 02.07.1941;

Dott. Ing. Giuseppe Pintagro GALLARIZZO, nato a Tortorici (ME) il 09.01.1936.

Dott. Ing. Giuseppe Pintagro GALLARIZZO, nato a Tortorici (ME) il 09.01.1936.

- Che la predetta Società si trova nel pieno e libero esercizio dei propri

Che la predetta Società si trova nel pieno e libero esercizio dei propri  
diritti non risultando a suo carico procedura di fallimento, amministrazione

diritti non risultando a suo carico procedura di fallimento, amministrazione  
controllata, liquidazione, cessazione di attività, concordato preventivo e di

controllata, liquidazione, cessazione di attività, concordato preventivo e di  
qualsiasi altra situazione equivalente, ciò nell'ultimo quinquennio.

qualsiasi altra situazione equivalente, ciò nell'ultimo quinquennio.

Si rilascia il presente a richiesta della stessa Società per gli usi di

Si rilascia il presente a richiesta della stessa Società per gli usi di  
Legge.


Legge.

Roma il,

Roma il,

*[Handwritten signatures and initials]*

**IL FUNZIONARIO  
IN CARICA  
Sergio**





LE GREFFIER DU TRIBUNAL DE ROME

SECTION COMMERCIALE

CERTIFIE

(n. 1 timbres fiscal de Lit. 15.000 oblitérés par un timbre rond portant les mots: tribunal civil et pénal de Rome avec l'emblème de la république italienne)

- Qu'aux registres tenus par ce greffe au numéro 8171/86 est inscrite la Société "CO.GE.I. - Costruzioni Generali Italiane S.p.A." ayant son siège social à Rome, Via di Villa Patrizi n. 7 et siège administratif à Rome, Via Sambuca Pistoiese n. 57.
- Qu'en date du 29.12.1973 a été constituée à Catania la Société dont la raison sociale est "IMPRESA DI COSTRUZIONI RENDO CAV. DEL LAVORO MARIO S.n.c." et par la suite en date du 20.12.1980 à Catania avec acte de modification "IMPRESA DI COSTRUZIONI RENDO CAV. DEL LAVORO MARIO S.p.A." et que en date 30.12.1983, a été déposé au Greffe du Tribunal de Catania le changement de raison sociale en "CO.GE.I. - COSTRUZIONI GENERALI ITALIANE S.p.A.
- Que la société a pour but: l'acquisition et l'exécution des marchés publics et/ou privés de tout genre et secteur et pour tout montant que ce soit et en particulier comme prévu par les catégories du

Registre National des Constructeurs: 1 - terrassement  
2 - construction de bâtiments civils, industriels et  
monumentaux 3 - restauration bâtiments monumentaux 4 -  
fouilles archéologiques 5 - travaux spéciaux en b.a.  
6 - installations thermiques de ventilation et  
conditionnement 7 - installations sanitaires,  
hydrosanitaires, cuisines, buanderies et gaz 8 -  
ascenseurs et escaliers mécanique 9 - installations  
pneumatiques et de sécurité 10 - fourniture et  
installation de produits finis en bois, métal,  
plastique, matériaux pierreux, matériaux vitreux 11 -  
travaux de peinture et vernis 12 - fourniture et  
installation d'isolations thermiques, acoustiques,  
anti-incendies 13 - constructions et revêtements  
routiers, remblais d'aéroport et ferroviaires 14 -  
signalisation et sécurité routière 15 - revêtement  
spéciaux 16 - entretien systématique de boisage et  
charpentes 17 - usinage spécial de voies 18 -  
installation de sécurité de la circulation 19 -  
installations de traction électrique 20 -  
installations de freinage et automation pour gares à  
trafic de marchandises 21 - aqueducs, égouts et  
installations d'irrigation 22 - protection et  
aménagement hydrauliques 23 - gazoducs et oléoducs 24  
- aménagement du territoire agraire, forestier et des

espaces verts 25 - installations de relevage, de potabilisation et traitement des eaux 26 - installations de traitement des déchets 27 - construction de quais et bassins portuaires 28 - dragage 29 - entretien des installations portuaires et nettoyage des eaux portuaires 30 - barrages et digues 31 - tunnels 32 - centrales hydrauliques 33 - centrales thermiques 34 - centrales électronucléaires 35 - installations pour la production d'énergie des sources alternatives. 36 - installations électriques pour centrales 37 - cabines de transformation 38 - lignes à basse, moyenne et haute tension 39 - équipement divers 40 - installations extérieurs d'éclairage 41 - lignes téléphoniques et travaux relatifs 42 - charpente métallique 43 - installations de télécommunication 44 - levés topographiques spéciaux 45 - explorations du sous-sol avec des moyens spéciaux 46 - fondations spéciales 47 - consolidation des terres et travaux dans le sous-sol 48 - imperméabilisation des terrains 49 - Forage de puits 50 - Fourniture et mise en place des installations et des engins de levage et appareils de transport - l'exercice des activités d'extraction - la prestation de services dans le secteur de l'élaboration des données et de l'informatique en général - services de

location d'équipement en général, charroi et outillage  
- gestion ateliers d'usinage, réparation véhicules et  
construction de pièces spéciales - autotransport de  
marchandises pour le compte de tiers, études et  
projets relatifs aux activités sociales.

Dans le cadre de l'objet social, la société peut  
réaliser toutes opérations industrielles, commer-  
ciales, immobilières, mobilières et financières  
nécessaires et utiles dans la poursuite de ses buts;  
et, fournir cautionnements et garanties en faveur de  
tiers. La société pourra faire partie de consortiums,  
de sociétés consortiales et regroupements d'entre-  
prises. Et elle pourra aussi contracter participa-  
tions dans d'autres sociétés ou établissements:

- Que le Conseil d'Administration est composé par  
Messieurs Dott. Ing. Sergio ORIOLI, né à Castel  
Bolognese (RA) le 06.12.1927, Président, Avv. Santo  
CAMPIONE né à Catania le 27.01.1948; Comm. Ugo RENDO  
né à Catania le 01.10.1926; Dott. Ing. Giuseppe  
PINTAGRO GALLARIZZO, né à Tortorici (ME) le  
09.01.1936, Conseillers.
- Que la représentation légale et la signature sociale  
avec tous les pouvoirs nécessaires pour la poursuite  
de l'objet et du but social, reviennent séparément au  
Président du Consil d'Administration Ing. Sergio

ORIOLO, né à Castel Bolognese (RA) le 06.12.1927 et à l'Administrateur Délégué Avv. Santo CAMPIONE, né à Catania le 27.01.1948.

- Que par procès-verbal de l'assemblée extraordinaire des membres du 15.06.1985, déposé le 03.09.1985 l'incorporation de la société ME.C. "Meridionali Costruzioni S.p.A." dans CO.GE.I. Costruzioni Generali Italiane S.p.A. a été délibérée et le relatif acte de fusion dressé par notaire le 03.12.1985 a été déposé le 04.12.1985..
- Que par procès-verbal de l'assemblée extraordinaire des membres du 09.09.1991 la fusion par incorporation de la Société IMPRESITAL S.p.A. dans CO.GE.I. Costruzioni Generali Italiane S.p.A. a été délibérée et le relatif acte de fusion, dressé par notaire le 30.12.1991 a été déposé le 31.12.1991;
- Que par procès-verbal de l'assemblée extraordinaire des membres du 23.09.1991 la fusion par incorporation de la Société COS.NA Costruzioni Nazionali S.p.A. dans CO.GE.I. Costruzioni Generali Italiane S.p.A. a été délibérée et le relatif acte de fusion, dressé par notaire le 30.12.1991 a été déposé le 31.12.1991;
- Que le capital social est de £. 30.000.000.000 (trente milliards) entièrement versé.

- Que la Direction Technique des Travaux est confiée à Dott. Ing. Francesco BRUNO, né à Catania le 22.06.1941; Dott. Ing. Fulvio GIOVANNINI, né à Rome le 02.07.1941 et Dott. Ing. Giuseppe PINTAGRO GALLARIZZO né à Tortorici (ME) le 09.01.1936.
  - Que la susdite société se trouve dans le plein et libre exercice des propres droits puisqu'il n'existe pas, à son encontre, aucune procédure de faillite, administration contrôlée, liquidation, cessation d'activité, concordat préventif ni aucune autre situation équivalente, dans les cinq dernières années.
- Ce certificat est délivré sur demande de la même société pour l'usage conseil par la loi.

Rome, le .....

Le Greffier

Directeur de Section

(Franco Raffaelli)

(signature illisible)

(timbre du Tribunal Civil et Pénal de Rome avec l'emblème de la république italienne)



# Ministero dei Lavori Pubblici

A 0069156

PROVVEDITORATO REGIONALE OO.PP. PER IL LAZIO  
COMITATO REGIONALE A.N.C.

## SI CERTIFICA

La IMPRESA matricola n. 3637218 C.F. \*\*\*\*\* P.I. \*\*\*\*\*

Ragione Sociale: CO.GE.I. COSTRUZIONI GENERALI ITALIANE  
S.P.A.

Indirizzo: VIA DI VILLA PATRIZI 7  
00161 ROMA

Rappresentanti Tecnici:  
PINTAGRO BALLARIZZO Dott. Ing. GIUSEPPE n. TORTORICO 09 gen 36  
BRUNO Ing. FRANCESCO n. CATANIA 22 gen 41  
GIOVANNINI FULVIO n. ROMA 02 lug 41

Rappresentanti Legali:  
CAMPIONE SANTO n. CATANIA 27 gen 48  
CORIOLI Ing. SERGIO n. CASTEL BOLOGNESE 06 dic 27

## E' ISCRITTA

nel R. ALBO NAZIONALE COSTRUTTORI del 22 feb 74  
per le categorie e gli importi a lato specificati  
e confermati con REVISIONE positiva, ai sensi del  
D.M. 09 mar 69 N. 172, fino al 08/lug/97.

\*\*\*\*\*

CAT	IMPORTO (in milioni)
***1/	ILLIM*
***2/	ILLIM*
**3A/	*3000*
***4/	ILLIM*
**5A/	*6000*
**5B/	*1500*
**5C/	*6000*
*5F1/	ILLIM*
**5H/	*700*
***6/	ILLIM*
**9A/	*3000*
**9B/	*3000*
*10A/	ILLIM*
*10B/	ILLIM*
*10C/	*3000*
**11/	ILLIM*
*12A/	15000*
*13A/	ILLIM*
*13B/	*6000*
**14/	ILLIM*
**15/	ILLIM*
**17/	*9000*
*19C/	*9000*



Il Provveditorato  
**SEGRETARIO A.N.C.**  
Dr. Giuseppe Antonio Luigi Campolongo

CENTRO ELETTRONICO DEL MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

**TABELLA DI CLASSIFICAZIONE  
PER CATEGORIE DI LAVORI**  
(D.M. 770 del 25 febbraio 1932)

- Cat. 1 - Lavori di terra con eventuali opere connesse in muratura e cemento armato di tipo corrente - demolizioni e sterri.
- Cat. 2 - Edifici civili, industriali, monumentali completi di impianti e di opere connesse e accessorie - opere murarie relative ai complessi per la produzione e distribuzione di energia.
- Cat. 3 - Lavori di restauro.  
a) Restauro di edifici monumentali;  
b) Lavori e scavi archeologici.
- Cat. 4 - Opere speciali in cemento armato.
- Cat. 5 - Impianti tecnologici e speciali - impianti e lavori per l'edilizia scorporati dall'opera principale.  
a) Impianti termici di ventilazione e di condizionamento;  
a1) Gestione e manutenzione dei suddetti impianti;  
b) Impianti igienici, idrosanitari, cucine, lavanderie, del gas e loro manutenzione;  
c) Impianti elettrici, telefonici, radiotelefonici, televisivi e simili e loro manutenzione;  
d) Impianti di ascensori, scale mobili e trasportatori in genere;  
d1) Gestione e manutenzione dei suddetti impianti;  
e) Impianti pneumatici, impianti di sicurezza e loro manutenzione;  
f) Fornitura ed installazione di manufatti in:  
1) metallo, legno, materie plastiche  
2) materiali lapidei  
3) materiali vetrosi  
g) Tinteggiatura e verniciatura;  
h) Fornitura in opera di isolamenti termici, acustici, antincendi - lavori di intonacatura e di impermeabilizzazione.
- Cat. 6 - Costruzioni e pavimentazioni stradali, rilevatori aeroportuali e ferroviari.
- Cat. 7 - Segnaletica e sicurezza stradale.
- Cat. 8 - Pavimentazioni con materiali speciali.
- Cat. 9 - Lavori ferroviari.  
a) Lavori di manutenzione sistematica dell'armamento;  
b) Lavorazioni speciali del binario;  
c) Impianti di sicurezza del traffico;  
d) Impianti per la trazione elettrica;  
e) Impianti di frenatura e automazione per stazioni di smistamento merci.
- Cat. 10 - Lavori idraulici.  
a) Acquedotti, fognature, impianti di irrigazione.  
b) Lavori di difesa e sistemazione idraulica.  
c) Gasdotti - casedotti.
- Cat. 11 - Lavori di sistemazione agraria, forestale e di verde pubblico.
- Cat. 12 - Lavori sociali.  
a) Impianti di sollevamento, di potabilizzazione, di depurazione delle acque.  
b) Impianti di trattamento di rifiuti.
- Cat. 13 - Lavori marittimi.  
a) Costruzioni di moli, bacini, banchine, ecc.  
b) Lavori di dragaggio.  
c) Manutenzioni di sbarcochiatte, portuali e pulizia di acque portuali.
- Cat. 14 - Digne.
- Cat. 15 - Gallerie.
- Cat. 16 - Impianti per la produzione e distribuzione di energia.  
a) Centrali idroelettriche.  
b) Centrali termiche.  
c) Centrali elettrionucleari.  
d) Impianti per la produzione di energia da fonti alternative.  
e) Impianti elettrici per centrali.  
f) Cabine di trasformazione;  
g) Linee ad alta tensione;  
h) Linee a media e bassa tensione;  
i) Apparat vari;  
j) Impianti esterni di illuminazione;  
m) Linee telefoniche e opere connesse.
- Cat. 17 - Costruzioni metalliche.
- Cat. 18 - Impianti di telecomunicazione.
- Cat. 19 - Lavori ed opere speciali vari.  
a) Rilevamenti topografici speciali;  
b) Esplorazioni del sottosuolo con mezzi speciali;  
c) Fondazioni speciali;  
d) Consolidamento dei terreni e opere speciali nel sottosuolo;  
e) Impermeabilizzazione dei terreni;  
f) Trivellazioni e pozzi.
- Cat. 20 - Fornitura ed installazioni di impianti e apparecchi di sollevamento e trasporto (gru, fionde, teleferiche, scivoli e similari).

In base alle vigenti disposizioni, la classifica delle iscrizioni, secondo le categorie, è la seguente:

- |                             |   |
|-----------------------------|---|
| 1) fino a L. 75 milioni;    | 6) fino a L. 3.000 milioni;               |
| 2) fino a L. 150 milioni;   | 7) fino a L. 6.000 milioni;               |
| 3) fino a L. 300 milioni;   | 8) fino a L. 9.000 milioni;               |
| 4) fino a L. 750 milioni;   | 9) fino a L. 15.000 milioni;              |
| 5) fino a L. 1.500 milioni; | 10) illimitatamente oltre 15.000 milioni. |



MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS  
INSPECTION REGIONALE DES TRAVAUX PUBLICS POUR LE LATIUM  
COMITE REGIONAL A.N.C.

ON CERTIFIE

Que la Société matricule n. 3637210

C.F. \*\*\*\*\*

P.I. \*\*\*\*\*

Raison sociale: CO.GE.I. COSTRIZIONI GENERALI ITALIANE S.P.A.

CAT/MONTANT

(en million)

Siège social: Via di Villa Patrizi, 7  
00161 ROME

\*\*\*1/ILLIM\*

\*\*\*2/ILLIM\*

\*\*3A/\*3000\*

\*\*\*4/ILLIM\*

\*\*5A/\*6000\*

\*\*5B/\*1500\*

Directeurs Techniques:

\*\*5C/\*6000\*

PINTAGRO GALLARIZZO Dott. Ing. GIUSEPPE né à Tortorici le 01 Sept 36

\*5F1/ILLIM\*

BRUNO Ing. FRANCESCO né à Catania le 22 Juin 41

\*\*5H/\*\*750\*

GIOVANNIN Ing. FULVIO né à Roma le 02 Juil 41

\*\*\*6/ILLIM\*

\*\*9A/\*3000\*

\*\*9B/\*3000\*

Représentant legaux:

\*10A/ILLIM\*

CAMPIONE SANTO né à Catania le 27 Jan 48

\*10B/ILLIM\*

ORIOLI Ing. SERGIO né à Castel Bolognese le 06 Dec 27

\*10C/\*3000\*

\*\*11/ILLIM\*

EST INSCRITE

\*12A/15000\*

au REGISTRE NATIONAL DES CONSTRUCTEURS depuis le 22 fev 74 pour les  
categories et les montants à côté spécifié et confirmé par REVISION positive, aux  
termes u D.M. du 09 Mars 89 N. 172 jusqu'au 8/Juil/97.

\*13A/ILLIM\*

\*13B/\*3000\*

\*\*14/ILLIM\*

\*\*15/ILLIM\*

\*\*\*\*\*

\*\*17/\*9000\*

\*19C/\*9000\*

\*\*\*\*\*

Le Secrétaire

(du A.N.C.)

(Dr. Giuseppe Antonio Luigi CAMPOLONGO)

(Signature illisible)

(n° 1 timbre fiscal de 15.000 liras oblitéré par un timbre portant les mots: Ministère  
des Travaux Publics).

Rome, le 24/mai/94

Ce certificat est valable pendant un an depuis la date de délivrance.

TG 0579205

**TABLE DE CLASSIFICATION  
PAR CATEGORIE DE TRAVAUX  
(Décret Ministériel du 25 Février 1982)**

- Cat. 1 - Travaux de délai, y compris d'éventuels travaux complémentaires en maçonnerie et en béton armé de type courant - démolitions et terrassements.
- Cat. 2 - Bâtiments civils, industriels et monuments, y compris les installations et travaux complémentaires et accessoires - travaux de maçonnerie se rapportant aux complexes pour la production et la distribution de l'énergie.
- Cat. 3 - Travaux de Restauration
  - a) restauration de monuments
  - b) travaux et fouilles archéologiques
- Cat. 4 - Ouvrages spéciaux en béton armé.
- Cat. 5 - Installations technologiques et spéciales - installations et travaux pour le bâtiment non compris dans l'ouvrage principal.
  - a) installations de chauffage, de ventilation et de climatisation
  - a1) gestion et entretien des sus-dites installations
  - b) installations hygiéniques, sanitaires, de cuisines, de laveries, de gaz et leur entretien.
  - c) installation d'électricité, téléphone, radio-téléphone, télévision et similaires, et leur entretien.
  - d) installations d'ascenseurs, escaliers roulants et transporteurs en général
  - d1) gestion et entretien des sus-dites installations
  - e) installations hydrauliques, systèmes de sécurité et leur entretien
  - f) fourniture et installation de produits manufacturés en:
    - 1) métal, bois, matières plastiques
    - 2) matériaux pierreux
    - 3) matériaux vitreux
  - g) badigeonnage et peinture
  - h) fourniture et pose de systèmes d'isolation thermique, acoustique, anti-incendie, travaux de crépissage et d'imperméabilisation.
- Cat. 6 - Construction et revêtement des routes, remblais pour aéroports et chemins de fer.
- Cat. 7 - Signalation et sécurité routière.
- Cat. 8 - Pavage avec matériaux spéciaux.
- Cat. 9 - Travaux ferroviaires
  - a) travaux d'entretien systématique de l'équipement.
  - b) travaux spéciaux sur les voies
  - c) installations pour la sécurité du trafic
  - d) installations pour la traction électrique
  - e) installations de freinage et d'automation pour les stations de triage trafic marchandises.

- Cat. 10 - Travaux hydrauliques
  - a) aqueducs, égouts, installations d'irrigations
  - b) travaux de protection et d'aménagement hydraulique
  - c) pipe-lines - oléoducs.
- Cat. 11 - Travaux d'aménagement agricoles, forestiers, et des espaces verts.
- Cat. 12 - Travaux spéciaux
  - a) installations de levage, potabilisation et épuration des eaux
  - b) installations de traitement des ordures
- Cat. 13 - Travaux maritimes
  - a) construction de moles, bassins, quais, etc.
  - b) travaux de dragage
  - c) entretien des installations portuaires et nettoyage des eaux portuaires
- Cat. 14 - Barrages.
- Cat. 15 - Galeries.
- Cat. 16 - Installations pour la production et la distribution de l'énergie.
  - a) centrales hydrauliques
  - b) centrales thermiques
  - c) centrales électro-nucléaires
  - d) installations pour la production d'énergie alternative
  - e) installations électriques pour centrales
  - f) cabines de transformation
  - g) lignes de haute tension
  - h) lignes de moyenne et base tension
  - i) appareils divers
  - m) lignes téléphoniques et ouvrages complémentaires
- Cat. 17 - Charpente métallique
- Cat. 18 - Installations de télécommunications
- Cat. 19 - Travaux et ouvrages spéciaux divers
  - a) relevés topographiques spéciaux
  - b) sondages du sous-sol avec des moyens spéciaux
  - c) fondations spéciales
  - d) consolidations des sols et ouvrages spéciaux dans le sous-sol
  - e) imperméabilisation des terrains
  - f) forages et puits
- Cat. 20 - Fourniture et montage d'installation de levage et transport (grues, trolley-bus, téléphériques, remonte-pentes et similaires).

Suivant les termes de la réglementation en vigueur, la classification des inscriptions, selon les montants, est la suivante:

- |                                |                                 |
|--------------------------------|---------------------------------|
| 1) jusqu'à Lit. 750 millions   | 6) jusqu'à Lit. 3.000 millions  |
| 2) jusqu'à Lit. 150 millions   | 7) jusqu'à Lit. 6.000 millions  |
| 3) jusqu'à Lit. 300 millions   | 8) jusqu'à Lit. 9.000 millions  |
| 4) jusqu'à Lit. 750 millions   | 9) jusqu'à Lit. 15.000 millions |
| 5) jusqu'à Lit. 1.500 millions | 10) sans limites.               |

TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ROMA

Sezione Fallimentare


028542

N. ....

Esatte L. ....

Il sottoscritto cancelliere

CERTIFICA



che, esaminati i registri, non risulta in corso procedura di fallimento a seguito di sentenza dichiarativa pronunciata, da questo Tribunale, né risultano in corso procedure di concordato preventivo o di amministrazione controllata a seguito di decreto emesso da questo Tribunale nei confronti di:

CO.GE.I. SpA COSTRUZIONI GENERALI ITALIANE  
.....  
CON SEDE IN ROMA VIA DI VILLA PATRIZI, 7  
.....  
.....

CERTIFICA

inoltre, che non risultano procedure concorsuali previste dal R.D. 16/3/1942 n. 267, iniziate e definite nel corso dell'ultimo quinquennio.

Si rilascia in carta ~~libera~~ <sup>bollata</sup> a richiesta .....

per uso consentito dalla legge.

Roma li

19 OTT. 1994

IL CANCELLIERE  
DIRETTORE DI CANCELLERIA  
(Calisse dott. Piero)

TRIBUNAL CIVIL ET PENAL DE ROME

Section des Faillites

N. 02845

Perçu Lit. ....

(n. 1 timbre fiscal de 15.000 et 3.000 liras italiennes  
oblitérés par un timbre illisible)

Le soussigné greffier

CERTIFIE

que, examinés les registres, à sa connaissance il n'existe  
aucune procédure de faillite en cours par suite du jugement  
déclaratif prononcé par ce Tribunal, ni à ce qu'il semble,  
existe-il en cours aucune procédure de concordat préventif ou  
d'administration sous contrôle judiciaire par suite de  
l'arrêt de ce Tribunal à l'égard de:

CO.GE.I. - COSTRUZIONI GENERALI ITALIANE S.p.A. AYANT SIEGE  
SOCIAL A ROME, VIA DI VILLA PATRIZI, 7

CERTIFIE

en outre que à sa connaissance il n'existe pas de procédures  
relatives aux concours de créanciers prévues par le R.D. n.  
267 du 16/3/1942, intentées et définies au cours des  
dernières cinq années.

Délivré en papier timbré sur demande

pour l'usage consenti par la loi ou usage exclusif emprunt  
foncier.

Rome, le

LE GREFFIER

Timbre avec les mots: Directeur du Greffe

(Calisse Dott. Piero)

(signature illisible)
